椙山女学園星が丘キャンパス大学会館食堂・外構リニューアル工事

総合施工計画書

令和8年　10月

≪目　　次≫

第１章　総　　則
　　１－１）　　適用範囲
　　１－２）　　適用図書
　　１－３）　　質疑、変更
　　１－４）　　関係者への徹底

第２章　一般事項
　　２－１）　　工事概要
　　２－２）　　施工組織表
　　２－３）　　現場案内図

第３章　現場運営計画
　　３－１）　　作業所施工サイクル
　　３－２）　　作業所の会議体

第４章　施工計画
　　４－１）　　施工方針
　　４－２）　　作業所重点実施項目
　　４－３）　　総合仮設計画図

第５章　工程管理計画
　　５－１）　　基本事項
　　５－２）　　総合工程とそのフォロー
　　５－３）　　工程の変更
　　５－４）　　総合工程表
　　５－５）　　施工図と施工計画書リスト

第６章　品質管理計画
　　６－１）　　作業所重点品質管理項目
　　６－２）　　共通施工品質計画書
　　６－３）　　社内スタッフによる検査・支援とその体制

第７章　監理者への対応
　　７－１）　　各書類について
　　７－２）　　変更、質疑、協議について
　　７－３）　　立会い検査について

第８章　安全衛生管理計画
　　８－１）　　安全衛生管理計画の作成と周知
　　８－２）　　安全衛生管理計画のフォロー
　　８－３）　　工事別実施計画の作成
　　８－４）　　工事別実施計画のフォロー
　　８－５）　　外部安全パトロールの実施
　　８－６）　　作業所安全重点実施事項
　　８－７）　　現場内喫煙について
　　８－８）　　作業所緊急連絡体制表（安全）

第９章　環境保全計画
　　９－１）　　作業所重点環境管理項目
　　９－２）　　施工環境計画書
　　９－３）　　作業所緊急連絡体制表（環境）

第1章 総　則

1－1）適用範囲

本施工計画書は、椙山女学園星が丘キャンパス大学会館食堂・外構リニューアル工事における、現場施工管理方針として適用する。

1－2）適用図書

本工事は、下記の仕様書及び設計図に基づいて施工する。

（ア） 工事請負契約書
（イ） 民間（七会）連合協定工事請負契約約款（令和5年（2023）1月改正）
（ウ） 質問回答書((エ)から(コ)に対するもの)、追加変更指示書
（エ） 見積要項書、現場説明書
（オ） 特記仕様書及び工事概要書
（カ） 設計図面
（キ） 見積区分表
（ク） 日建設計　提出書類作成要領・受注者検査要領23
（ケ） 公共建築協会編
民間（七会）連合協定工事請負契約約款に適合した工事共通仕様書（令和　5　年版）
(2章 仮設工事 から 23章 植栽及び屋上緑化工事 以外)
（コ） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（令和　4　年版）
(2章 仮設工事 から 23章 植栽及び屋上緑化工事 まで)
（サ） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
建築物解体工事共通仕様書 （令和　4　年版）
（シ） 各工事のJISS, JASS規格
（ス） 清水建設㈱施工管理標準

1－3）質疑、変更

本施工計画書に記載なき事項や、記載事項の質疑変更に関しては、
監理者の承諾を得て施工する。

1－4）関係者への徹底

本計画書は説明会などにて関係者全員に周知徹底させる。
また、変更が生じた場合も同様に周知徹底させる。

第2章　一般事項

2－1）工事概要

工 事 名 称： 椙山女学園星が丘キャンパス大学会館食堂・外構リニューアル工事

工 事 場 所： 名古屋市千種区星が丘元町17-3

建　築　主： 学校法人　椙山女学園

設　　計： 株式会社　日建設計

監　　理： 株式会社　日建設計

施　　工： 清水建設株式会社名古屋支店

全 体 工 期：　2026年11月1日　から　2027年3月31日

建 物 用 途： 大学内食堂

構　　造： RC

規　　模： 地下　1 階　地上　3 階

建築面積	1,071.71 ㎡
延床面積	4,054.76 ㎡
改修面積	910.00 ㎡

2－2）　工事管理体制

1）　施工業者は当該工事に関した充分な知識と経験を持ち、且つ、作業の指導と指揮の出来る作業責任者のもとによく打ち合わせて作業員名簿他書類など遅延なく提出する。

2）　本施工計画書記載事項は説明会、着工前打ち合わせ会等により作業員に周知徹底させる。

3）　作業責任者は労働基準法等関連法則に従い、作業員を指導する。

4）　作業責任者は安全打ち合わせに出席し、工程及び作業間の調整を行う。

主な外部仕上げ

【食堂改修】	天井	… 岩綿吸音板 吸音ルーバー
	壁	… モルタルアート 塗装 吸音ルーバー
	床	… 磁器質タイル モルタルアート
	建具更新	… 外部ステンレス建具 内部アルミ建具 内部ハンガードア新設
【外構】	外構床	… ウッドデッキ
	その他	… パーゴラテント … 植栽改修
【電気設備工事】	電力引込	… 幹線更新
	動力・電灯	… 改修に伴う再配線
	弱電	… 改修に伴う再配線
【衛生設備工事】		
	給水	… 改修に伴う再配管
	排水	… 改修に伴う再配管
	消火	… 改修に伴う再配管
【空調設備工事】		
	空調	… 改修に伴う再配管
	換気	… 改修に伴う再配管

椙山女学園星が丘キャンパス大学会館食堂・外構リニューアル工事 施工組織表

現場常駐者

非常駐者

清水建設㈱名古屋支店支援部署
安全環境部、見積部、設備部、総務部、調達部、工務部、経理部

名古屋支店
常務執行役員支店長　坂尾　彰信

品　質　長　高林　智広

名古屋支店副支店長　水谷　節郎

品質管理部長　渡邊　幸則

品質管理主査　長岡　正剛

建築部部長　前川　俊哉

・部署安全管理統括責任者
・部署品質管理責任者

生産技術統括部

生産技術統括部部長　柴田　武

品質検査G長　平下　和正

生産推進G長　野瑞　憲太

事務教育G長　萩田　隆夫

建築部副部長　伊藤　茂朗

担当工事長　新地　誠

安全長　鶴野　和弘

設備部部長　長田　隆

設備部設備グループ長　佐藤　敦行

設備部工事長　柴田　亮

現場管理責任者　金子　冬平

・統括安全衛生責任者
・品質管理責任者①②③
・建設副産物処理責任者

派遣

係員　ス インニン

・検査担当者
・品質管理担当者(副)
①②③

事務員　関谷　美由紀

事務員

現責者(品管責任者)
【三現主義による必須確認項目】
※但し⑤⑥⑩は書類確認でも可とする

①建物位置及び基準通芯墨
②建物基準レベル
③建物高さ

※担当者の【正】【副】は記載の通り

確認、検査後基準値を逸脱した場合や判断に迷ったら、必ず上職者に『報連相』しよう！
バッドニュースは迅速に！

施工組織表（第一設備工業）

椙山女学園125WEST計画新築工事

名古屋支店

支店長
氏名：　渡邉　剛志
電話：　052-202-0013

本　社

営業部長
氏名：　荒川　眞司
携帯：　090-5574-5729

工事部長
氏名：　井上　浩明
携帯：　090-4499-7905

統括工事長
氏名：　柴田　基康
携帯：　090-1124-9488

安全部
氏名：　近澤　健二
電話：　03-5443-5120

技術・生産G　品質管理部
氏名：　星　一浩
電話：　03-5443-5105

営業支援

安全・品質・技術支援

現場組織

現場代理人
氏名：　永吉　竜也
携帯：　090-2470-4155
・安全衛生責任者
・品質管理責任者
・検査責任者

・施工図・施工計画書・要領書・工程表の審査、承認者

CADオペレーター
氏名：　横山　景子
携帯：　080-1087-2593
・図面全般

主　任
氏名：　山縣　瑞輝
携帯：　080-1098-7931
・現業全般
・工程表作成
・施工要領書作成


水系消火担当者
(株)北勢工業
氏名：　東　高広
携帯：　090-7686-9524
・現業全般
・消火設備工事各種検査

計装担当者
専門業者(アイ・ビーテクノ㈱)
氏名：　鈴木　隆司
携帯：　080-5977-5510
・現業全般
・計装設備工事各種検査

係　員(派　遣)
氏名：　初田　紘人
携帯：　080-8567-5125
・現業全般

係　員(派　遣)
氏名：　林　恵美
携帯：　080-5689-5125
・現業全般

施工組織表（川北電気工業）

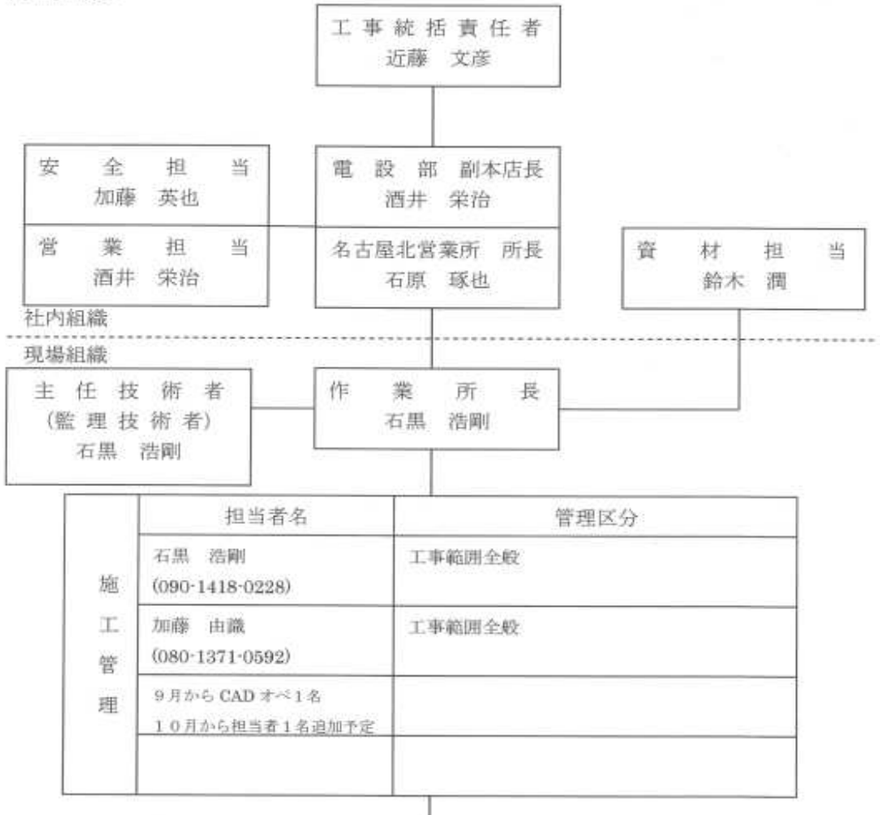

	担当者名	管理区分
施工管理	石黒　浩剛 (090-1418-0228)	工事範囲全般
	加藤　由識 (080-1371-0592)	工事範囲全般
	９月からCADオペ１名 １０月から担当者１名追加予定	

	協力会社名	施工区分	管理担当者
【協力業者 施工管理】	イーテック(有)	現場施工管理	石黒
	９月から現場施工管理者１名追加予定		
【協力業者 作業班】	現状未定		

主任技術者（監理技術者）は請負金額（税込み）45,000千円以上では専任である。

以降の下請負者に対する体制は施工体系図に依る。

支店名	名古屋支店	所属名	建築部
（管理支店名）	（名古屋支店）		
工事名	学校法人 椙山女学園星が丘キャンパス 大学会館食堂リニューアル工事	口座名	椙山星が丘食堂・外構改修
所在地（現場） △	愛知県名古屋市千種区星が丘元町17番3号	口座番号	077802
（事務所） ■	愛知県名古屋市千種区愛知県名古屋市千種区 星が丘元町15番33号	予定工期	５ヶ月
		着工年月日	2026年11月09日
現場・事務所　案内図	N	竣工年月日	2027年03月26日



主任	金子　冬平
電話	080-2955-8590（金子）
ＦＡＸ	
交通機関（最寄りの駅）	
〈現場〉 地下鉄東山線「星ヶ丘駅」 6番出口より　徒歩 6分	
〈現場事務所〉 地下鉄東山線「星ヶ丘駅」 6番出口より　徒歩 6分	
その他	
備考	別途添付ファイルあり

付近拡大（めじるしを具体的に記入のこと）



第３章　現場運営計画

３－１）作業所施工サイクル

①日常活動　　原則として作業時間　　8：00～17：00

・朝礼　8：00～8：10　　職員・作業員全員出席
実施事項．活動内容

新規入場者・出面・有資格者・危険作業等確認
作業連絡調整・内容確認
安全注意事項(現場管理責任者．安全担当者)
服装・健康状態点検、シュピレヒコール

・作業前ミーティング　8：10～8：20　　作業員全員
作業内容、作業手順確認
危険予知活動(ＲＡ・ＳＣ-5)

・新規入場者教育　　8：20～8：30　　新規入場者
受入教育アンケートの記入、内容確認
作業所安全ルールと危険個所・注意事項等の説明

･安全専眼パトロール　ＡＭ　　工事主任
場内安全点検、安全指導

・安全工事工程打合せ　11：45～12：00　　職員、全作業職長
作業間連絡調整、安全パトロール是正指示
午後の作業変更、翌日の工程出面、本日の残業確認、その他伝達事項

・作業終了後片付け　16：50～17：00
ＳＣ-5・担当係員による終了状況確認

・作業終了時パトロール　※協力業者退出
安全施設の点検
火気後始末確認、消灯

②月間活動　　・安全大会　　毎月１回　　8：15～8：30　　職員、作業員全員
所長挨拶、月間工程説明、安全方針説明、伝達事項、
シュピレヒコール

③休日について

基本的に土曜日、日曜日を全休日とし、
現場状況により休日作業の可能性もありとする
但し、近隣施主行事等により、要望がある場合は
全休日もしくは、作業時間調整を行うものとする

３－２）作業所の会議体

①施主、設計・監理関連会議体

・定例会議

《出席者》（毎月2回　隔週金曜日）

施主、設計監理者

施工者（現場代理人、工務担当、設備担当）

《会議内容》

前回議事録の確認

工事進捗、週間工事工程の説明(「予測される事故とその対策」について協議・確認共)

近隣折衝状況の報告

課題事項の検討状況報告と協議

関係者からの協議・連絡事項

次回予定

分科会(建築・設備およびテーマ別の詳細打合)

②現場関連会議体

・施工・工程計画検討会　(随時)

《出席者》

建築現場配属者及び支店・営業所スタッフ(不定期)

《会議内容》

建築工事工程検討・調整

施工計画検討・調整

安全関連過去の災害事例等の勉強会

・職長会、安全協議会　(毎週 金曜日 11：50 ～ 12：00)

《出席者》

職員、全作業職長

《会議内容》

月間工程(月末時)・週間工程説明

安全指示事項

安全パトロール報告、質疑、要望事項等

・特別安全協議会　(毎月末)

《出席者》

現場責任者、協力業者事業主

《会議内容》

月間工程説明

安全指示事項

安全パトロール報告、質疑、要望事項等

③随時活動

・個別工事着前検討会(勉強会)

・危険作業事前打合せ会

第４章　施工計画

４－１）施工方針

「常に先を見据えた計画先行の現場管理と風通しの良い環境づくり」

本工事において、これらを満足させるために当作業所では以下を重点実施項目として推進する。

４－２）作業所重点実施項目

「品質」

・仕上の品質確保
・改修部からの漏水防止
・安全で使いやすい空間のつくり込み

「工程」

・2026年11月1日着工
・2027年 3月31日引渡

「安全」

・休業災害、公衆災害０件
・インフラ事故防止の徹底
・第3者災害の防止
・当社として、決められている事、決めた事を確実に守り、実施する

「環境」

・周辺に充分配慮した施工計画の立案と実行。　※特に騒音、振動、粉塵
・産業廃棄物の分別を徹底させる
・アイドリングストップ、不要時消灯の実施


４－３）総合仮設計画図

※次項添付「総合施工計画図」による


総合施工計画図

■星が丘キャンパス　大学会館食堂リニューアル工事仮設計画図

外部

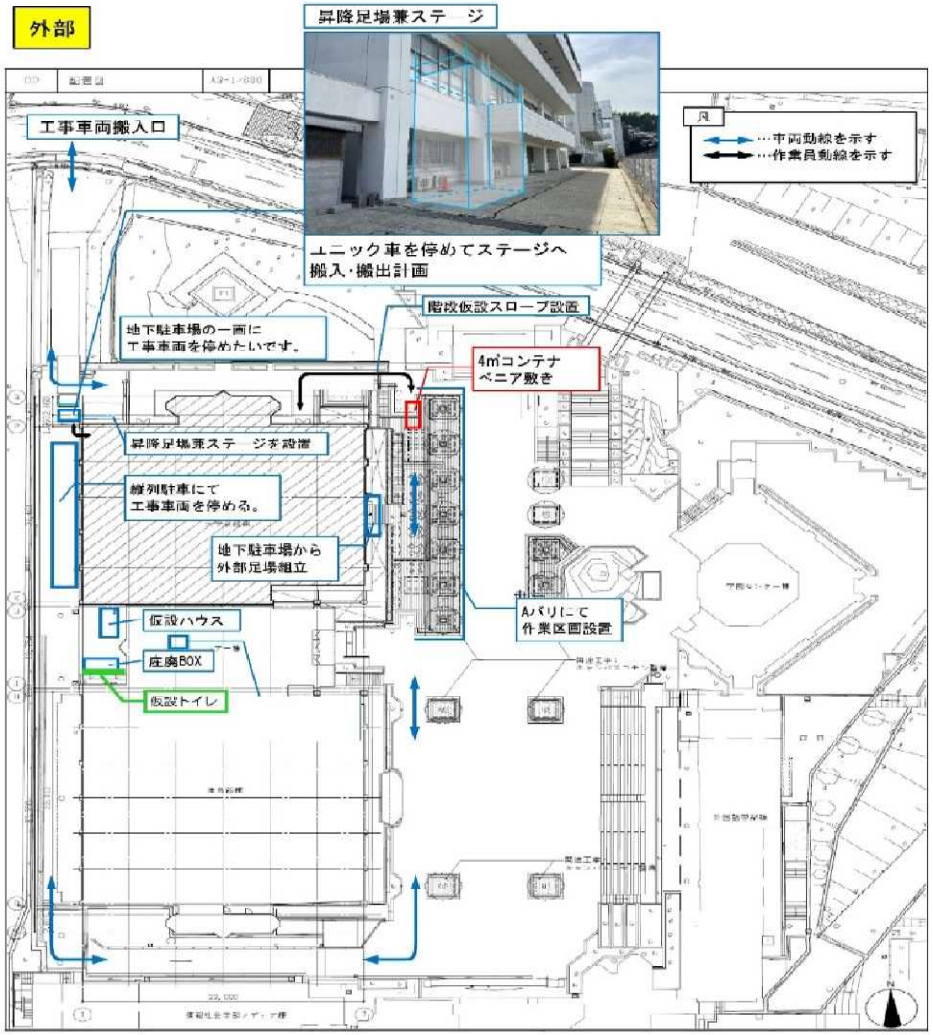

内部

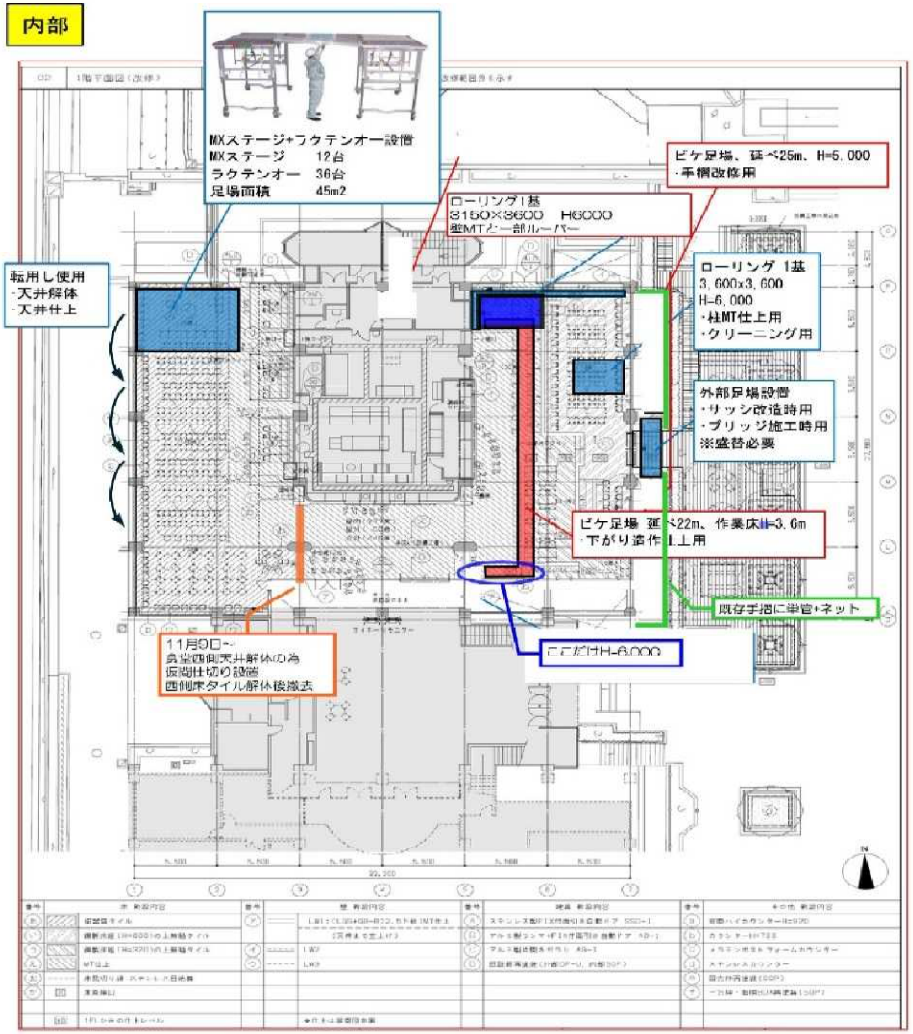

第５章　工程管理計画

５－１）基本事項

本工事の基本事項として契約工期内に建物を造り、顧客に引き渡す事が最重要である。しかし、建築工事における工程は工種が多く、また、天候などによる不確定要素が多いため流動的である。

５－２）総合工程とそのフォロー

当現場においては、総合工程表を作成し、キーデートを明確にして工程管理の管理目標とする。このキーデート達成を目標に、各月又は各週における工程表を作成しフォローを随時行う。

５－３）工程の変更

マスター工程上のキーデートが守れないと判断した場合は、工法・手順の検討及び社内スタッフへの支援を要請し、契約工期に間に合せるように変更する。変更した場合は、その都度、各種工程表を修正し、その内容を本工事関係者に報告する。


５－４）総合工程表

※次頁添付「総合工程表」による

５－５）施工図と施工計画書リスト

※次頁添付「施工図・製作図リスト」「施工計画書・要領書リスト」による。

工程表

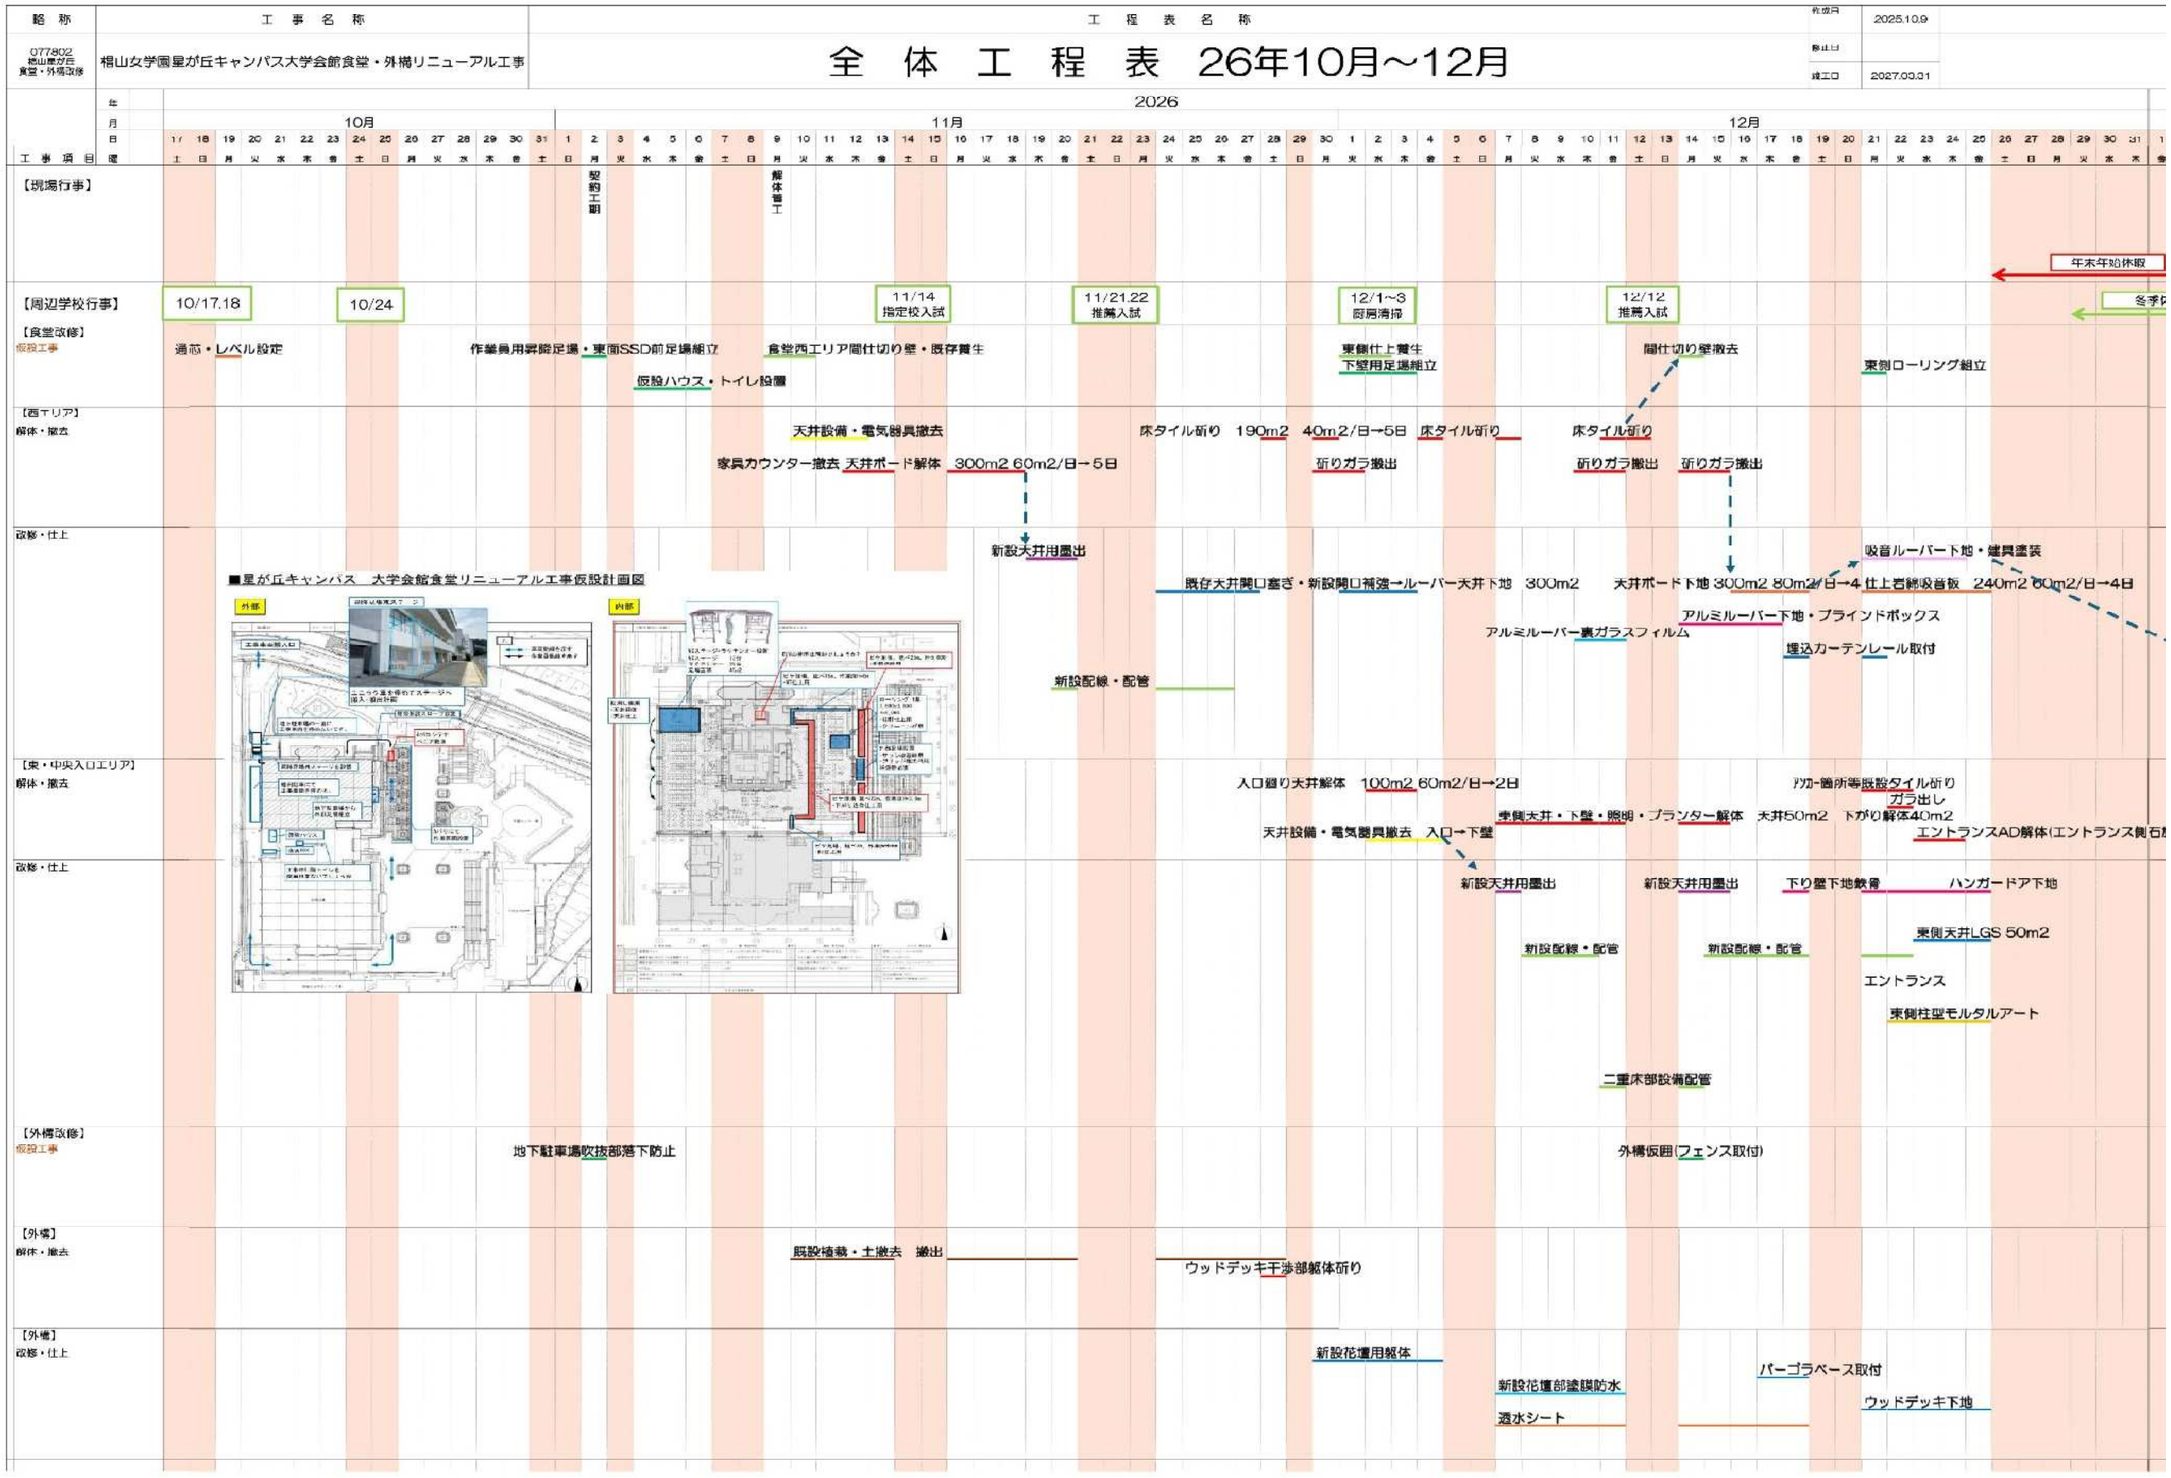
略称
077802 椙山女学園星が丘 食堂・外構改修
工事名称
椙山女学園星が丘キャンパス大学会館食堂・外構リニューアル工事
工程表名称
全体工程表 26年10月～12月
作成日 2025.10.9
竣工日 2027.03.31
2026
10月
11月
12月
工事項目
【現場行事】
契約工期
解体着工
年末年始休暇
【周辺学校行事】
10/17.18
10/24
11/14 指定校入試
11/21.22 推薦入試
12/1～3 厨房清掃
12/12 推薦入試
【食堂改修】
仮設工事
通芯・レベル設定
作業員用昇降足場・東面SSD前足場組立
仮設ハウス・トイレ設置
食堂西エリア間仕切り壁・既存養生
東棟仕上養生
下壁用足場組立
間仕切り壁撤去
東側ローリング組立
【西エリア】
解体・撤去
天井設備・電気器具撤去
家具カウンター撤去 天井ボード解体 300m2 60m2/日→5日
床タイル斫り 190m2 40m2/日→5日
斫りガラ搬出
改修・仕上
新設天井用墨出
■星が丘キャンパス 大学会館食堂リニューアル工事仮設計画図
外部
内部
既存天井開口塞ぎ・新設開口補強→ルーバー天井下地 300m2
天井ボード下地 300m2 80m2/日→4
吸音ルーバー下地・鏡貼塗装
仕上岩綿吸音板 240m2 60m2/日→4日
アルミルーバー下地・ブラインドボックス
アルミルーバー裏ガラスフィルム
埋込カーテンレール取付
新設配線・配管
【東・中央入口エリア】
解体・撤去
入口廻り天井解体 100m2 60m2/日→2日
天井設備・電気器具撤去 入口→下壁
車側天井・下壁・照明・プランター解体 天井50m2 下がり解体40m2
ガラ出し
エントランスAD解体(エントランス側石
新設天井用墨出
下り壁下地鉄骨
ハンガードア下地
東側天井LGS 50m2
エントランス
東側柱型モルタルアート
二重床部設備配管
【外構改修】
仮設工事
地下駐車場吹抜部落下防止
外構仮囲(フェンス取付)
【外構】
解体・撤去
既設埋設・土撤去 搬出
ウッドデッキ干渉部躯体斫り
【外構】
改修・仕上
新設花壇用躯体
パーゴラベース取付
新設花壇部塗膜防水
ウッドデッキ下地
透水シート

略称	工事名称	工程表名称	作成日	2025.10.0
077802 梅山女学園 食堂・外構改修	梅山女学園星が丘キャンパス大学会館食堂・外構リニューアル工事	全体工程表 27年1月～3月	修正日	
			竣工日	2027.03.31

2027

1月 2月 3月

【現場行事】

【周辺学校行事】

【食堂改修】
仮設工事

【西エリア】
解体・撤去

改修・仕上


【東・中央入口エリア】
解体・撤去

改修・仕上

【外構改修】
仮設工事

【外構】
解体・撤去

【外構】
改修・仕上

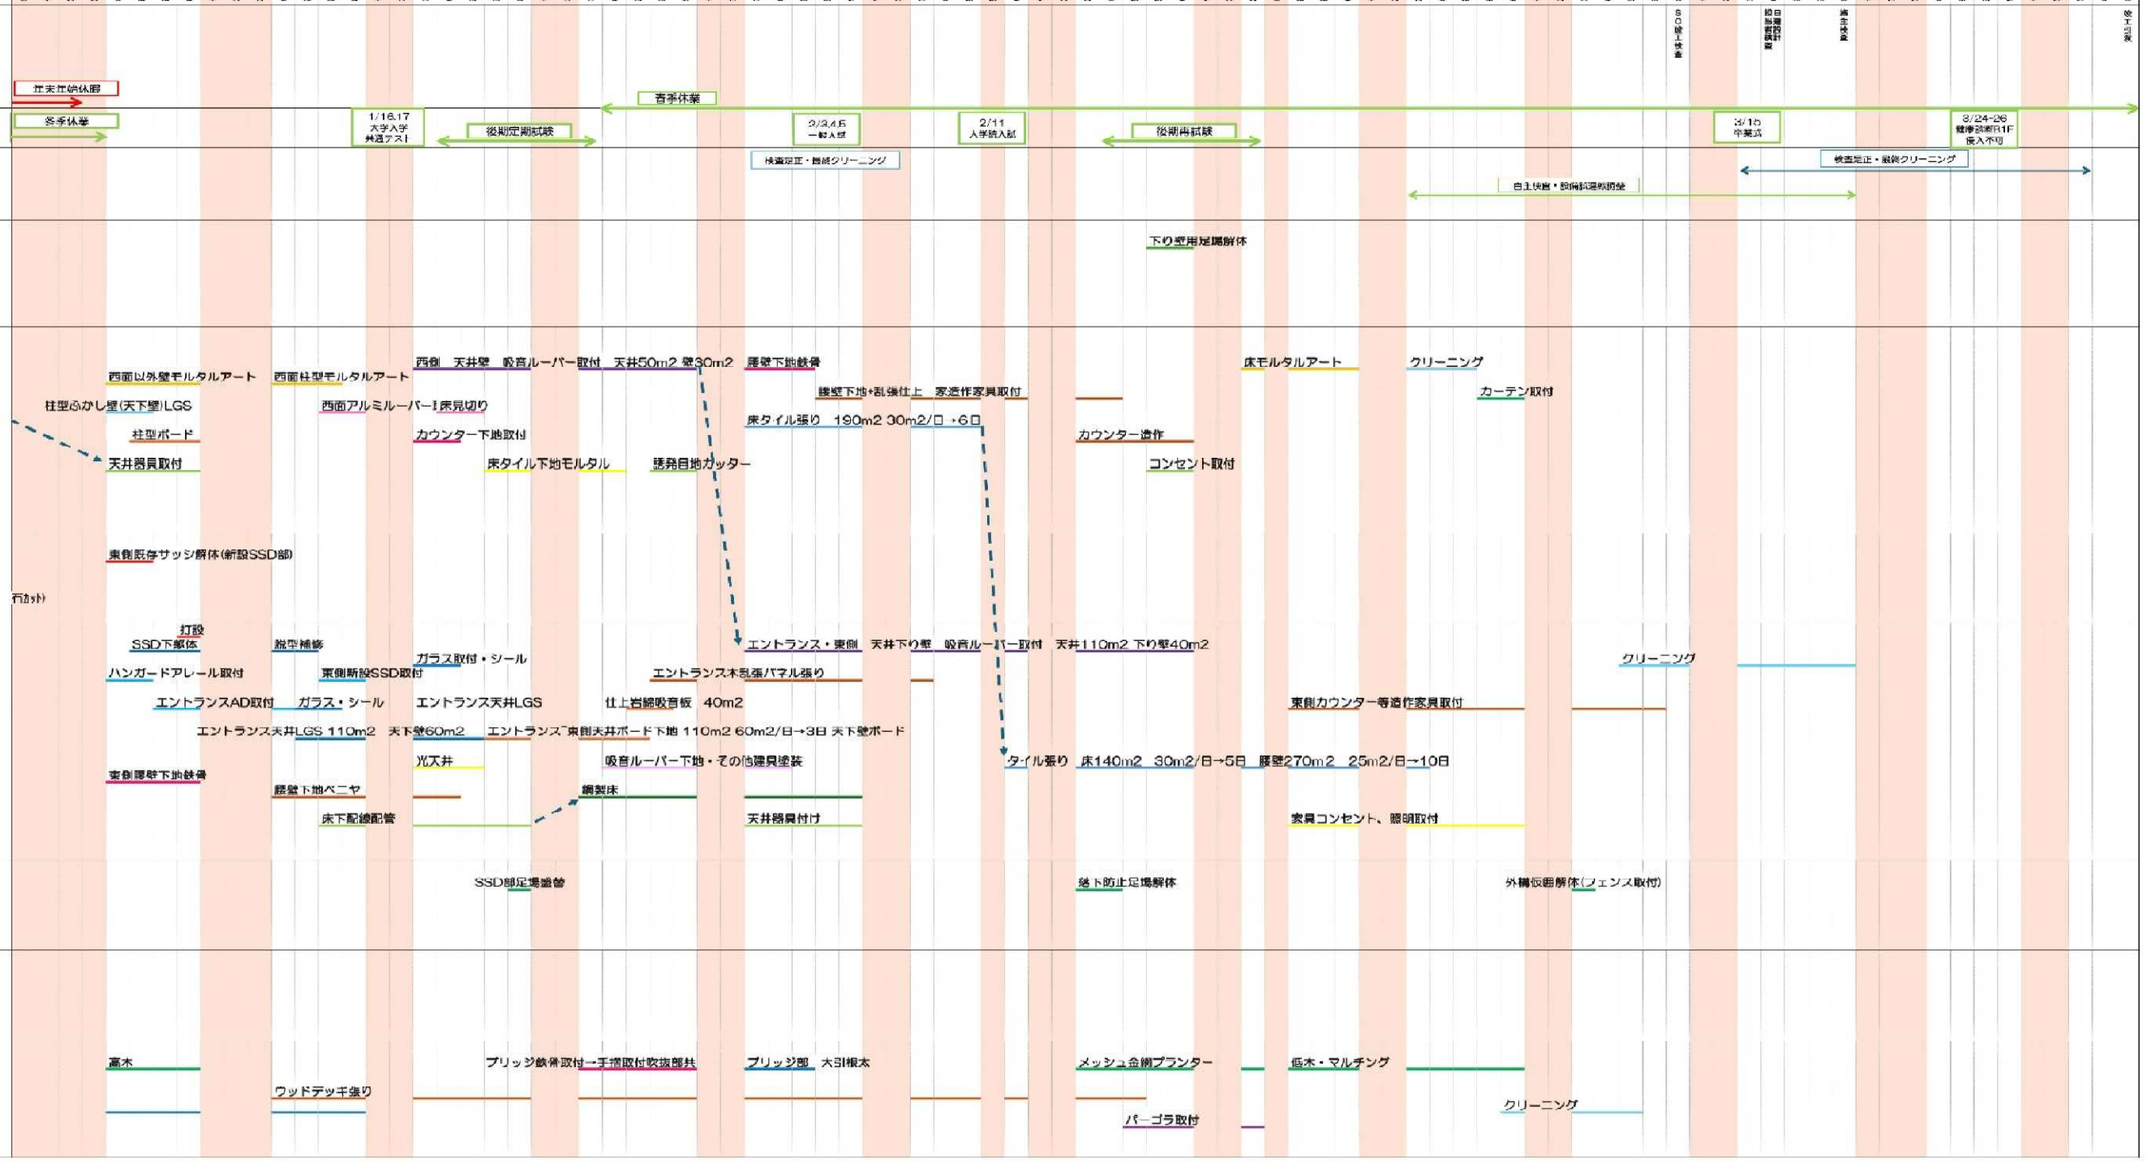

施工図リスト8

現場／現場責任者：金子　冬平

統責者	生産技術統括部 生産推進G

工事名：　椙山女学園星が丘キャンパス大学会館食堂・外構リニューアル工事

工期：2025.03.20～2027.01.15
敷地：11,224.31m2
建面：1,984.90m2
延面：11,699.07m2
構造：S造
設計者：㈱日建設計

通し番号	整理番号	図面名称	PDS 外注予定日	PDS 検図期間	PDS 出図予定日	PDS 受図日	生推G・現場 検図期間	生推G・現場 提出予定日	生推G・現場 提出日	監理者図面回覧 監理者確認期間	打合1 提出	打合1 返却	打合2 提出	打合2 返却	完了予定日	修正検図期間	監理者確認期間	受領 提出	受領 返却	決定図 予定日	決定図 決定日	製作期間	施工予定	作図業者等	決定後変更図 1 提出	決定後変更図 1 返却	決定後変更図 2 提出	決定後変更図 2 返却	図面終了確認日	備考
																							R7 R8 R9	2025年 2026年 2027年						
0		**【躯体図】**																												
1	【躯体図】	**杭伏図**	3/20	28	4/17		3	4/20		14					5/4	7	7			5/18		14	6/1	2D作図						20250307で作図開始済
2	【躯体図】	**基礎伏図**	4/17	28	5/15		5	5/20		12					6/1	7	7			6/15		30	7/15	3D作図						
3	【躯体図】	**1階床伏図**	5/9																					作図						
4	【躯体図】	**2階床伏図**																												
5	【躯体図】	**3階床伏図**																												
6	【躯体図】	**4階床伏図**																												
7	【躯体図】	**5階床伏図**																												
8	【躯体図】	**6階床伏図**																												
9	【躯体図】	**7階床伏図**																												
10	【躯体図】	**R・PH階床伏図**																												
11																														
12																														
13		**【仕上図】**																												
14	【仕上図】	**1階平面詳細図**																												
15	【仕上図】	**2階平面詳細図**																												
16	【仕上図】	**3階平面詳細図**																												
17	【仕上図】	**4階平面詳細図**																												
18	【仕上図】	**5階平面詳細図**	7																											
19	【仕上図】	**6階平面詳細図**	8/1																					作図						
20	【仕上図】	**7階平面詳細図**	8/15	28	9/12		14	9/26		21					10/17	21	7			11/14		199	6/1	3D作図						
21	【仕上図】	**R・PH階平面詳細図**	8/29	28	9/26		14	10/10		21					10/31	21	7			11/28		199	6/15	3D作図						
22																														
23																														

例

施工図添付書

工事名

椙山女学園星が丘キャンパス大学会館食堂・外構リニューアル工事

図面名称	躯体	仕上	設備
【躯体図】	打合図1	受領図	受領印用図
1階平面詳細図	発行日	返却希望日	
施工予定日 2025/6/1			

	発注者			施工部署					設備部	
				現場管理責任者	工務長	現業長	主任	生産技術統括部	工事長	担当者
印										
日付										

	設計責任者	工事監理者	工事監理担当者								
			意匠		構造		機械		電気		
印											
日付											

記　事（質疑応答・連絡事項・その他）

製作図リスト10

現場／現場責任者：金子　冬平

統責者	生産技術統括部 生産推進G

工事名：　椙山女学園星が丘キャンパス大学会館食堂・外構リニューアル工事

通し番号	整理番号	工期：2025.03.20～2027.01.15 敷地：11,224.31m2 建面：1,984.90m2 延面：11,699.07m2 構造：S造 設計者：㈱日建設計 図面名称	作図手配	展開先関連図	業者作成		生推G・現場			監理者図面回覧										決定図		製作期間	施工予定	作図業者等	決定後変更図				図面終了確認日	備考
											打合1		打合2					受領							1		2			
			手配実施日	下記に展開	出図予定日	受図日	検図期間	提出予定日	提出日	監理者確認期間	提出	返却	提出	返却	完了予定日	修正検図期間	監理者確認期間	提出	返却	予定日	決定日		R7 R8 R9	2025年 2026年 2027年	提出	返却	提出	返却		
0		【椙山デッキ・ブリッジ】																											
1	デ-09	デッキ図			7/19		10	7/29		15					8/13	10	10			9/2		60	11/1							鉄骨下地図を6/15回収する
2	デ-09	鉄骨一般図			6/19		10	6/29		15					7/14	10	10			8/3		90	11/1	中央鐵骨						
3	デ-09	鉄骨詳細図																											
4	デ-09	ワイヤーロッド図（斜材）																											鉄骨下地図を6/15回収する
5	デ-11	人工大理石図（ベンチ）																											
6	デ-12	磁器質タイル図																											
7	デ-13	EXP.J図（本体～椙山デッキ間）																											
8	デ-13	EXP.J図（椙山デッキ～地下通路間）																											
9	デ-13	アルミスパンドレル図（幕板・軒天）																											鉄骨下地図を6/15回収する
10	デ-13	笠木図																											鉄骨下地図を6/15回収する
11	デ-13	ガラス手摺図																											鉄骨下地図を6/15回収する
12	デ-13	側溝蓋図（デッキ上・地下通路内）																											
13	デ-13	樋図																											鉄骨下地図を6/15回収する
14	デ-13	パンチングメタル図（ベンチ）																											鉄骨下地図を6/15回収する
15	デ-13	水切（軒天端部）																											鉄骨下地図を6/15回収する
16	デ-13	手すり照明図																											
17	デ-13	ライン照明ボックス図																											
18	デ-19	緑化ウォール図			2/16		10	2/26		15					3/13	10	10			4/2		60	6/1							鉄骨下地図を6/15回収する
19	デ-55	ボックスカルバート図			4/19		10	4/29		15					5/14	10	10			6/3		90	9/1	旭コンクリート工業						
20																													
21																													

例

製作図添付書

工事名

椙山女学園星が丘キャンパス大学会館食堂・外構リニューアル工事　20

製作図名称	躯体	仕上	設備
	打合図1	受領図	受領印用図
施工予定日　2025/11/1	発行日	返却希望日	

	発注者			施工部署					設備部	
				現場管理責任者	工務長	現業長	主任	生産技術統括部	工事長	担当者
印										
日付										

	設計責任者	工事監理者	工事監理担当者								
			意匠		構造		機械		電気		
印											
日付											

記　事（質疑応答・連絡事項・その他）

施工計画書・要領書リスト12

工事名：	椙山女学園星が丘キャンパス大学会館食堂・外構リニューアル工事			R7 2025年 R8 2026年 R9 2027年	統責者								生産技術統括部 生産推進G								
整理番号	図面名称	協力業者	手配実施日	推進G受領予定日	推進G確認期間	現場提出予定日	現場提出日	監理者確認期間	監理者チェック版提出日				修正期間	監理者確認期間	受領図提出日		監理者承認予定日	監理者承認日	製作期間	現場施工予定日	備考
									1回目		2回目										
									提出	返却	提出	返却			提出	返却					
0	【地　業】																				
1	総合施工計画書			4/7	7	4/14		14					14	7			5/19		14	6/2	
2	山留工事施工計画書(椙山デッキ)	ジェコス		4/7	7	4/14		14					14	7			5/19		14	6/2	
3	くい地業工事施工計画書(Smart-MAGNUM工法)	ジャパンパイル		4/7																6/2	BOX済
4	くい地業工事施工計画書(N-ECSパイル工法)	三誠																			
5	NewJ-BAR施工計画書	未																			
6	ボックスカルバート工事施工計画書	秋吉組																			
7																					
8																					
9																					
10	【躯　体】																				
11	コンクリート配合計画書	ティーシートレーディング																			
12	ハイベースNEO工事施工計画書	センクシア																			BOX済
13	コンクリート工事施工計画書																				散水養生･補修要領含める
14	鉄筋・圧接工事施工計画書	金神鋼業																			BOX済
15	型枠、ラス型枠工事施工計画書	㈱クリモト建設																			
16																					
17	鉄骨工事施工計画書	中央鐵骨																			BOX済
18	鉄骨工事工場製作要領書	中央鐵骨																		1	BOX済
19	鉄骨溶接部検査要領書			7/8																11/1	
20	鉄骨階段製作要領書	横森製作所		7/8	7	7/15		21					21	7			9/2		60	11/1	BOX済
21	デッキ･スタッド工事施工計画書	クギン		8/7	7	8/14		21					21	7			10/2		30	11/1	BOX済
22																					
23																					

例

施工計画書・要領書添付書

工事名

椙山女学園星が丘キャンパス大学会館食堂・外構リニューアル工事

製作図名称	躯　体	仕　上	設　備
【仕　上】	打合図1	受領図	受領印用図
施工予定日　1900/1/0	発行日	返却希望日	

	発注者			施工部署					設備部	
				現場管理責任者	工務長	現業長	主任	生産技術統括部	工事長	担当者
印										
日付										

	設計責任者	工事監理者	工事監理担当者								
			意匠		構造		機械		電気		
印											
日付											

記　事（質疑応答・連絡事項・その他）

第６章　品質管理計画

６－１）作業所重点品質管理項目

機能、性能を満足した建物を正しい手順で造る事を目標に、各協力業者一体となった事前打合せおよび検討を行い、適正な品質を工事毎に造り込む。特に躯体品質の確保（躯体のひび割れ防止他）、各部位からの漏水防止、設備工事関連の不具合防止の為の検討を重点的に行う。

下記に品質管理項目として、重点的に品質検討を行う項目を示す。

・既存仕上の上からの仕上に対するの品質確保
・改修建具からの漏水防止
・安全で使いやすい空間のつくり込み

６－２）共通施工品質計画書

本工事における品質管理は、当社建築事業部門のＩＳＯ９００１における共通施工品質計画書により行う。

６－３）社内スタッフによる検査・支援とその体制

本工事における社内スタッフによる巡回および検査は、
施工中のプロセスの確認検査と個別工事おける品質検討会の二つの側面により行う。
※社内スタッフとは生産技術統括部 生産技術G・品質管理G 設備部を指す。

プロセスの確認検査については以下の項目を行う。

・着工前品質検討会：着工前に品質管理上のポイント確認と懸案事項の洗い出しを行う
　実施責任者は金子　冬平とする。
・中間検査(建築)　：躯体がほぼ完了し内外仕上げ工事時点で躯体の出来栄えと仕上工事検査を社内スタッフにて行う。
　実施責任者は金子　冬平とする。
・中間検査(設備)　：設備工事着手し天井ボード着手前に主に隠蔽部を中心に社内スタッフにて検査を行う。
　実施責任者は金子　冬平とする。
・竣工検査　　：設計、監理者検査前に社内スタッフにて検査を行う。
　実施責任者は金子　冬平とする。

個別検討会については以下の項目を行う。

・解体工事個別検討会：社内スタッフ、取引業者を交え検討会を行う
　社内担当者は金子　冬平とする。

第７章　監理者への対応

７－１）各書類について

施主提出書類の流れについては、
清水建設案作成・提出　→　監理者チェック　→清水建設作成・提出
→監理者確認の順序で行う。

７－２）変更、質疑、協議について

本工事の推進にあたり、設計図書・質疑回答書・その他共通仕様書等において、質疑や施工方法の検討等による変更の要求が発生した場合は、質疑応答書をもって、工事監理者と協議を行い、承諾の上実施する。承諾内容については、質疑応答書を作成の上、関係者に周知する。
※次頁添付　質疑応答書フォーマット

７－３）立会い検査について

各工事における、立会い検査については、協力業者の自主検査を受け、当社が自主検査を行う。合格したものについて、立会い検査依頼の上、立会い検査を受ける。また、検査により是正指示等があった場合は､必要な部分の是正を行い、その結果を報告書(検査記録)として提出し、承諾を得る。
※次頁添付　検査記録フォーマット

工 事 連 絡 書（質 疑 回 答）

工 事 名

椙山女学園星が丘キャンパス
大学会館食堂・外構リニューアル工事

回答発信

設計担当 山上


監理者

第 構造-01 号

2025 年 3 月 13 日

確認	発注者				殿 /	写し受領	受注者	清水建設株式会社 宮崎	殿	/
確認					殿 /	写し受領			殿	/
確認	日建設計 (担当ﾀﾞｲﾚｸﾀｰ)	設計	構造	設備		写し受領			殿	/
確認	日建設計 (設計担当)	設計 山上	構造 平山・前川	電気	空・衛	写し受領			殿	/
確認	日建設計 (監理ﾀﾞｲﾚｸﾀｰ)	ﾀﾞｲﾚｸﾀｰ				写し受領			殿	/
確認	日建設計 (監理担当)	建築							殿	/

連絡経路



件 名

鉄骨納
コンクリート

例

提出日 2025 . 3 . 13

回答希望日 2025 . 3 . 21

質疑応答者

番号	質 疑	回 答	設計変更か否の判定

検　査　記　録

工事名　　椙山女学園星が丘キャンパス大学会館食堂・外構リニューアル工事

検査内容／範囲	○○○○○○○○○○ ／ ○○○○○○○○○○○○○		
検査実施月日	201X 年 ○○ 月 ○○ 日	日建設計	□ ○○○○○
		監理者	□ ○○○○○
		受注者	○○○○○
		監理技術者	○○○○○

受注者の品質管理（別紙

□ 品質管理が適正に

□ 品質管理が適正に

（○○○○○○○○○○○○○○　　）

例

検査／範囲 、内容（別紙　有 ・無 ）

工事と設計図書との照合及び確認を行った結果と確認方法

確認結果：　□ 適正　　□ 不適正

確認方法：　□ 抽出による立会い確認　　□ 受注者の品質管理記録等の確認

不適正と判断された事項：

□ 受注者の品質管理記録と現場に食い違いがある。

□ 工事と設計図書を照合した結果に食い違いがある。

（ ○○○○○○○○○○○○○○○　　）

不適正なものについては工事工程を調整して是正を実施してください。

不適正への是正に関する検査／結果（別紙　有 ・ 無 ） ・検査の範囲 ○○○○○○○○○○ ・検査の内容 ○○○○○○○○○○	是 正	□ 完了
	是 正 確 認	201X年○○月○○日
	確 認 方 法	□ 立会い確認
		□ 書類確認
	監　理　者	□ ○○○○○
	受注者 監理技術者	○○○○○ ○○○○○

書式2014.12.01日建設計

第８章　安全衛生管理計画

８－１）安全衛生管理計画の作成と周知

工事に先立ち、現場管理責任者は作業所関係者ならびに第三者の安全確保を目的とした基本方針である安全管理計画を作成する。この安全管理計画を基に、安全管理組織・体制、緊急時の連絡体制、工事全般に対する安全管理計画表を作成する。
安全管理計画表類は事務所・作業員詰所に掲示し、安全管理計画の内容は、特別安全協議会・安全協議会・新規入場者教育等を通じて作業所関係者へ周知する。

８－２）安全衛生管理計画のフォロー

安全管理計画表に基づき、具体的な対策を実行する為に、工事の進行に合わせて月間（必要に応じ週間）の実施事項を定めた計画表を作成する。実施事項については、各協議会並びに工程打合せ会等により協議し決定する。（月間工程表及び週間工程表に明記を行う。）

８－３）工事別実施計画の作成

工事の進行に伴い、各工事別に具体的な実施計画を協議し作成する。当初作成の計画に変更がある場合は、その都度、当初計画を見直し変更する。各工事別実施計画は、個別工事着工前打合せにより内容を協議し確認する。
個別工事着工前打合せは、個別工事の業者が決定し作業所に入る前に、施工計画(設計図・施工計画図・施工計画書等)、安全管理計画をもとに、取引業者の代表者又は現場代理人及び作業主任者(職長)と面談の上、作業方法・手順、作業手順毎の危険予測と対策、対策責任区分等について相互協議し確認する。

８－４）工事別実施計画のフォロー

個別工事着工前打合せの内容を基に、作業着手直前(前日又は当日)に当社従業員と取引業者(職長)は手順・災害防止対策等を確認する。確認内容について、関係作業員全員に対し周知するよう取引業者(職長)を指導する。また、作業着手時に、安全施工サイクルを通し、当社従業員は打合せ通りに作業されている事を確認する。作業所長は施工を安全に行う事を目的とした[安全専眼パトロール]を毎日実施し、指摘事項を速やかに是正し再発防止に努める。

８－５）外部安全パトロールの実施

作業所の安全管理計画及び実施状況を、点検・指導する事を目的としたパトロールを実施する。パトロール隊は、当社幹部、安全管理推進者、他現場の統括安全管理責任者、当社及び取引業者からなる災害防止協議会会員、職長会分会会員、作業所職長会会員などにより編成される。作業所は、パトロールによる指摘事項を速やかに是正すると共に再発防止に努める。

８－６）作業所安全重点実施事項

決められている事、決めた事を守って安全第一で作業を行う事を目標とし、作業中においては常に現場周辺の状況に気を配り、近隣への配慮に努める。

８－７）現場内喫煙について

学園内は禁煙管理とする

８－８）作業所緊急連絡体制表（安全）

※次頁添付「作業所緊急連絡体制表(安全)」による。

椙山女学園星が丘キャンパス大学会館食堂・外構リニューアル工事　作業所緊急連絡体制表

※作業所事務所の見易い場所に掲示し、当社職員、派遣職員、JV他社職員の全ての所員に周知する。

【安全】 当社COHSMS「4.1.12 緊急事態への対応」に基づく安全管理標準 様式－24

労働保険番号	23 － 1 － 03 － 800028 － 535

事故発見者

すみやかに

作業所責任者	金子　冬平
連絡通報責任者	金子　冬平

社　内

安全長

（氏 名）鶴野　和弘　（電話 昼・夜）090-7608-5978

部署連絡

支店		
	安全環境部（夜間連絡先）	052－203－1499（丸山部長 080-1918-1402 吉田G長 080-1621-0891）
	総務部	052-201-7611
	建築部	052-203-1495

支店緊急連絡網

発注者・設計事務所			
	学校法人椙山女学園	現　場	052-781-1186
		本　部	052-781-1186
	株式会社日建設計	昼　間	052-261-6131
		夜　間	
	担当者	工藤	080-6907-8449

関係監督官庁			
	千種警察署	緊　急	110
		所轄署	052-753-0110
	千種消防署	緊　急	119
		所轄署	052-764-0119
	名古屋東労基署		052-800-0793
	千種土木事務所		052-781-5211
	名古屋市役所		052-961-1111
	千種区役所		052-762-3111

埋設物管理者			
	ガス	東邦液化ガス	052-788-7100
	電力	中部電力 熱田営業所	0120-929-479
	NTT		116
	水道	西部営業センター	052-722-8750
	下水	西部管路センター	052-722-8750

救急指定			
	区分	一般病院	脳外科病院	眼科病院
	名称	日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院		
	電話	052－832-1121		
	住所	愛知県名古屋市昭和区砂見町2－9		

社内関係者・関係近接作業所連絡先		
作業所長	金子　冬平	080-2955-8590
係員	ス　インニン	080-8996-8641
部署長	前川　俊哉	090-3230-9541
副部長	伊藤　茂朗	080-1607-9318
安全長	鶴野　和弘	090-7608-5978

取引業者他連絡先		
鳶工事	株式会社トビック	052-332-0265
解体工事	靖幸建設	052-908-1181
内装工事	株式会社ミルックス	0567-55-1633
木工事	株式会社 ミディック	052-895-7551
電気設備工事	川北電気工業株式会社	052-251-7111
設備工事	第一設備工業株式会社	052-202-0013

緊急連絡時の心得

○できるだけ早く第一報する
○あわてず・迅速・正確に
○簡潔に・落ちなく
　なにが・どこで・いつ・現状・負傷者の有無・今後の見通し

名古屋支店 安全環境部　改訂　2016.01.01

第９章　環境保全計画

９－１）作業所重点環境管理項目

・周辺に充分配慮した施工計画の立案と実行。　※特に騒音、振動、粉塵
・産業廃棄物の分別を徹底させる
・アイドリングストップ、不要時消灯の実施
・適切な排水管理の徹底

９－２）施工環境計画書

本工事における環境保全計画は、当社ＩＳＯ１４００１における
環境システム文書一覧表・環境活動計画・環境重点管理表・作業所環境教育計画
により行う。

９－３）作業所緊急連絡体制表（環境）

※次頁添付「作業所緊急連絡体制表(環境)」による。

椙山女学園星が丘キャンパス大学会館食堂・外構リニューアル工事　作業所緊急連絡体制表

※作業所事務所の見易い場所に掲示し、当社職員、派遣職員、JV他社職員の全ての所員に周知する。

【環境】 ISO14001：4.4.7 緊急事態への対応

学校法人 椙山女学園	現　地	052-781-1186
	本　部	052-781-1186
	夜　間	
株式会社 日建設計	昼　間	052-261-6131
	夜　間	
担当者	工藤	080-6907-8449

作業員の健康に障害が発生した場合

救急指定		
区分	一般病院	地域中核病院
名称	日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院	
電話	052-832-1121	
住所	愛知県名古屋市昭和区砂見町2－9	

事故発見者

すみやかに

作業所責任者	金子　冬平
連絡通報責任者	金子　冬平

社　内

安全長

（氏　名）	（電話　昼・夜）
鶴野 和弘	090-7608-5978

部署連絡

社内関係者・関係近接作業所連絡先		
作業所長	金子　冬平	080-2955-8590
係員	ス　インニン	080-8996-8641
部署長	前川　俊哉	090-3230-9541
副部長	伊藤　茂朗	080-1607-9318
安全長	鶴野　和弘	090-7608-5978

環境（大気・水質等）に多大な影響

都道府県（政令市）環境部局

名古屋市環境局　052-972-2672

※ダイオキシン類の場合は直ちに報告義務

影響が少ない

市役所又は最寄の保健所

千種保健センター　052-753-1973

重油流出（第1通報先）

千種消防署　052-764-0119

必要な場合（部門安全環境部と打合せる）

千種警察署　052-753-0110

支店		
	安全環境部（夜間連絡先）	052－203－1499（丸山部長 080-1918-1402 / 高橋主査 090-5110-4778）
	総務部	052-201-7611
	建築部	052-203-1495

支店緊急連絡網

委託処理会社・取引業者他　連絡先	
誠美社工業株式会社	0561-86-8818
名古屋港木材倉庫株式会社	052-611-0311

緊急連絡時の心得

- ○発生状況を正確に把握する
- ○できるだけ早く第一報する
- ○あわてず・迅速・正確に
- ○簡潔に・落ちなく
  なにが・どこで・いつ・現状・負傷者の有無・今後の見通し
- ○被害拡大を防止し、行政と打合せ現状復旧に取り掛かる

名古屋支店 安全環境部　改訂　2016.01.01
