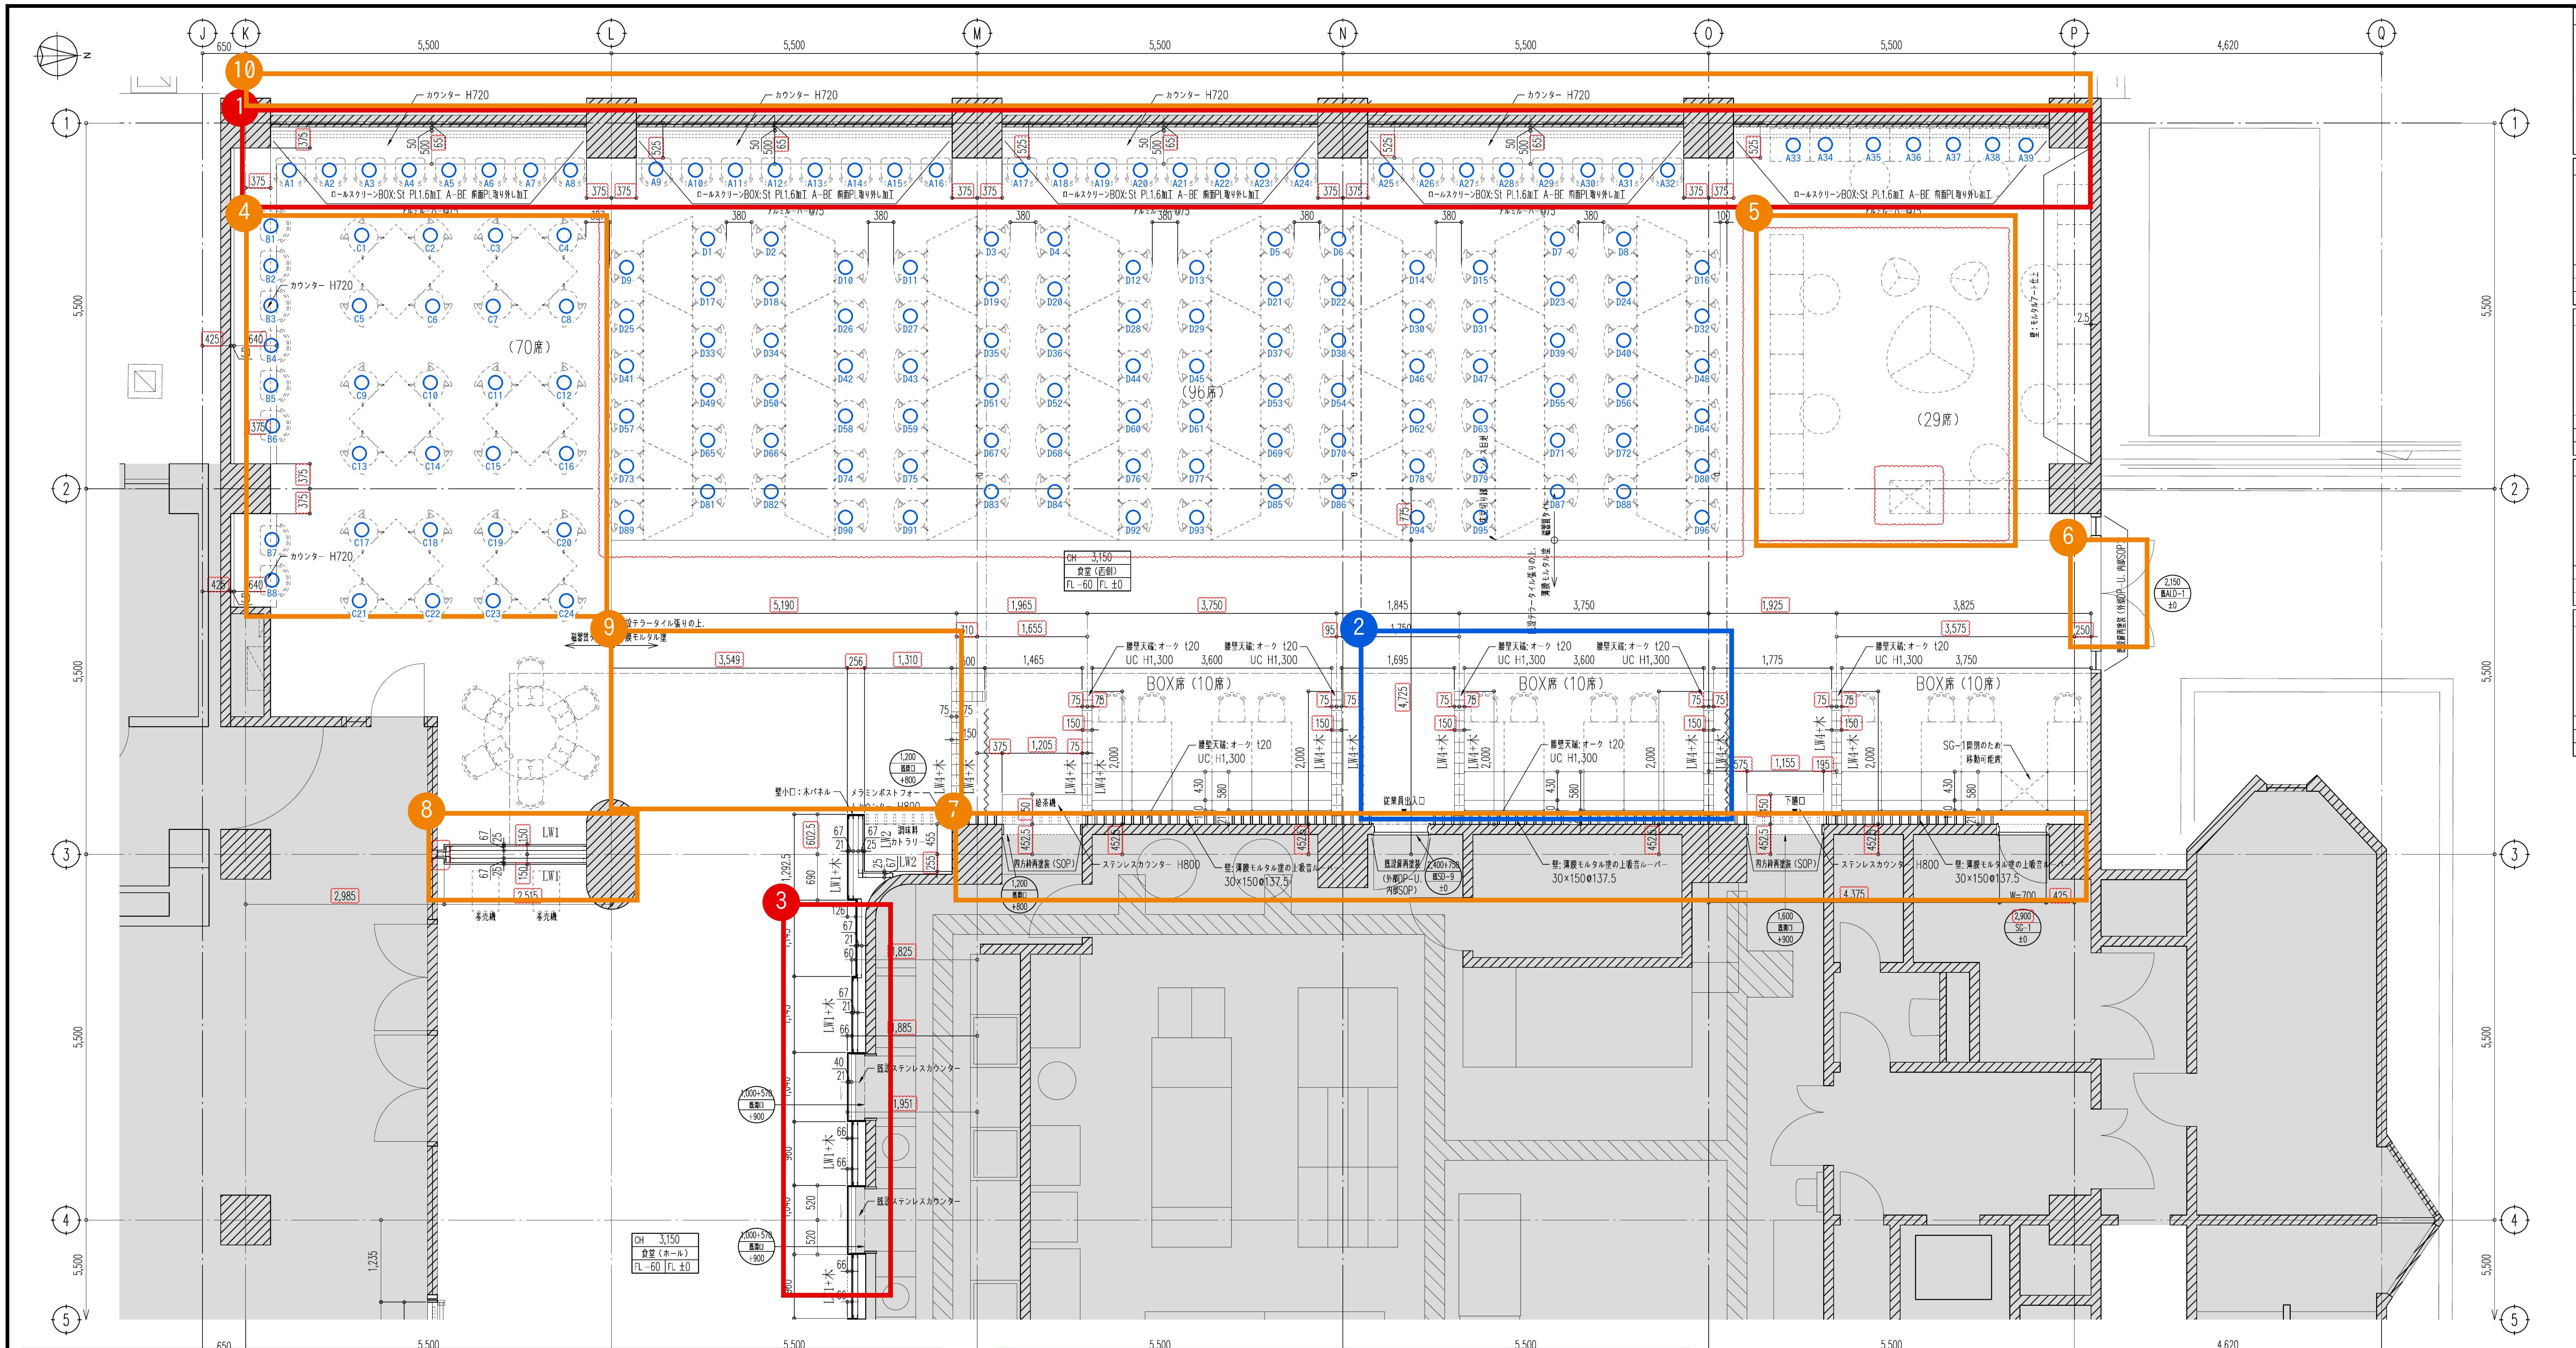
J
K
L
M
N
O
P
Q
1
2
3
4
5
650
5,500
4,620
10
1
4
5
6
9
2
8
7
3
カウンター H720
ロールスクリーンBOX:St PL1.6加工 A-BE 側面PL取り外し加工
A1〜A39
B1〜B8
C1〜C24
D1〜D96
(70席)
(96席)
(29席)
BOX席 (10席)
CH 3,150
食堂 (店舗)
FL-60 FL ±0
CH 3,150
食堂 (ホール)
FL-60 FL ±0
LW1
LW2
LW4+木
ステンレスカウンター H800
壁:薄膜モルタル塗の上着色ルーバー
30×150@137.5
既設ステンレスカウンター
従業員出入口
ALD-1
2,150

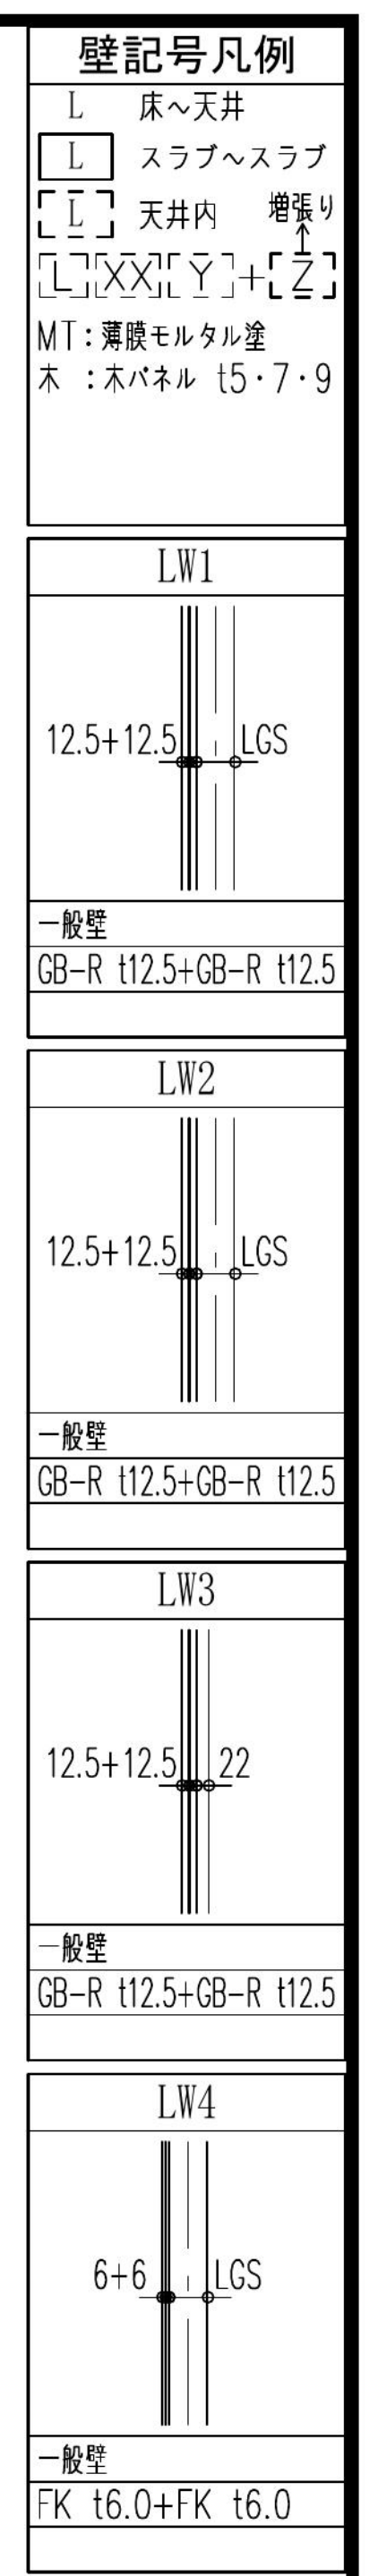
壁記号凡例
L 床〜天井
L スラブ〜スラブ
L 天井内
増張り
L XX Y + Z
MT:薄膜モルタル塗
木 :木パネル t5・7・9
LW1
12.5+12.5
LGS
一般壁
GB-R t12.5+GB-R t12.5
LW2
12.5+12.5
LGS
一般壁
GB-R t12.5+GB-R t12.5
LW3
12.5+12.5
22
一般壁
GB-R t12.5+GB-R t12.5
LW4
6+6
LGS
一般壁
FK t6.0+FK t6.0

仕上-1 受領図 v2.0 指摘 (1/2)　赤＝要修正　橙＝要確認　青＝対応中

1 ［要修正］①通り窓際カウンター H720：実測の柱型間 4,678〜4,705 より 45〜72 長く柱型と干渉 → 実測で長さを決め直す
2 ［対応中］中央 BOX 席・袖壁：仕上-5 と 300 ずれ → M 側へ 300（PDS 修正中）
3 ［要修正］配膳開口（既設ステンレスカウンター）：下端 +900 → 実測 FL+965〜966 に直す
4 ［要確認］席数：70席エリアの絵は 40〜48 で合わない／合計 378→377 にする（PDS に根拠を）
5 ［要確認］29席エリア：ベンチの区切りで席数が読めない（席数の根拠を）
6 ［要確認］既存扉 ALD-1：高さ 2,150 か 3,150 か現地実測
7 ［要確認］③通り：実測差（開口 W1,445→図1,205、W718→図700 など）を反映
8 ［要確認］③ K〜L 券売機付近：仕上げできない所の見切り金物
9 ［要確認］②〜③ L〜M：壁 I字→L字の位置（NS 指示待ち）
10 ［要確認］①通りアルミルーバー：長さ A4,660／B4,680 と目地の確定

座席ナンバリング（試し：図の椅子記号から自動検出）

A1〜A39　①通り 窓際カウンター K〜P：39席
B1〜B8　K通り 窓際カウンター：8席
C1〜C24　70席エリア ダイヤ形テーブル：24席
D1〜D96　96席エリア：96席
・29席エリア・BOX席（10席×3）はベンチ・ソファで、記号から席数を数えられないため番号なし
・A+B+C を「70席」とみると 39+8+24＝71 で、ラベル 70 より1多い（範囲の取り方は要確認）
・D（96席）はラベルと一致

略号	内容
GB-R	石膏ボード
GB-R-H	普通硬質石膏ボード
GB-S	シージング石膏ボード
GB-F	強化石膏ボード
GB-L	石膏ラスボード
GB-D	化粧石膏ボード
GB-NC	不燃積層石膏ボード、不燃化粧石膏ボード
GB-P	吸音あなあき石膏ボード
GB-PD	化粧石膏吸音ボード
GB-R-Hc	吸放湿石膏ボード
K	けい酸カルシウム板
KB	化粧けい酸カルシウム板
RB	ロックウール吸音板

床	仕上	既設テラータイル張りの上薄膜モルタル塗 レベル調整モルタルの上磁器質タイル
	下地	コンクリート
巾木		不陸調整の上 樹脂巾木 H40
壁	仕上	吸音ルーバー 既設GB-Rt12下地ラフトンジャンボ吹付一部50角タイル張り
	下地	軽量鉄骨　の上薄膜モルタル塗
天井	仕上	DR t12 GB-Rt12.5下地EP+吸音ルーバー
	下地	軽量鉄骨
廻縁		塩ビ製
特記		カウンター、四方枠・三方枠再塗装、ストリングスカーテン＋埋込カーテンレール、アルミルーバー＋ロールスクリーン

床	仕上	既設テラータイル張りの上薄膜モルタル塗
	下地	コンクリート
巾木		不陸調整の上 樹脂巾木 H40
壁	仕上	木パネル 既設GB-Rt12下地ラフトンジャンボ吹付一部50角タイル張り
	下地	軽量鉄骨　の上薄膜モルタル塗
天井	仕上	DR t12 GB-Rt12.5下地EP+吸音ルーバー
	下地	軽量鉄骨
廻縁		―
特記		手洗いカウンター（設備工事）・鏡

チェック項目	未	完		未	完
• FLの押えの統一			• 巾木の逃げ		
• 下げ梁 下げスラブ			• 石. T. B（テラゾー B）の逃げ		
• フロアーヒンジ			• SW. AW. SDの差筋・箱入		
• インサート・ルーフドレーン（打込み金物）			• SSの溝ボックス差筋箱入		
• 防水立上り			• 手摺子金物. アンカー差筋・箱入		
• ELV関連. 箱入（押ボタン. ワイヤー穴）			• ブロック用差筋（床. 天井. 梁下. 壁）		
• 設備開口. 及貫通孔			• 断熱材の打込み		
• 荷揚げ用仮穴. 墨出し穴. 足場用アンカー			• 誘発目地・化粧目地		
• 後打部（打継ぎ部）			• 常開のSFD埋め込み（マグネット共）		
• 掃除口穴（打継ぎ部梁底）			•		
• 打放しフカシ・増打			•		

凡例

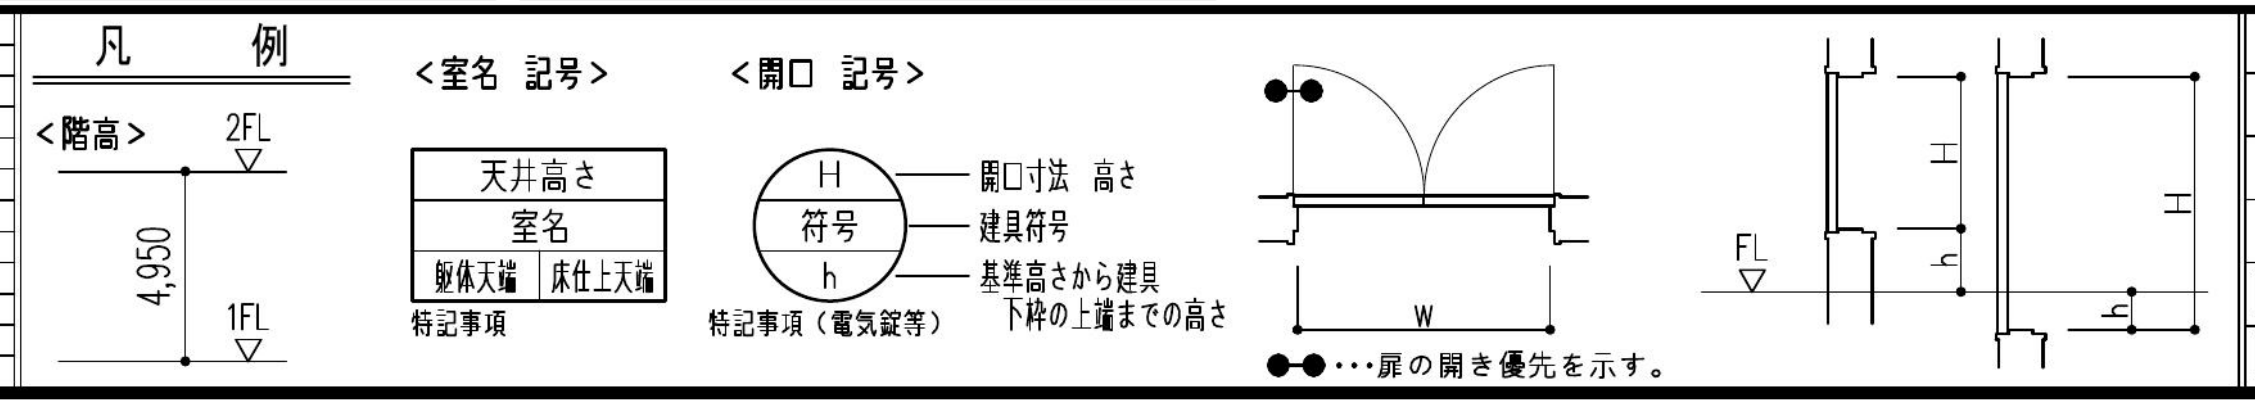
<階高>
2FL
4,950
1FL
<室名 記号>
天井高さ
室名
躯体天端
床仕上天端
特記事項
<開口 記号>
H
符号
h
開口寸法 高さ
建具符号
基準高さから建具下枠の上端までの高さ
特記事項（電気錠等）
W
H
h
●●…扉の開き優先を示す。

記号	内容				
⌒	保留を示す	C	ストリングスカーテン		
◠	床レベル（FL基準）				
∧	壁ボード目地				
▨	既存（壁・柱）を示す				
■	既存 を示す				

改訂履歴	改訂日	改訂ヶ所	改訂理由
第１回改訂			
第２回改訂			
第３回改訂			
第４回改訂			
第５回改訂			

配布ルール
1 変更の場合はこの原図を変更し、改訂履歴を明記する。
2 原図に配布予定先を記入する。
3 変更の都度、全部の配布予定先にコピーを配布する。
4 変更図（コピー）を受領したら旧版は自主廃棄する。

配布予定業者

承認	審査	作成
現場管理責任者		担当者

受領日

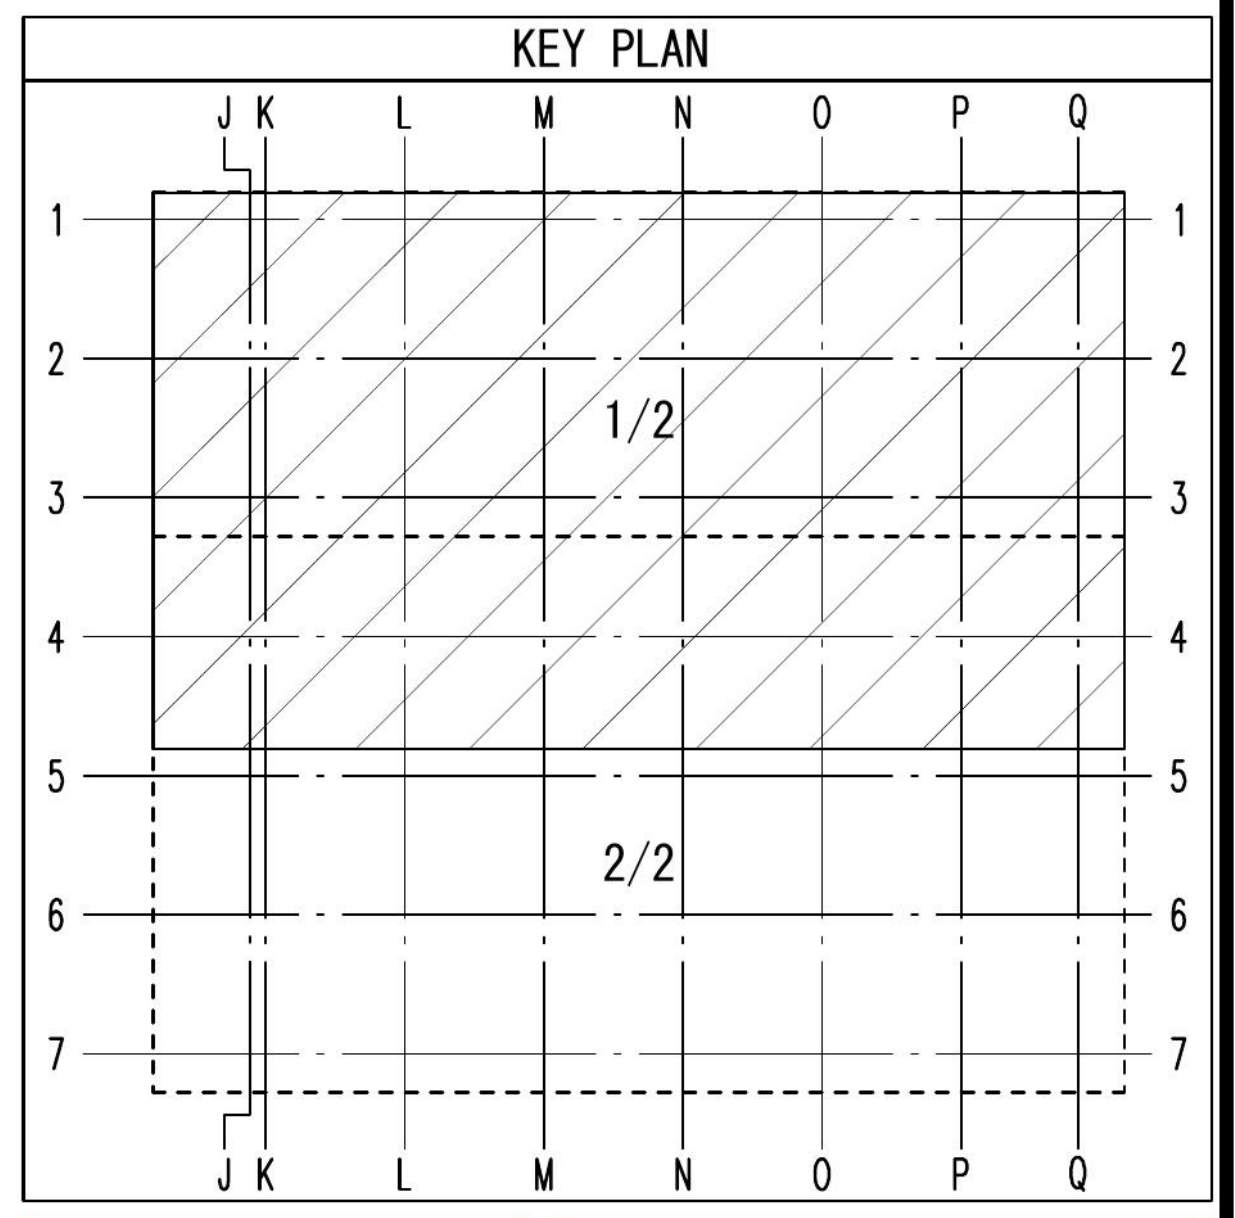
KEY PLAN
J K L M N O P Q
1
2
3
4
5
6
7
1/2
2/2

打合図
'26. 10. 22

設計図発行日
'26. 03. 27

相山女学園星が丘キャンパス大学会館食堂リニューアル工事
1階平面詳細図-1/2
縮尺 A1:1/50 A3:1/100　'26. 09. 16
清水建設株式会社名古屋支店
仕上－０１

J
K
L
M
N
O
P
Q
3
4
5
6
7
650
5,500
4,620
13
15
11
12
14
(30席)
(24席)
(74席)
(8席)
(17席)
カウンター H720
窓際ハイカウンター H920
SSD-1
壁記号凡例
LW1
LW2
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16
G1–G40
H1–H18

点検口は
なくなりましたか？

仕上-1 受領図 v2.0 指摘（2/2）　赤＝要修正　橙＝要確認　青＝対応中

11 ［要修正］⑦通り窓際ハイカウンター H920：柱型の面 413～425（P端455）と 13～55 干渉 → 実測で長さを決め直す

12 ［要確認］⑦通り方立（125幅）の位置をカウンターまわりに記入

13 ［要確認］⑤ K～L：図 2,515 → 実測 2,646（＋131）。測った区間を確認

14 ［要確認］SSD-1 足元：クリア20→細目グレーチング・シール欠込み・方立 MIN45 を記入

15 ［要確認］全体：通り芯からの寸法の雲マーク（実測で確定したか）・席数 2/2 は未計数

座席ナンバリング（試し：図の椅子記号から自動検出）

E1～E8　⑦通り　窓際カウンター L～M（17席エリア）：8席

F1～F16　⑦通り　窓際ハイカウンター M～P（74席エリア）：16席

G1～G40　74席エリア　テーブル：40席

H1～H18　24席エリア　テーブル：18席

- 30席・8席エリア、17席エリアのカウンター H720 側、74席エリアのカウンター H720 列は椅子の記号が違い自動検出できないため番号なし（席数未確認）
- G1・G2 付近は階段の線と重なるため要確認

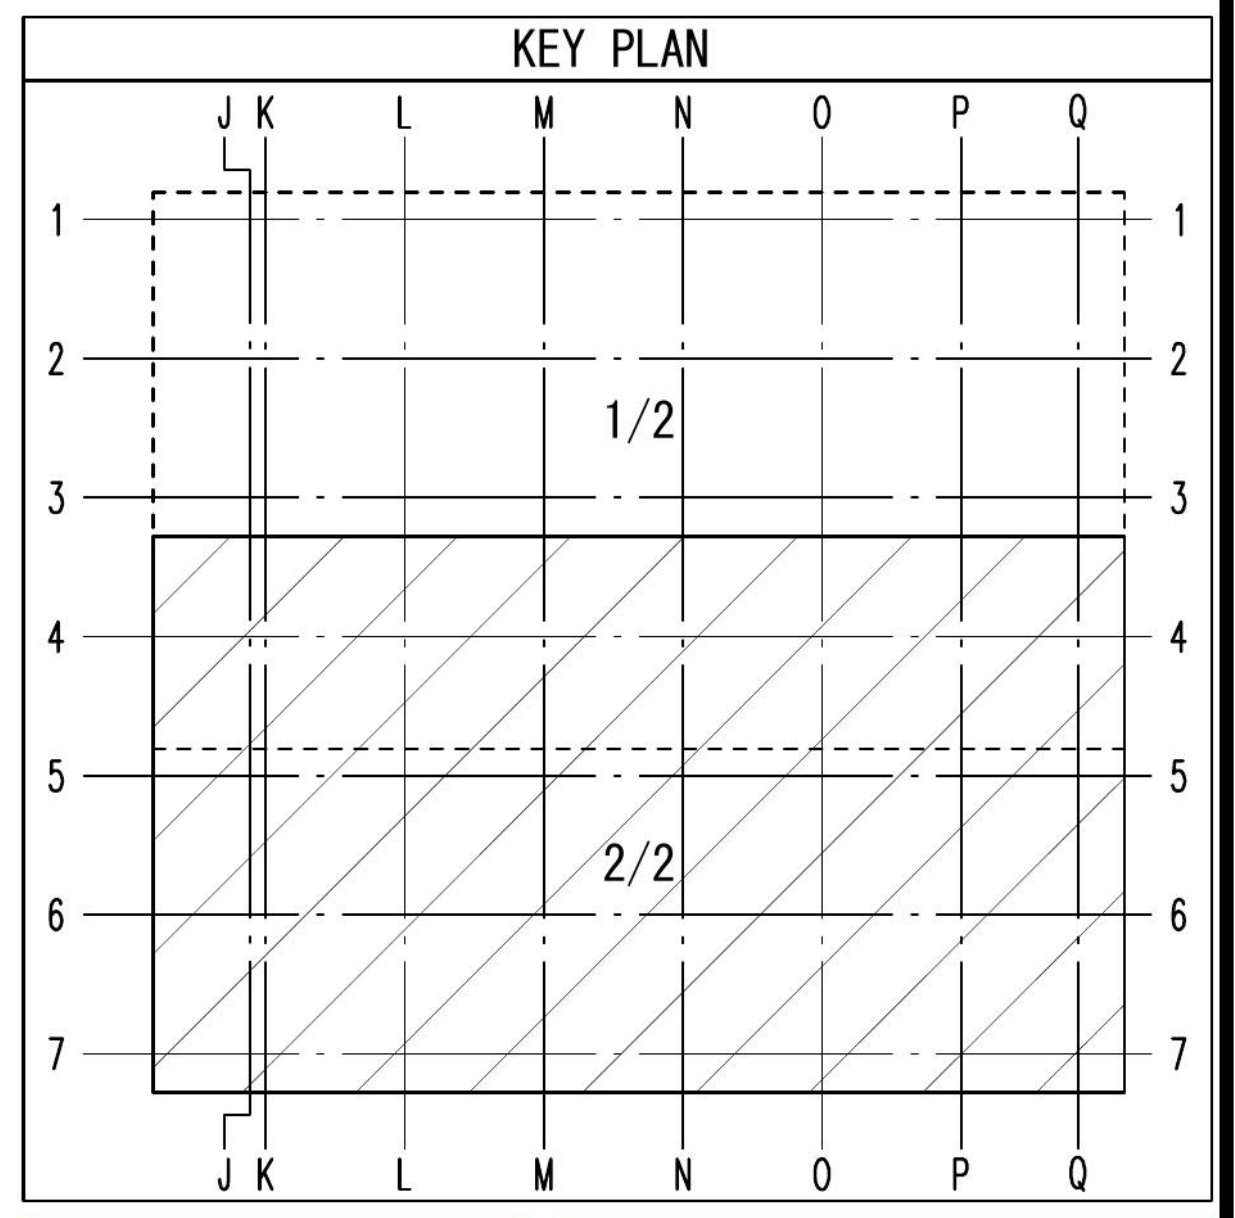
KEY PLAN
J K L M N O P Q
1
2
3
4
5
6
7
1/2
2/2

打合図
'26.10.22

設計図発行日
'26.03.27

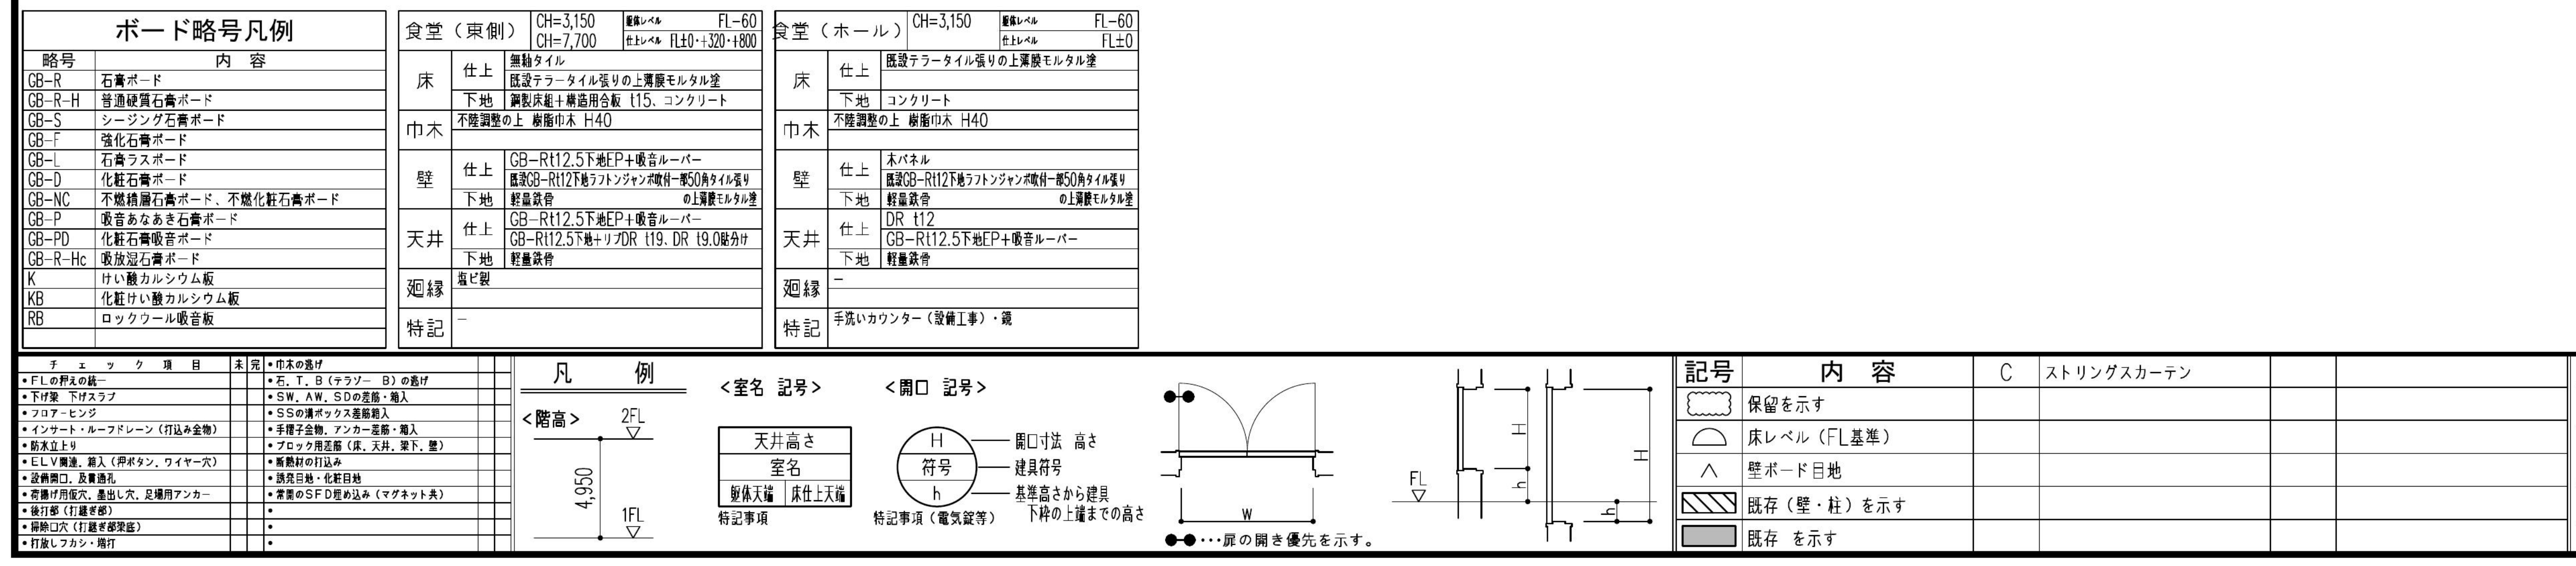
ボード略号凡例
食堂（東側）
食堂（ホール）
凡例

		改訂日	改訂ヶ所	改訂理由
改訂履歴	第１回改訂			
	第２回改訂			
	第３回改訂			
	第４回改訂			
	第５回改訂			

配布ルール
1 変更の場合はこの原図を変更し、改訂履歴を明記する。
2 原図に配布予定先を記入する。
3 変更の都度、全部の配布予定先にコピーを配布する。
4 変更図（コピー）を受領したら旧版は自主廃棄する。

配布予定業者

承認	審査	作成
現場管理責任者		担当者

受領日

相山女学園星が丘キャンパス大学会館食堂リニューアル工事

1階平面詳細図-2/2

縮尺 A1:1/50 A3:1/100　'26.09.16

清水建設株式会社名古屋支店

仕上－０２
