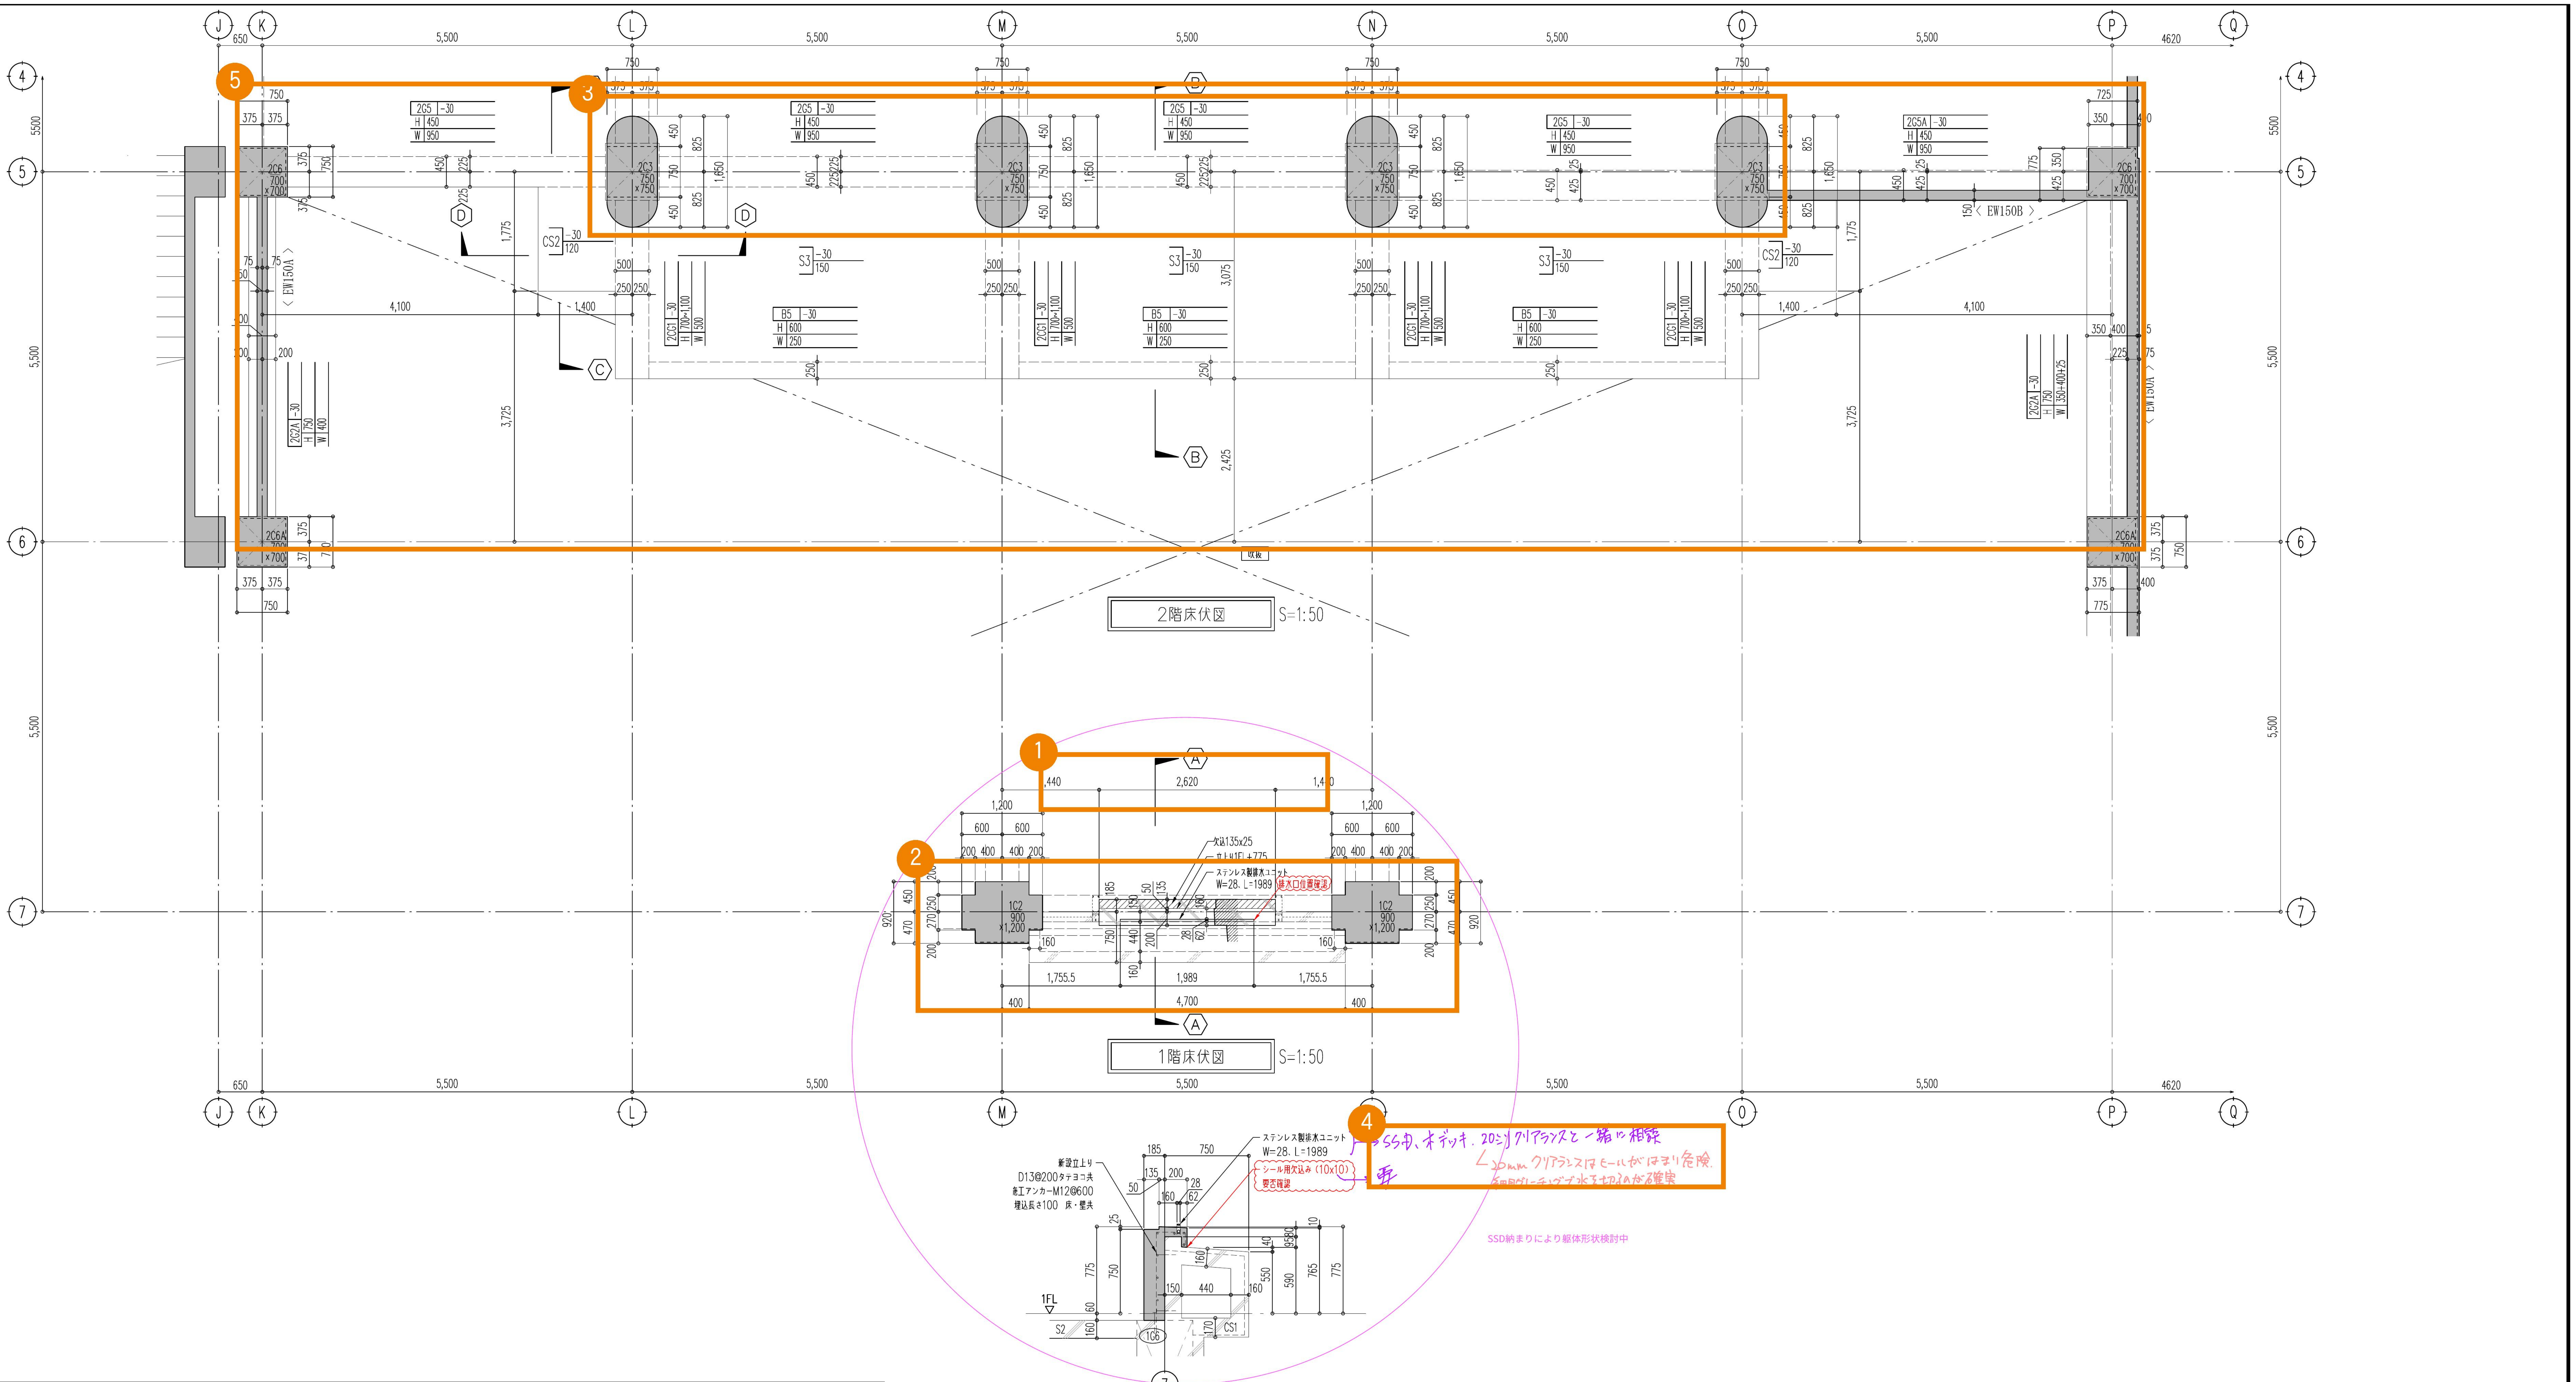

2階床伏図 S=1:50

1階床伏図 S=1:50

Ⓐ－Ⓐ 断面図 S=1:30

SSD、木デッキ、20ミリクリアランスと一緒に相談

要

20mmクリアランスはヒールがはまり危険。
細目グレーチングで水を切るのが確実

躯体-1 1階・2階床伏図（打 NS確認版） 赤＝要修正 橙＝要確認 青＝対応中 緑＝参考（261104 図面間整合）

1 ［要確認］SSD-1 開口 2,620（1,440｜2,620｜1,440）↔ 仕上-1 W=2,520（1,490｜2,520｜1,490）［X5］

2 ［要確認］⑦ 柱 1C2：面まで 400 ↔ 実測 413～425。仕上げ厚・既存誤差を確認［X4］

3 ［要確認］⑤ 楕円柱 750×1,650（825+825）↔ 実測 幅425（片側?）×1,840（920+920）［X11］

4 ［要確認］SSD 足元：水切り W=28 L=1,989、クリアランス20 はヒールがはまり危険（NS）→ 細目グレーチング・シール欠込み［X6］

5 ［要確認］2階床伏図の梁下と 1階天井（CH3,150・ルーバー2,980）の取合い［X12］

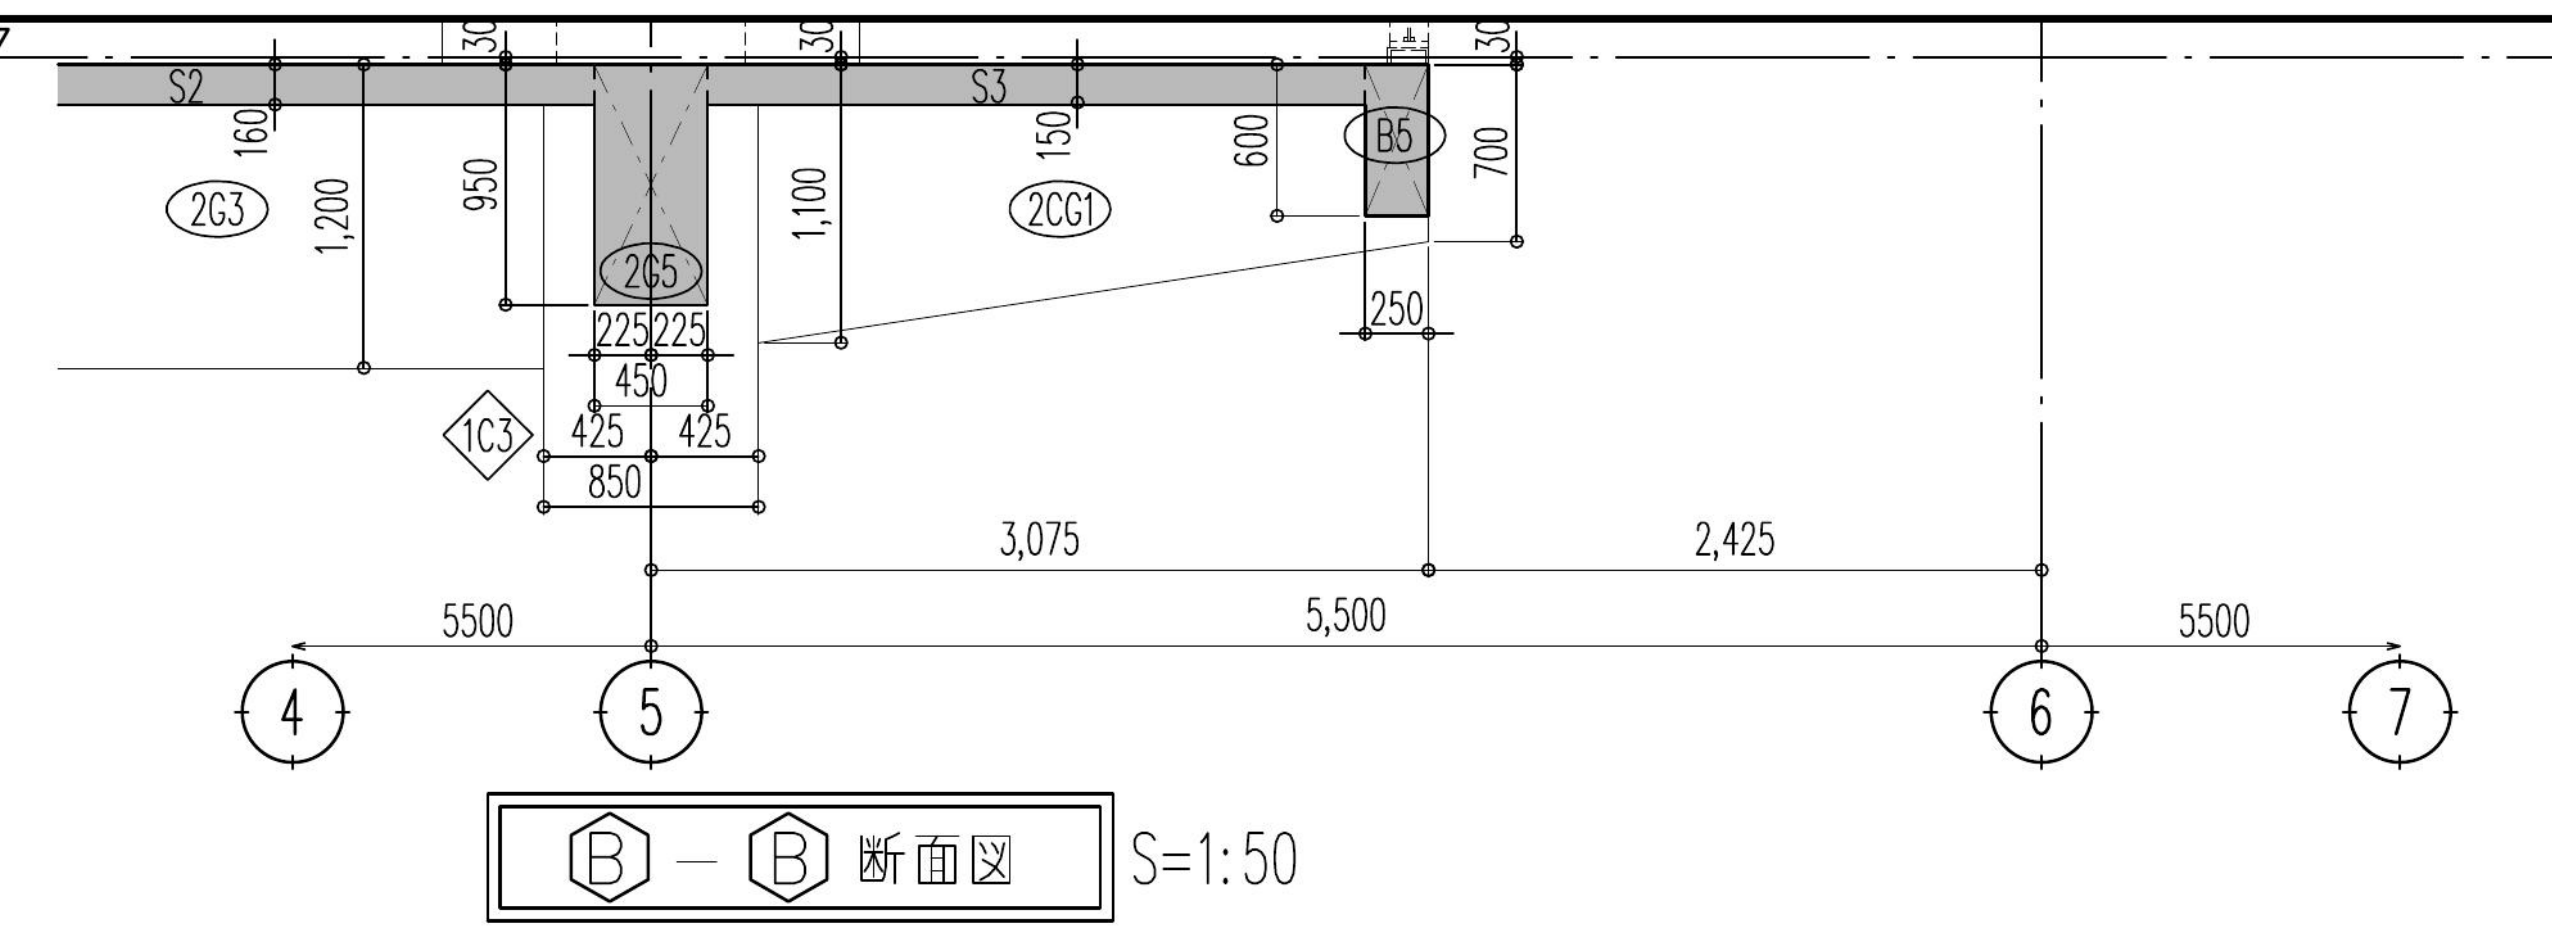

Ⓑ－Ⓑ 断面図 S=1:50

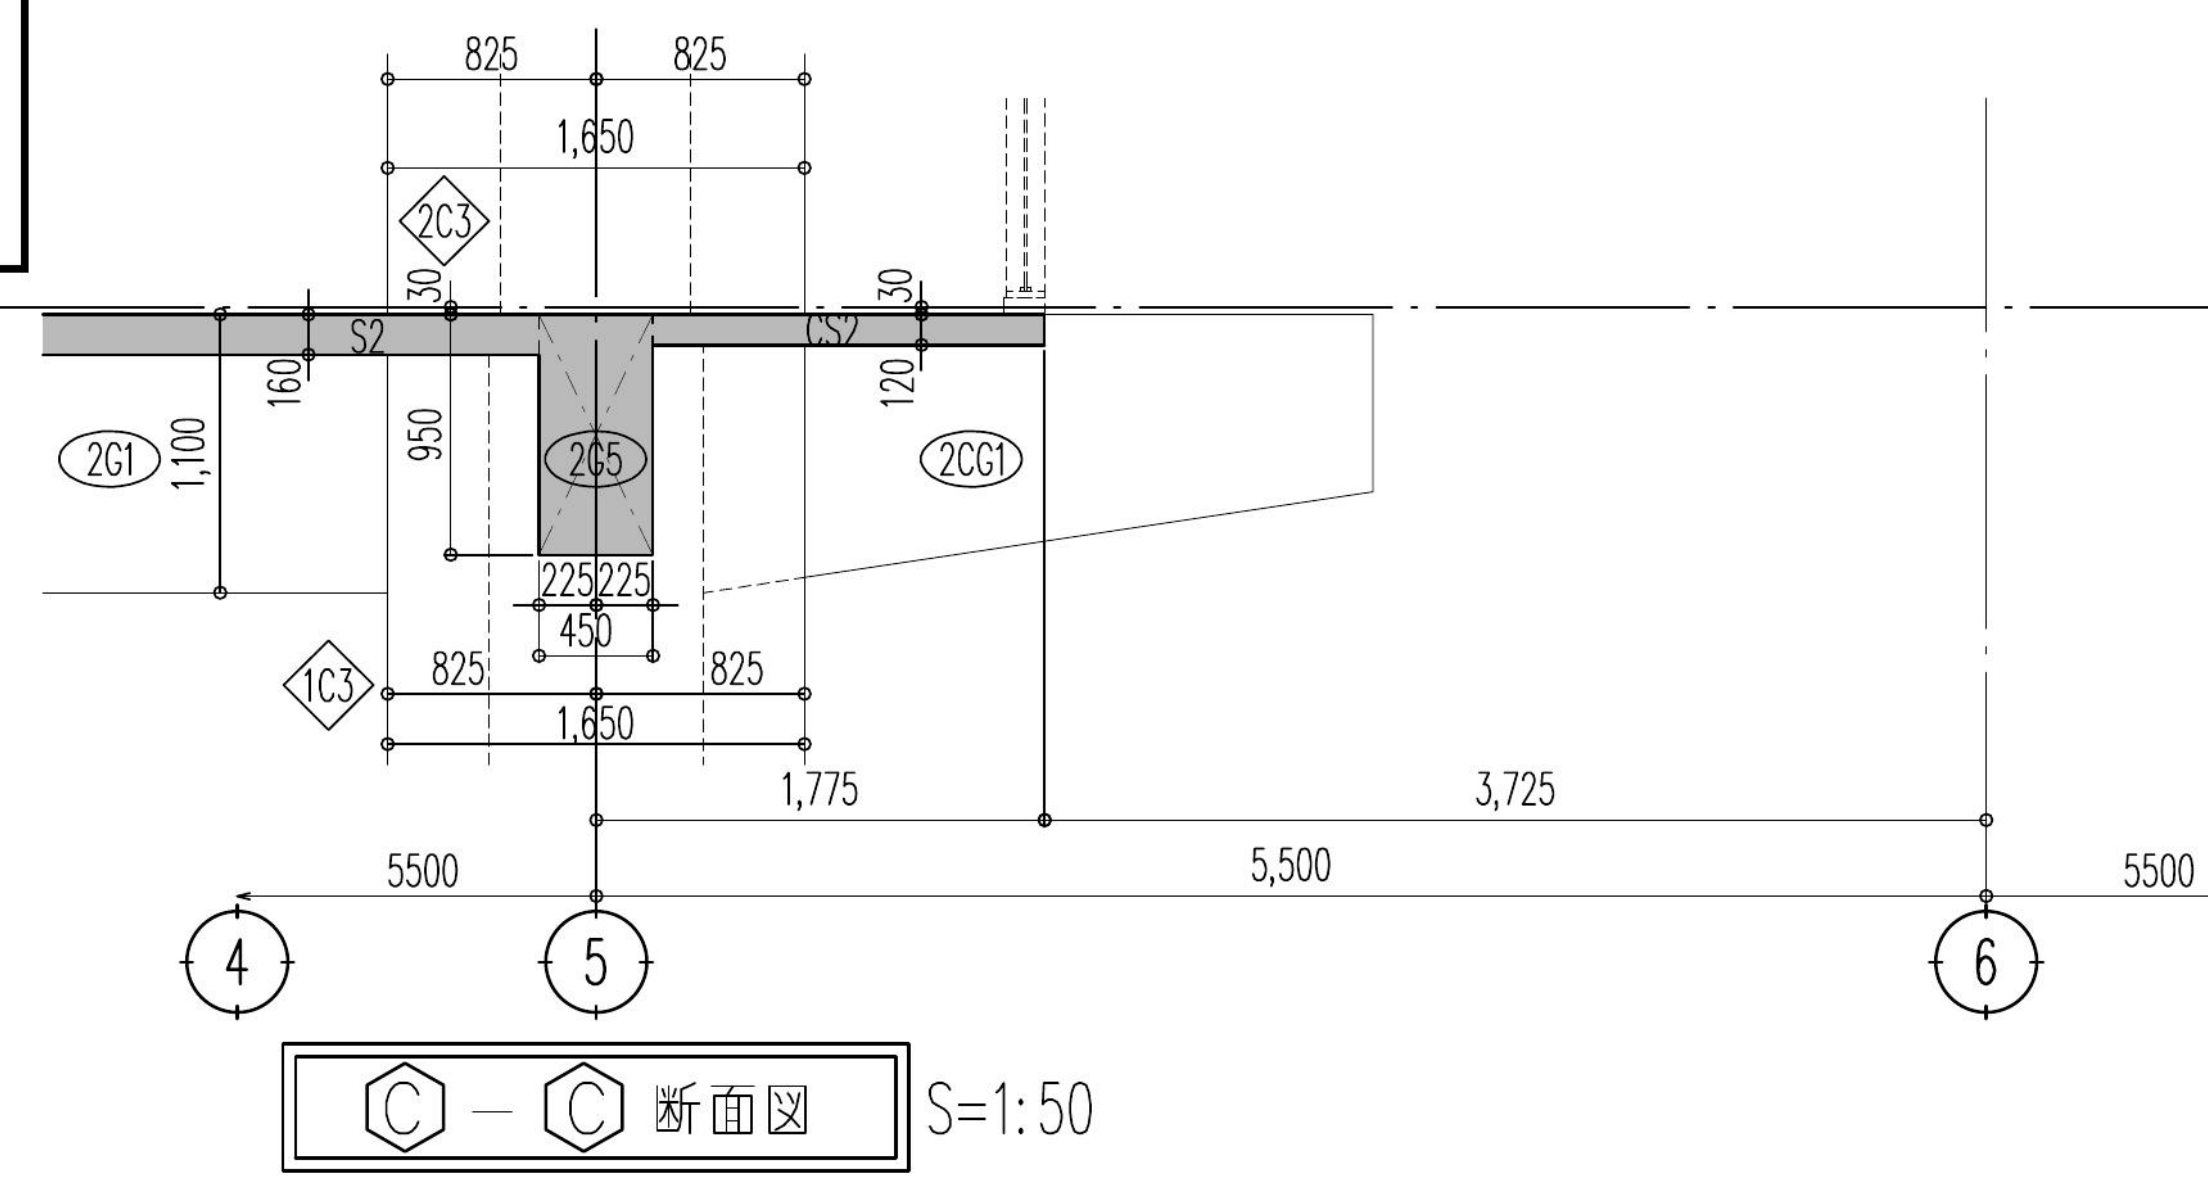

Ⓒ－Ⓒ 断面図 S=1:50

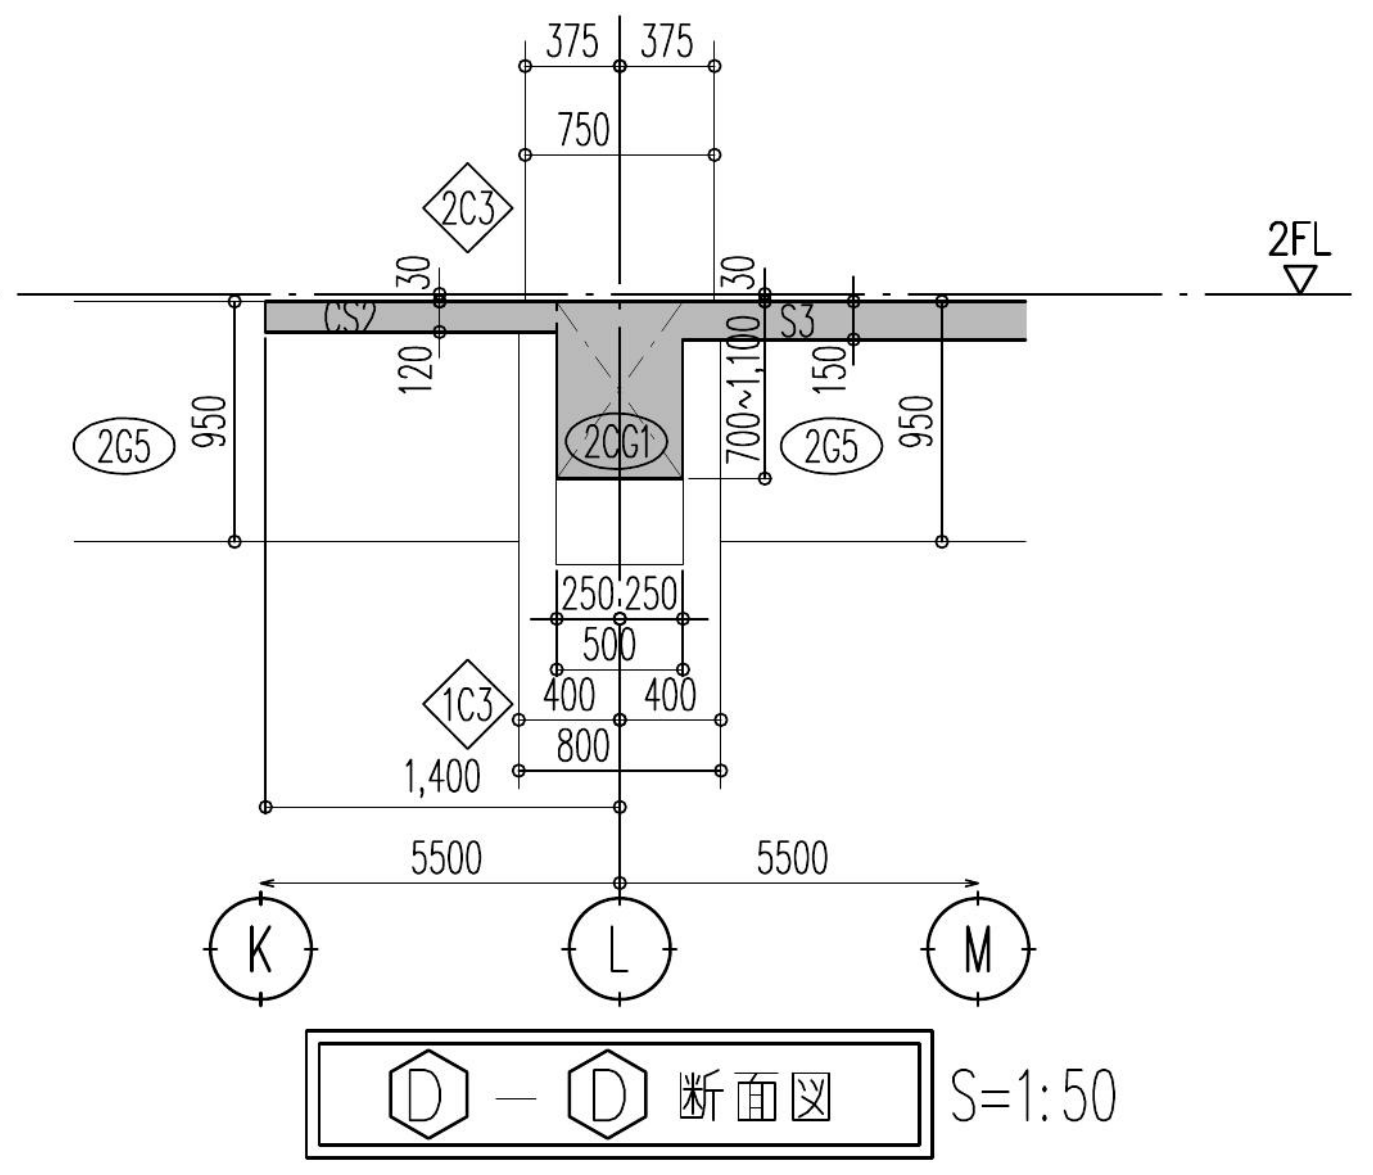

Ⓓ－Ⓓ 断面図 S=1:50

KEY PLAN

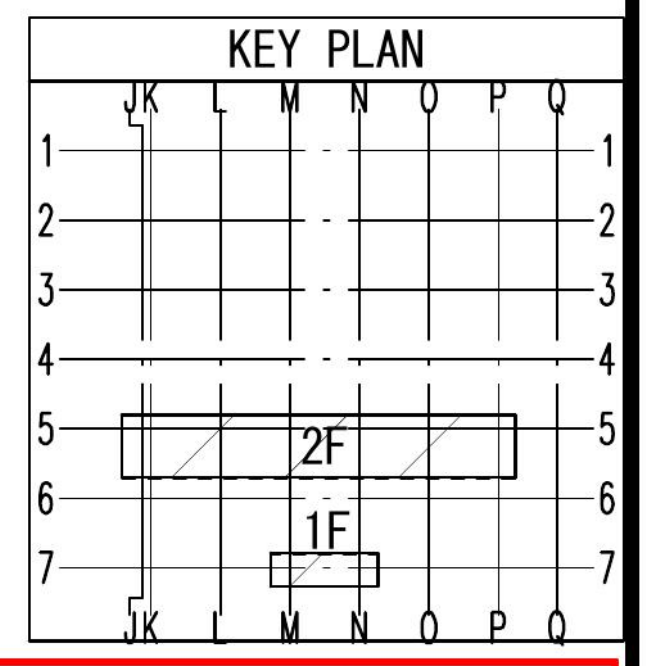

打合図 '26.10.06

設計図発行日 '26.03.27

改訂履歴	改訂日	改訂ヶ所	改訂理由
第１回改訂			
第２回改訂			
第３回改訂			
第４回改訂			
第５回改訂			

配布ルール
1 変更の場合はこの原図を変更し、改訂履歴を明記する。
2 原図に配布予定先を記入する。
3 変更の都度、全部の配布予定先にコピーを配布する。
4 変更図（コピー）を受領したら旧版は自主廃棄する。

配布予定業者

承認	審査	作成
現場管理責任者		担当者

受領日

相山女学園星が丘キャンパス大学会館食堂リニューアル工事
1階・2階床伏図
縮尺 A1:1/50 A3:1/100 '26.10.06
清水建設株式会社名古屋支店
躯体－０１
