図面・計画書添付書

工事名

椙山女学園　星が丘キャンパス大学会館食堂リニューアル工事

図面名称	躯体	仕上	設備
ステンレス建具製作図	打合図	受領図	受領印用図
施工予定日 2026/12/23	発行日 2026/10/07	返却希望日 2026/10/14	

	発注者			施工部署				生産技術部		設備部	
				現場管理責任者	工事長	主任	担当者	工事長	担当者	工事長	担当者
印				承認 2026/10/07 金子 冬平				承認 2026/10/01 小山 努			
日付				10/7							

	設計責任者	工事監理者	工事監理担当者								
			意匠		構造		機械		電気		
印		工藤	山上	箱垣							
日付		261014	261009	2026,10,8							

記　事（質疑応答・連絡事項・その他）

外部 耐風圧を考慮すると、方立MIN45となります。✓

外部足元納まりについて
両脇水切り残して、立ち上がりコにスペーサーかまして、デッキ張り伸ばし
SSDレールに溜まった水は、デッキとの隙間に垂れ流し、建具前面に連続止水ライン形成で検討中です →詳細図見せてください

雨天時の運用について
足拭きマット（常設）傘立てなど、どのような想定でしょうか？ →雨天時は食券側のスロを利用

塗装範囲を赤ステンレスHLを青で表記してあるのでご確認下さい

椙山女学園 星ヶ丘キャンパス
大学会館食堂リニューアル工事

ステンレス建具工事 製作図

設計監理：　　日建設計　　殿

施　　工：　　清水建設　株式会社　　殿

出　図	チェック図受取	出　図	チェック図受取	出　図	
出図 2026.09.17 三和タジマ	2026.09.24	出図 2026.09.17 三和タジマ	2026.09.29	出図 2026.10.01 三和タジマ	

1.施工工程（製作期間75日間）

		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
1	製作期間	⇔	⇔	⇔	⇔				
		現場図面チェック⇒訂正 承認		製作期間					
2	搬入・取付				⇔				
					12月・枠取付　未：扉吊り込み				

※施工図修正については、基本２回以内で御承諾頂きますよう御協力御願い致します。

製作にあたりましては下記の項目の決定が必要となりますので、
受領までに御確認・御決定願います。

	確認事項	2026.09.00	御回答	2026.09.00
①	赤枠部塗装仕上げ			
②				
③	MKプランのご指示願います。			

保留事項		保留	決定・解除
	1：MKプラン		
	2：シリンダー・サムターン使用勝手	保留	決定・解除
	3：レバーハンドル・握り玉形状　品番：　材質・仕上：	~~保留~~	~~決定・解除~~
	4：押棒・プッシュプル品番　品番：　材質・仕上：	~~保留~~	~~決定・解除~~
	5：扉形状・焼付色・艶	保留	決定・解除

※図中の確認事項に関しても、御回答を御願い致します。

S.Tajima ARCHITECTURAL METALS　三和タジマ株式会社

仕 様 確 認 書

工事名称	椙山女学園 星ヶ丘キャンパス 大学会館食堂リニューアル工事		
所 在 地	愛知県名古屋市千種区星が丘元町		
設　　計	日建設計		
監　　理	日建設計		
施　　工	清水建設 株式会社		
当社 窓口	名古屋市東区白壁2−4−8		
	営 業 船 城	TEL 052−955−3805	FAX 052−955−3885
	設 計 末 吉	TEL 052−955−3805	FAX 052−955−3885
	工 事	TEL 052−955−3805	FAX 052−955−3885

1. 適用図書

（本工事の設計図書以外）

■有 □無　■本工事 特記仕様書
■公共建築工事標準仕様書（建築工事編）
□建築工事標準仕様書：JASS（日本建築学会）

2. 材 料

■ステンレス鋼板
JIS−G4305（冷間圧延ステンレス鋼板）の規定に基づく。
■SUS304　□SUS316　□その他（　　）

■鋼　板
JIS−G3302（溶融亜鉛メッキ鋼板）の規定に基づく。
亜鉛付着量：F12−両面で 120g/m2

■形　鋼
JIS−G3101（一般構造用圧延鋼材）の規定に基づく。
JIS−G3350（一般構造用軽量形鋼）の規定に基づく。

■ボルト・ナット類
JIS−G4315（冷間圧延ステンレス鋼線）の規定に基づく。
SUS305 または SUSXM7

3. 仕 上

■ステンレス鋼板
□ヘアーライン（HL）　□カラーステンレス
□鏡面（MA）　■塗装
□バイブレーション（3S/PHL）
□その他（　　）

■下地鋼板
亜鉛めっき鋼面錆止め塗料（鋼板）
■JPMS 28 30μm以上 2回塗り（合計60μm以上）
鉄鋼面錆止め塗料（形鋼）
■JIS−K5674 30μm以上 2回塗り（合計60μm以上）

4. 仕上塗装

□アクリル樹脂塗装　■ポリウレタン系樹脂塗装
□フッ素樹脂塗装
□常温硬化型
■焼付型 → 日塗工D25-60B 3分艶

5. 角出し
※化粧材のみ

■普通曲げ（スチール）
□角出し（ステンレス）
□0.75mm残し
■1.0mm残し

6. 附属金物

■錠　前　□美和ロック　□U9　□PR　□JN　□LB
□ゴール　□P　□Z　□V18　□GV
□堀商店　□6P　□TR
※MK合せ　□有　□無　■未決
※MKプラン　□既決　■未決

□ヒンジ	□ニュースター	□リョービ	□ダイアモンド	□他（　）
□ドアチェック	□ニュースター	□リョービ	□ダイアモンド	□他（　）
□丁　番	□シブタニ	□日東工器	□末広金具	□他（　）
□戸当り	□ユニオン	□シブタニ	□リョービ	□他（　）

大学会館の金建メーカー確認

7. 充填材

□ロックウール（　　kg/m3）
□グラスウール（　　kg/m3）

8. 裏打材

□無 □有　□ヒル石系結露防止材（厚さ　　mm）
□アンチックス防音材（厚さ　　mm）

9. 工場シール

□ニ成分ポリサルファイド系
メーカー：□シーカ・ジャパン　□東レ　□サンスター　□信越化学
色　：　□グレー　□ブラック　□ホワイト　□ブラウン

10. 支給品

□無 □有（支給品：　　）（支給元：　　）
（支給品：　　）（支給元：　　）

11. エンジン装置

□無 ■有　□ミリオン（昭和建産株式会社）
□フルテック株式会社
□寺岡オートドアシステム株式会社
■ナブコシステム株式会社 ～既存もナブコ？
□その他
※エンジン加工図　□着（事前検討含）　■未着（事前検討未）

12. 排煙装置

□無 □有　□オイレス工業株式会社
□株式会社 豊和
開放角度　□45°　□60°　□90°

13. 共通事項

下記事項は当社工事外となります。
他社取合い現場打ちシール・ガラス廻りシール
建具取付け用の下地鉄骨等
躯体等の斫り工事

別途工事のシールは色合わせすること。


SSD 101

御承諾	現場名	椙山女学園 星ヶ丘キャンパス 大学会館食堂リニューアル工事	品名 ・・・
	設計監理	日建設計	図名 仕 様 書
	施工	清水建設株式会社	M／M (A1) S=1:1 (A3) S=1:2　2026.09.18 作成
			検図 営業 船城　設計 末吉

三和タジマ株式会社

設計番号 TA_−_____−__
ファイル名 標準_仕様書
図番 1／NO 1　1

※本図面の全部または一部を当社に無断で複写・複製することを禁じます。

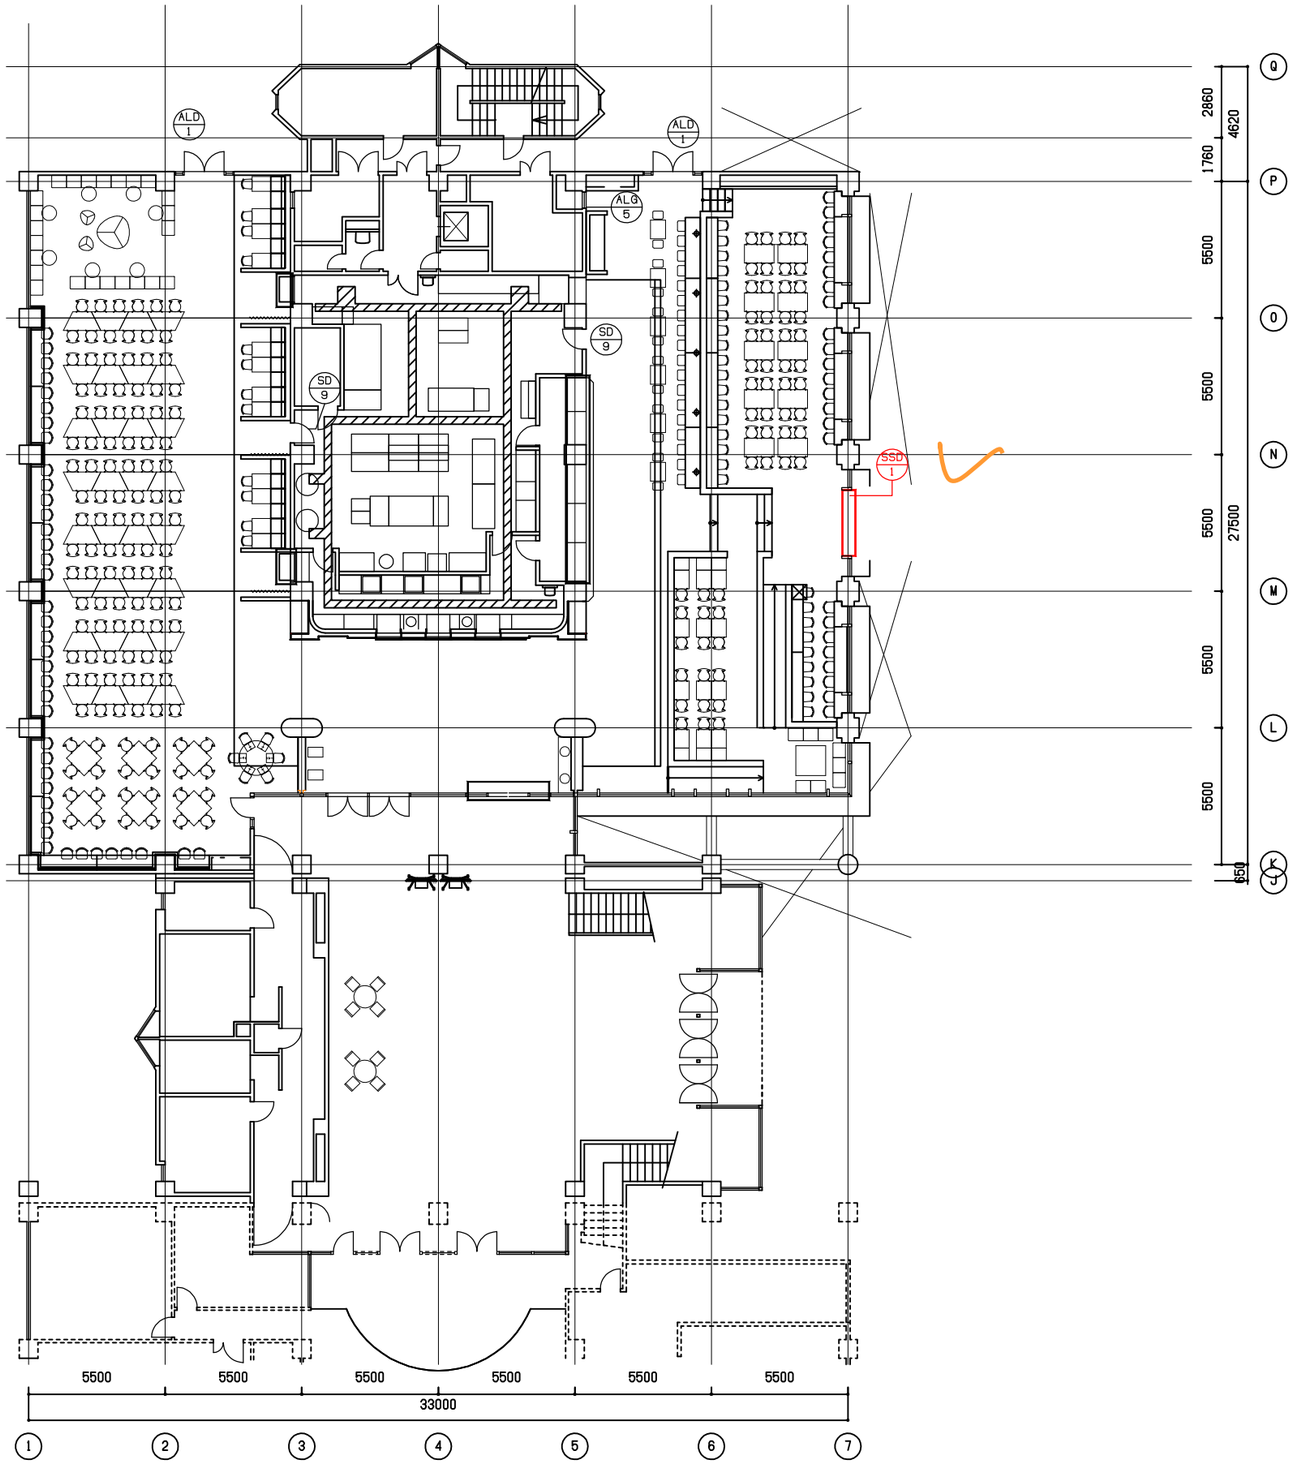


提出履歴

1	00／00
2	00／00
3	00／00


KP 1

特記事項	・	6	／	12	／	御承諾	現場名	椙山女学園 星ヶ丘キャンパス 大学会館食堂リニューアル工事	品名	KEY PLAN	三和タジマ株式会社	設計番号	
	・	5	／	11	／							ファイル名	KEYPLAN
	・	4	／	10	／		設計監理	日建設計	図名			図番	1／1 NO 00
	・	3	／	9	／				M／M	(A1) S=1:20 (A3) S=1:40	0000.00.00 作成		
	・	2	／	8	／		施工	清水建設株式会社	検	宮 船城	設 末吉		
	・	1	／	7	／				図	業	計		


※本図面の全部または一部を当社に無断で複写・複製することを禁じます。

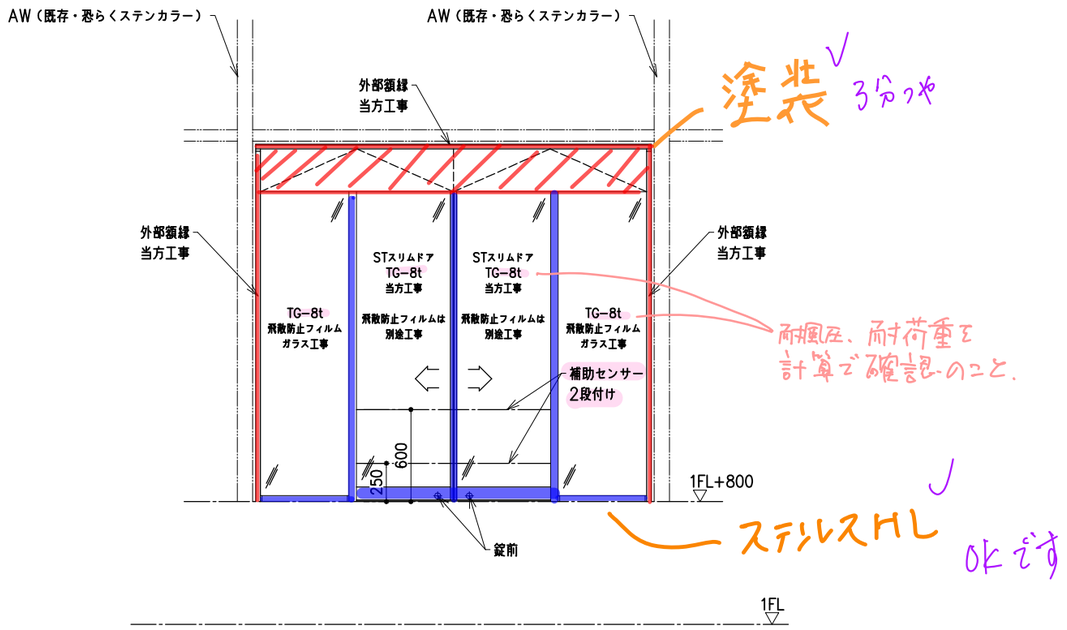



外部側 姿図

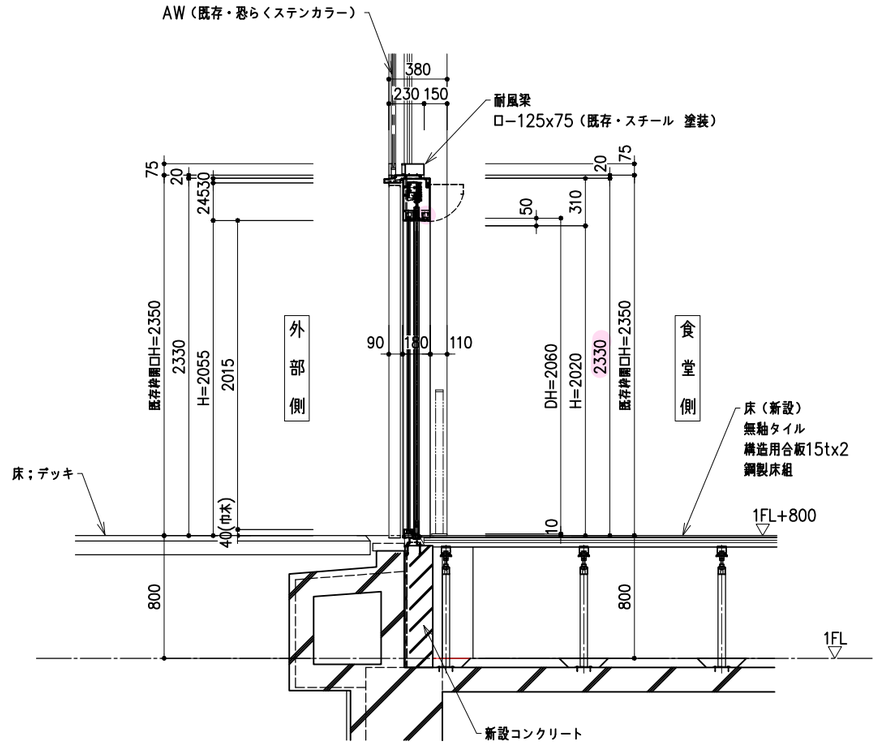

食堂側







外部側

※本図製品の製作期間は60日間必要です。

外部も3分艶ではなく3分艶ですか?

枠・扉：材質・仕上 SUS304 1.5t ウレタン樹脂焼付塗装仕上（D25−60B・3分艶）
曲げ角：角出（1mm残シ）
※引出し線表記なき下地材はSt-1.6t（通し材）とする。

符号	ヶ所数
SSD 1	1

取付場所：食堂 1 階

充填材	有無	
裏打材	有無	
扉重量	D1	kg
	D2	kg

附属品リスト

名称及記号	仕上・特記事項	左	右	数量	
エンジン：NABCO				一式	停電時及び火報発報時連動解錠手動開閉動作可能
センサー類：NABCO				一式	
錠前：CP				2	
STスリムドア：三和タジマ TG−8t含む	飛散防止フィルム別途			2	
隠しヒンジ：当社制定品				4	
当りゴム：北商 GA−14				2	

注：各付属品ノ数量ハ各建具、1ヶ所分ヲ示ス


提出履歴

1	00/00
2	00/00
3	00/00
4	00/00
5	00/00
6	00/00
7	00/00
8	00/00
9	00/00
10	00/00
11	00/00
12	00/00
13	00/00
14	00/00
15	00/00

SSD 1

御承諾	
現場名	椙山女学園 星ヶ丘キャンパス 大学会館食堂リニューアル工事
設計監理	日建設計
施工	清水建設株式会社
品名	ステンレス製建具 引き分け自動スリムドア
図名	詳細図
M／M	(A1) S=1:20 (A3) S=1:40 2026.09.01 作成
検図	営業 船城 設計 末吉
三和タジマ株式会社	
設計番号	TA_−_____−__
ファイル名	
図番	1／2 NO 1

※本図面の全部または一部を当社に無断で複写・複製することを禁じます。

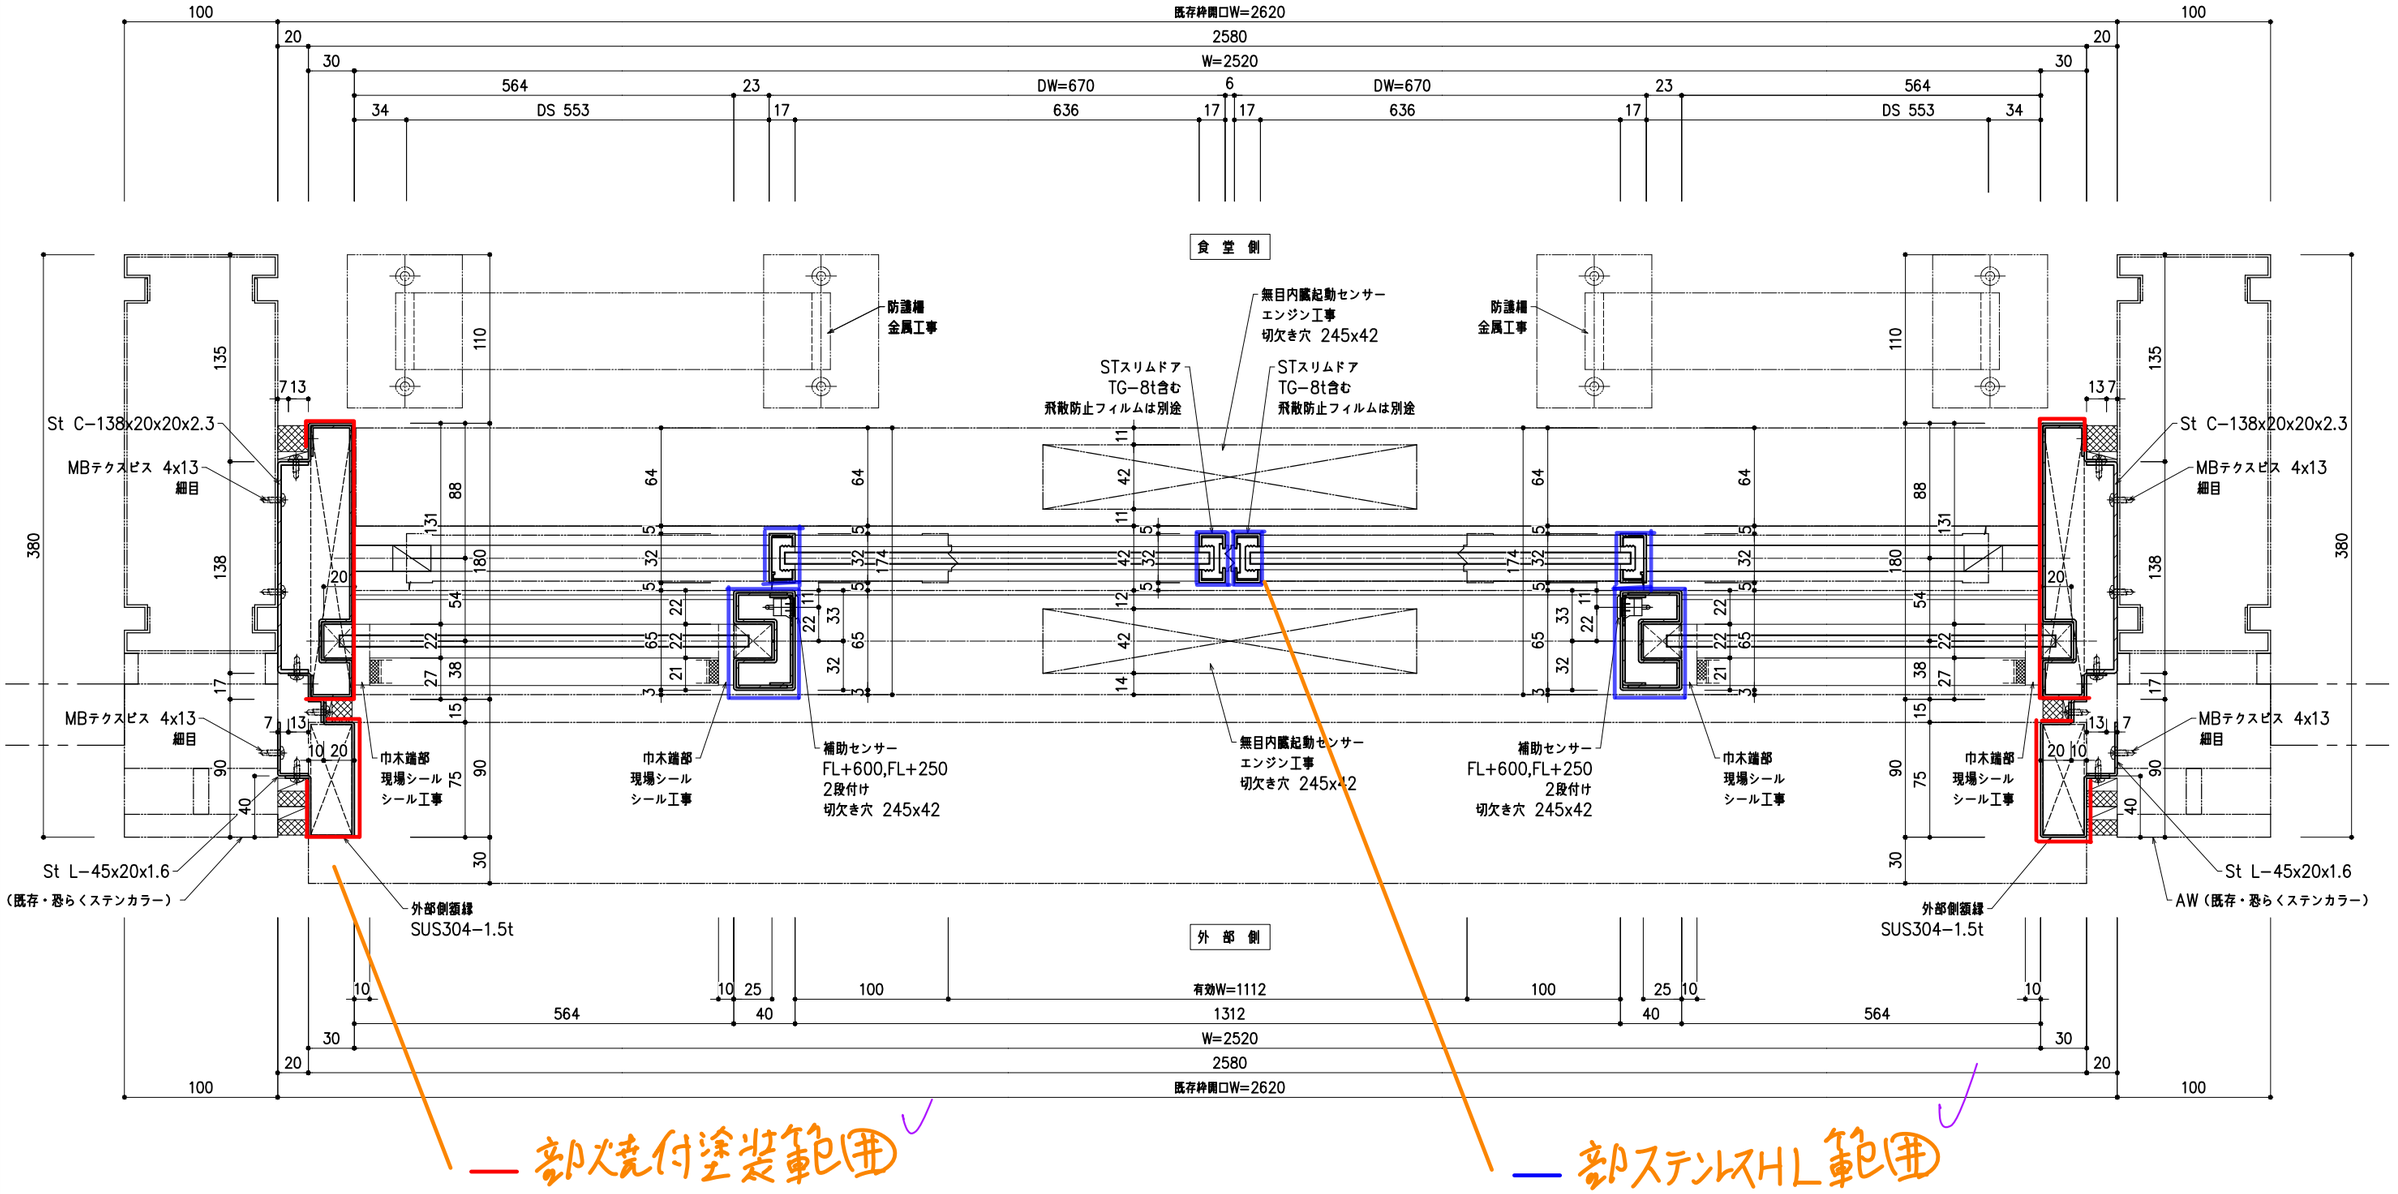

御承諾	現場名	椙山女学園 星ヶ丘キャンパス 大学会館食堂リニューアル工事	品名 ステンレス製建具 引き分け自動スリムドア
	設計監理	日建設計	図名 平断面現寸図
	施工	清水建設株式会社	M／M (A1) S=1:2 (A3) S=1:4 2026.09.01 作成
			検図 営業 船城 設計 末吉

三和タジマ株式会社

設計番号 TA_-_____-__
ファイル名
図番 1/2 NO 2

※本図面の全部または一部を当社に無断で複写・複製することを禁じます。

食堂側

外部側

DH=2095

H=2055

1FL+800

800~1FL

750~1FL

既存枠開口H=2350

FB-50

St-2.3t

St C-101x17x17x2.3

St L-60x20x1.6

St L-20x40x2.3t

St L-30x30x2.3t

MBテクスピス 4x13 細目

新風梁 ロ-125x75 (既存)

隠しヒンジ 当社制定品

雨増部点検口ストッパー SUS304 W40x2.0t 当リユム:GA-14 北産

無目内蔵起動センサー エンジン工事 切欠き穴 245x42

開口部 溝チャンネル

防護柵 金属工事

ガイドレール SUS304-1.5t HL

STスリムドア TG-81型 飛散防止フィルムは別途

床(断設) 無釉タイル 構造用合板15tx2 鋼製床組

巾木廻溶接現場シール シール工事

オールアンカー

AW (既存・及らくステンカラー)

外部側額縁 SUS304-1.5t

ウッドデッキ

クリア20

クリア20はヒールが ななり危険 台使の横走りを考えると 幅目地などで水を切る のがよい

クリア20で 排水 排水機構 検討

本体と躯動が違うので 本体側に固定はしません

本体仮付

一部焼付塗装範囲

一部ステンレスHL範囲

御承諾	現場名	椙山女学園 星ヶ丘キャンパス 大学会館食堂リニューアル工事	品名 ステンレス製建具 引き分け自動スリムドア
	設計監理	日建設計	図名 縦断面現寸図
	施工	清水建設株式会社	M／M (A1) S=1:2 (A3) S=1:4 2026.09.01 作成
			検図 営業 船城 設計 末吉

三和タジマ株式会社

設計番号 TA-_____-__

ファイル名


図番 1／NO 2 3

SSD 1


※本図面の全部または一部を当社に無断で複写・複製することを禁じます。




現場運用図（解体）

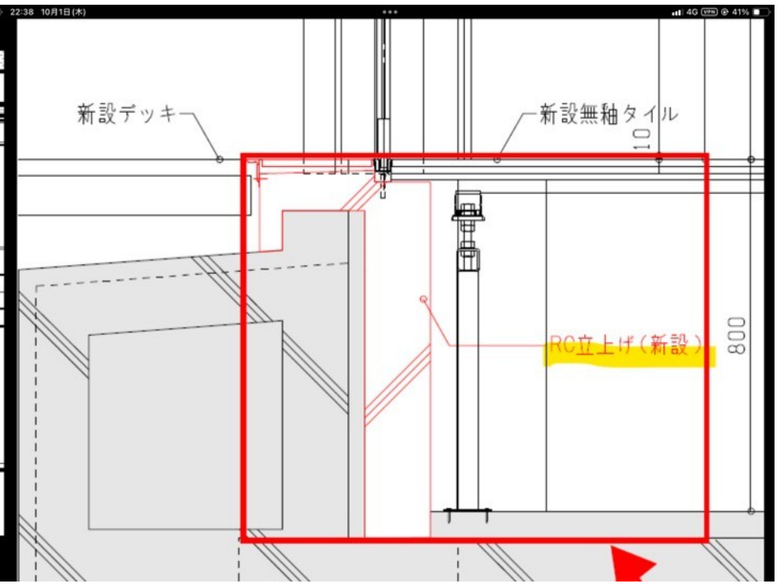

現場運用図（躯体）

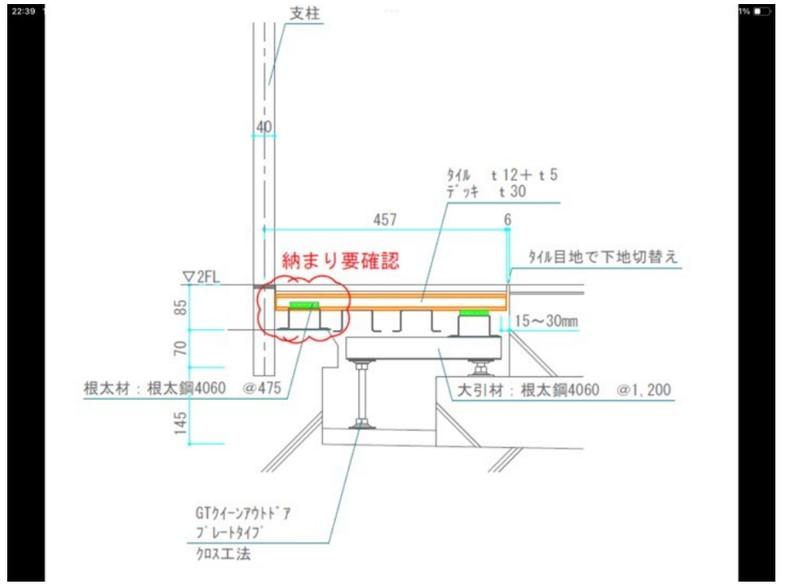


外部参考納まり

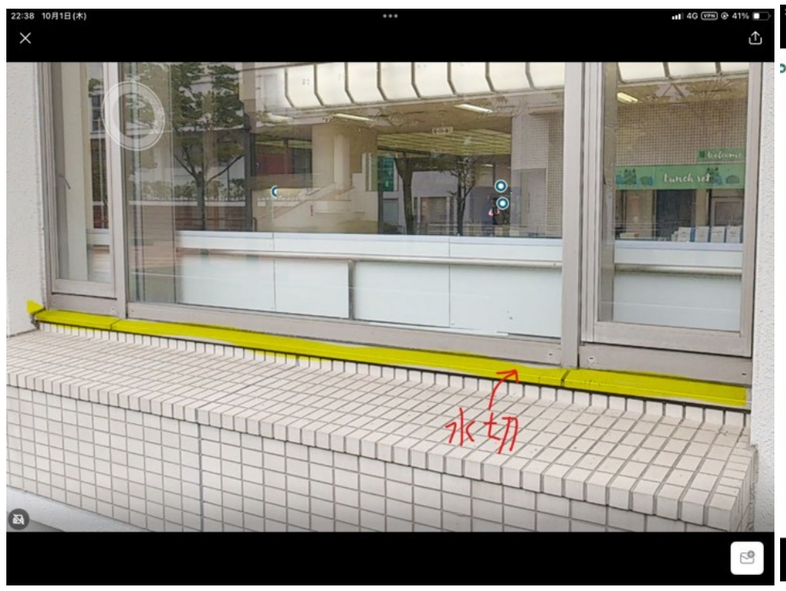

現況写真



Revit

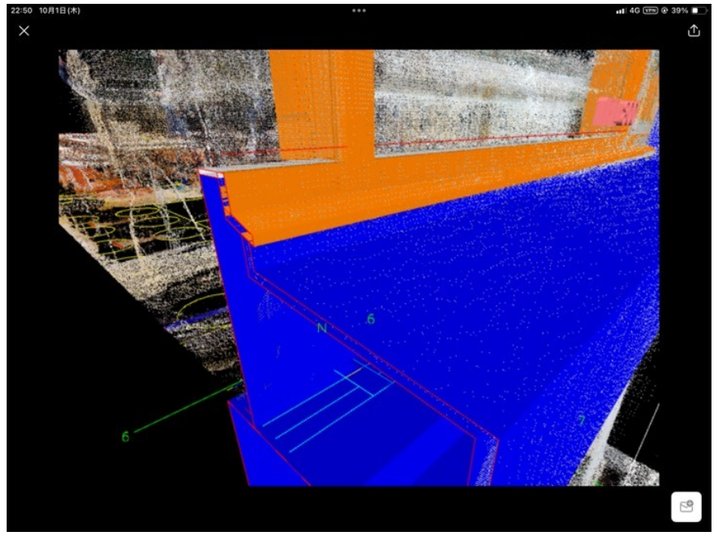

点群＋Revitトレース
赤ライン・1FL＋800


現場名
梱山女学園大学大学会館食堂リニューアル工事
御承認
9/28
年月日
品名
色見本
担当
折田
材質・仕上
SUS304 1.5t ウレタン焼付塗装
提出年月日
2026年9月18日
摘要
日塗工 D25-60B 3分艶
Tajima
三和タジマ株式会社
COLOR SAMPLE
工事名
梱山女学園大学大学会館食堂リニューアル工事
色調
D25-60B 3分艶 ウレタン 40μ以上
製作NO.
No.26-1131
検査
安藤
製作月日
2026年 09月 15日
株式会社 戸田塗装工業

