工 事 項 目	年	2026																																																								
	月																11月																															12月												
	日	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	曜	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日

【現場行事】

【周辺学校行事】

10/17.18

10/24

11/14
指定校入試

11/21.22
推薦入試

12/1~3
厨房清掃

12/12
推薦入試

【食堂改修】縦横
仮設工事

通芯・レベル設定

作業員用昇降足場・東面SSD前足場組立

仮設ハウス・トイレ設置

食堂西エリア間仕切り壁・既存養生

東側仕上養生
下壁用足場組立

間仕切

【西エリア】
解体・撤去

天井設備・電気器具撤去

家具カウンター撤去 天井ボード解体 300m2 60m2/日→5日

床タイル斫り 190m2 40m2/日→5日 床タイル斫り

斫りガラ搬出

床タイル斫り

斫りガラ搬出

改修・仕上

新設天井用墨出

既存天井開口塞ぎ・新設開口補強→ルーバー天井下地 300m2

天井ボー

アルミルーバー裏ガラスフィルム

新設配線・配管

【東・中央入口エリア】
解体・撤去

入口廻り天井解体 100m2 60m2/日→2日

天井設備・電気器具撤去 入口→下壁

東側天井・下壁・照明・プラン

改修・仕上

新設天井用墨出

新設天

新設配線・配管

二重床部設備

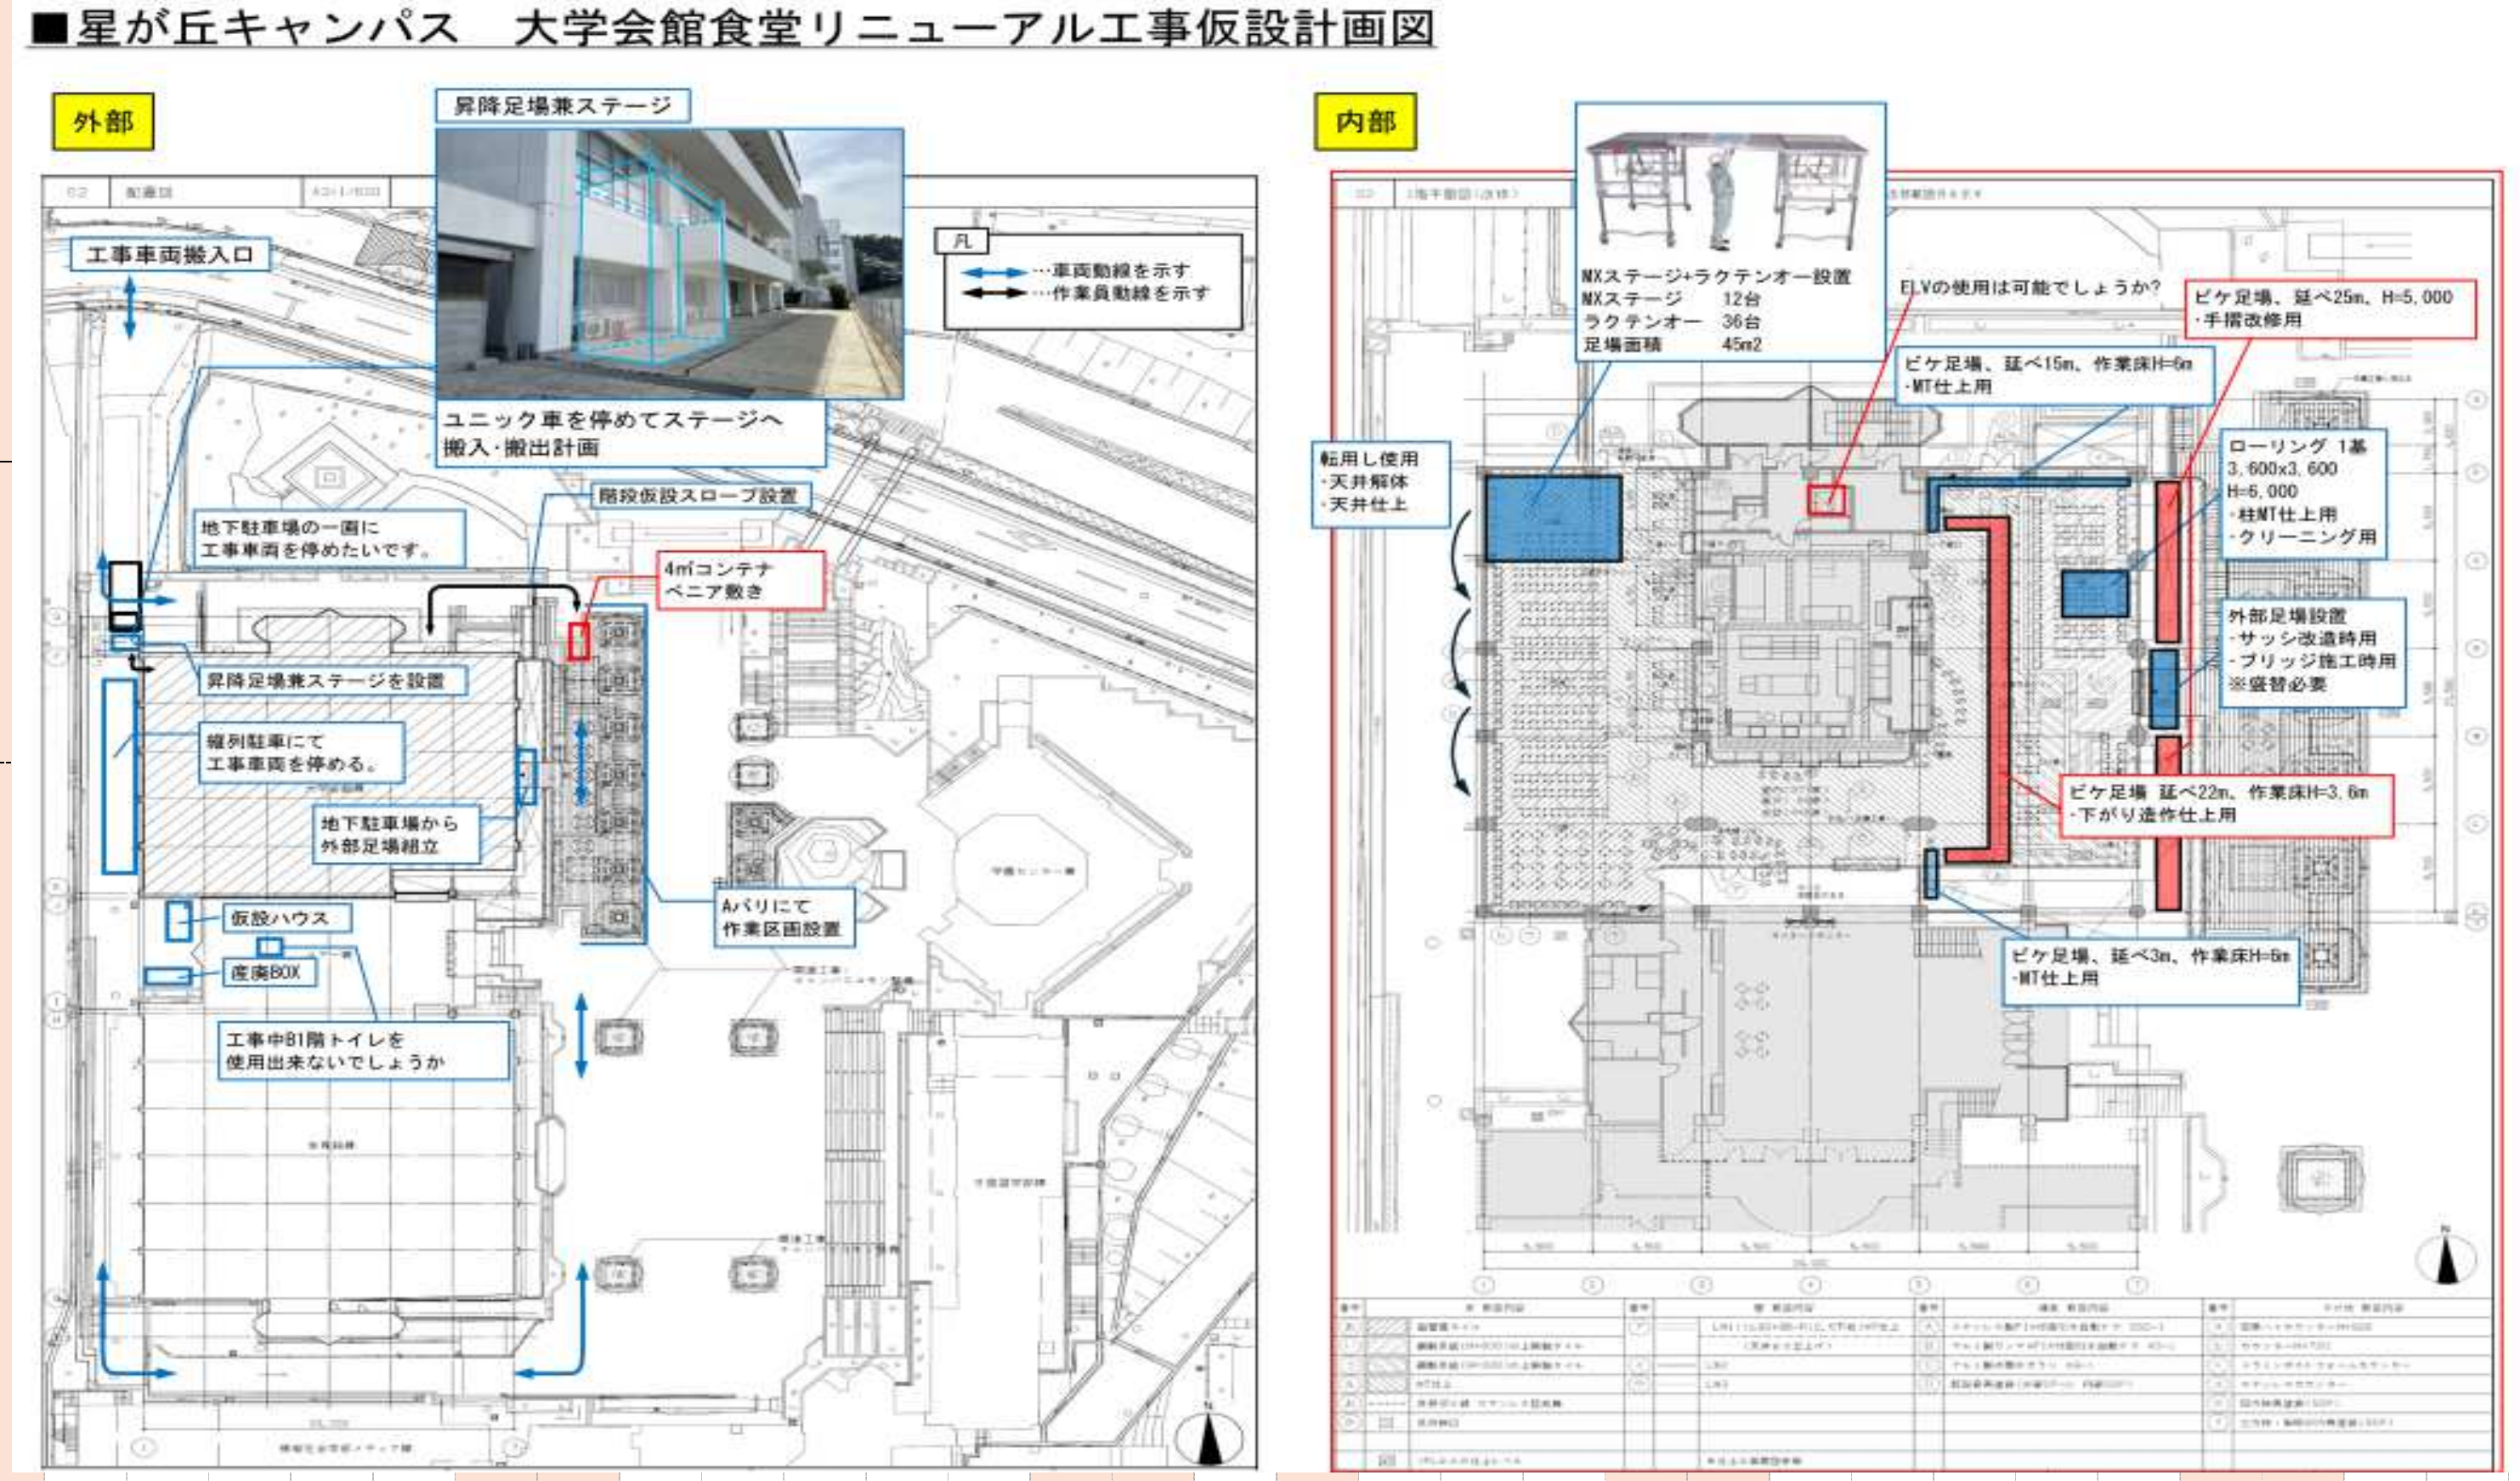

■星が丘キャンパス 大学会館食堂リニューアル工事仮設計画図

外部

昇降足場兼ステージ

凡
…車両動線を示す
…作業員動線を示す

工事車両搬入口

ユニック車を停めてステージへ
搬入・搬出計画

階段仮設スロープ設置

地下駐車場の一画に
工事車両を停めたいです。

4㎡コンテナ
ベニア敷き

昇降足場兼ステージを設置

縦列駐車にて
工事車両を停める。

地下駐車場から
外部足場組立

仮設ハウス

産廃BOX

Aバリにて
作業区画設置

工事中B1階トイレを
使用出来ないでしょうか

内部

MXステージ+ラクテンオー設置
MXステージ 12台
ラクテンオー 36台
足場面積 45m2

ELVの使用は可能でしょうか?

ビケ足場、延べ25m、H=5,000
・手摺改修用

ビケ足場、延べ15m、作業床H=6m
・MT仕上用

転用し使用
・天井解体
・天井仕上

ローリング 1基
3,600x3,600
H=6,000
・柱MT仕上用
・クリーニング用

外部足場設置
・サッシ改造時用
・ブリッジ施工時用
※盛替必要

ビケ足場 延べ22m、作業床H=3.6m
・下がり造作仕上用

ビケ足場、延べ3m、作業床H=6m
・MT仕上用

【外構改修】
仮設工事

地下駐車場吹抜部落下防止

外構仮囲(

【外構】
解体・撤去

既設植栽・土撤去 搬出

ウッドデッキ干渉部躯体斫り

【外構】
改修・仕上

新設花壇用躯体

新設花壇部塗膜防水

透水シート
