図面・計画書添付書

工事名

椙山女学園　星が丘キャンパス大学会館食堂リニューアル工事

図面名称	1階平面詳細図	躯　体	[✓ 仕　上]	設　備
施工予定日	2026/11/09	打合図	[✓ 受領図]	受領印用図
		発行日		返却希望日

	発 注 者			施工部署				生産技術部		設備部	
				現場管理責任者	工事長	主任	担当者	工事長	**担当者**	工事長	担当者
印				承認 2026/10/23 金子　冬平				承認 2026/10/23 小山　努			
日付				10,23							

	設　計 責任者	工　事 監理者		工事監理担当者							
				意匠		構造		機械		電気	
印			牧村								
日付			26.10.27								

記　事（質疑応答・連絡事項・その他）

西側：カーテン・座席調整済み

P4～実測データ

1023

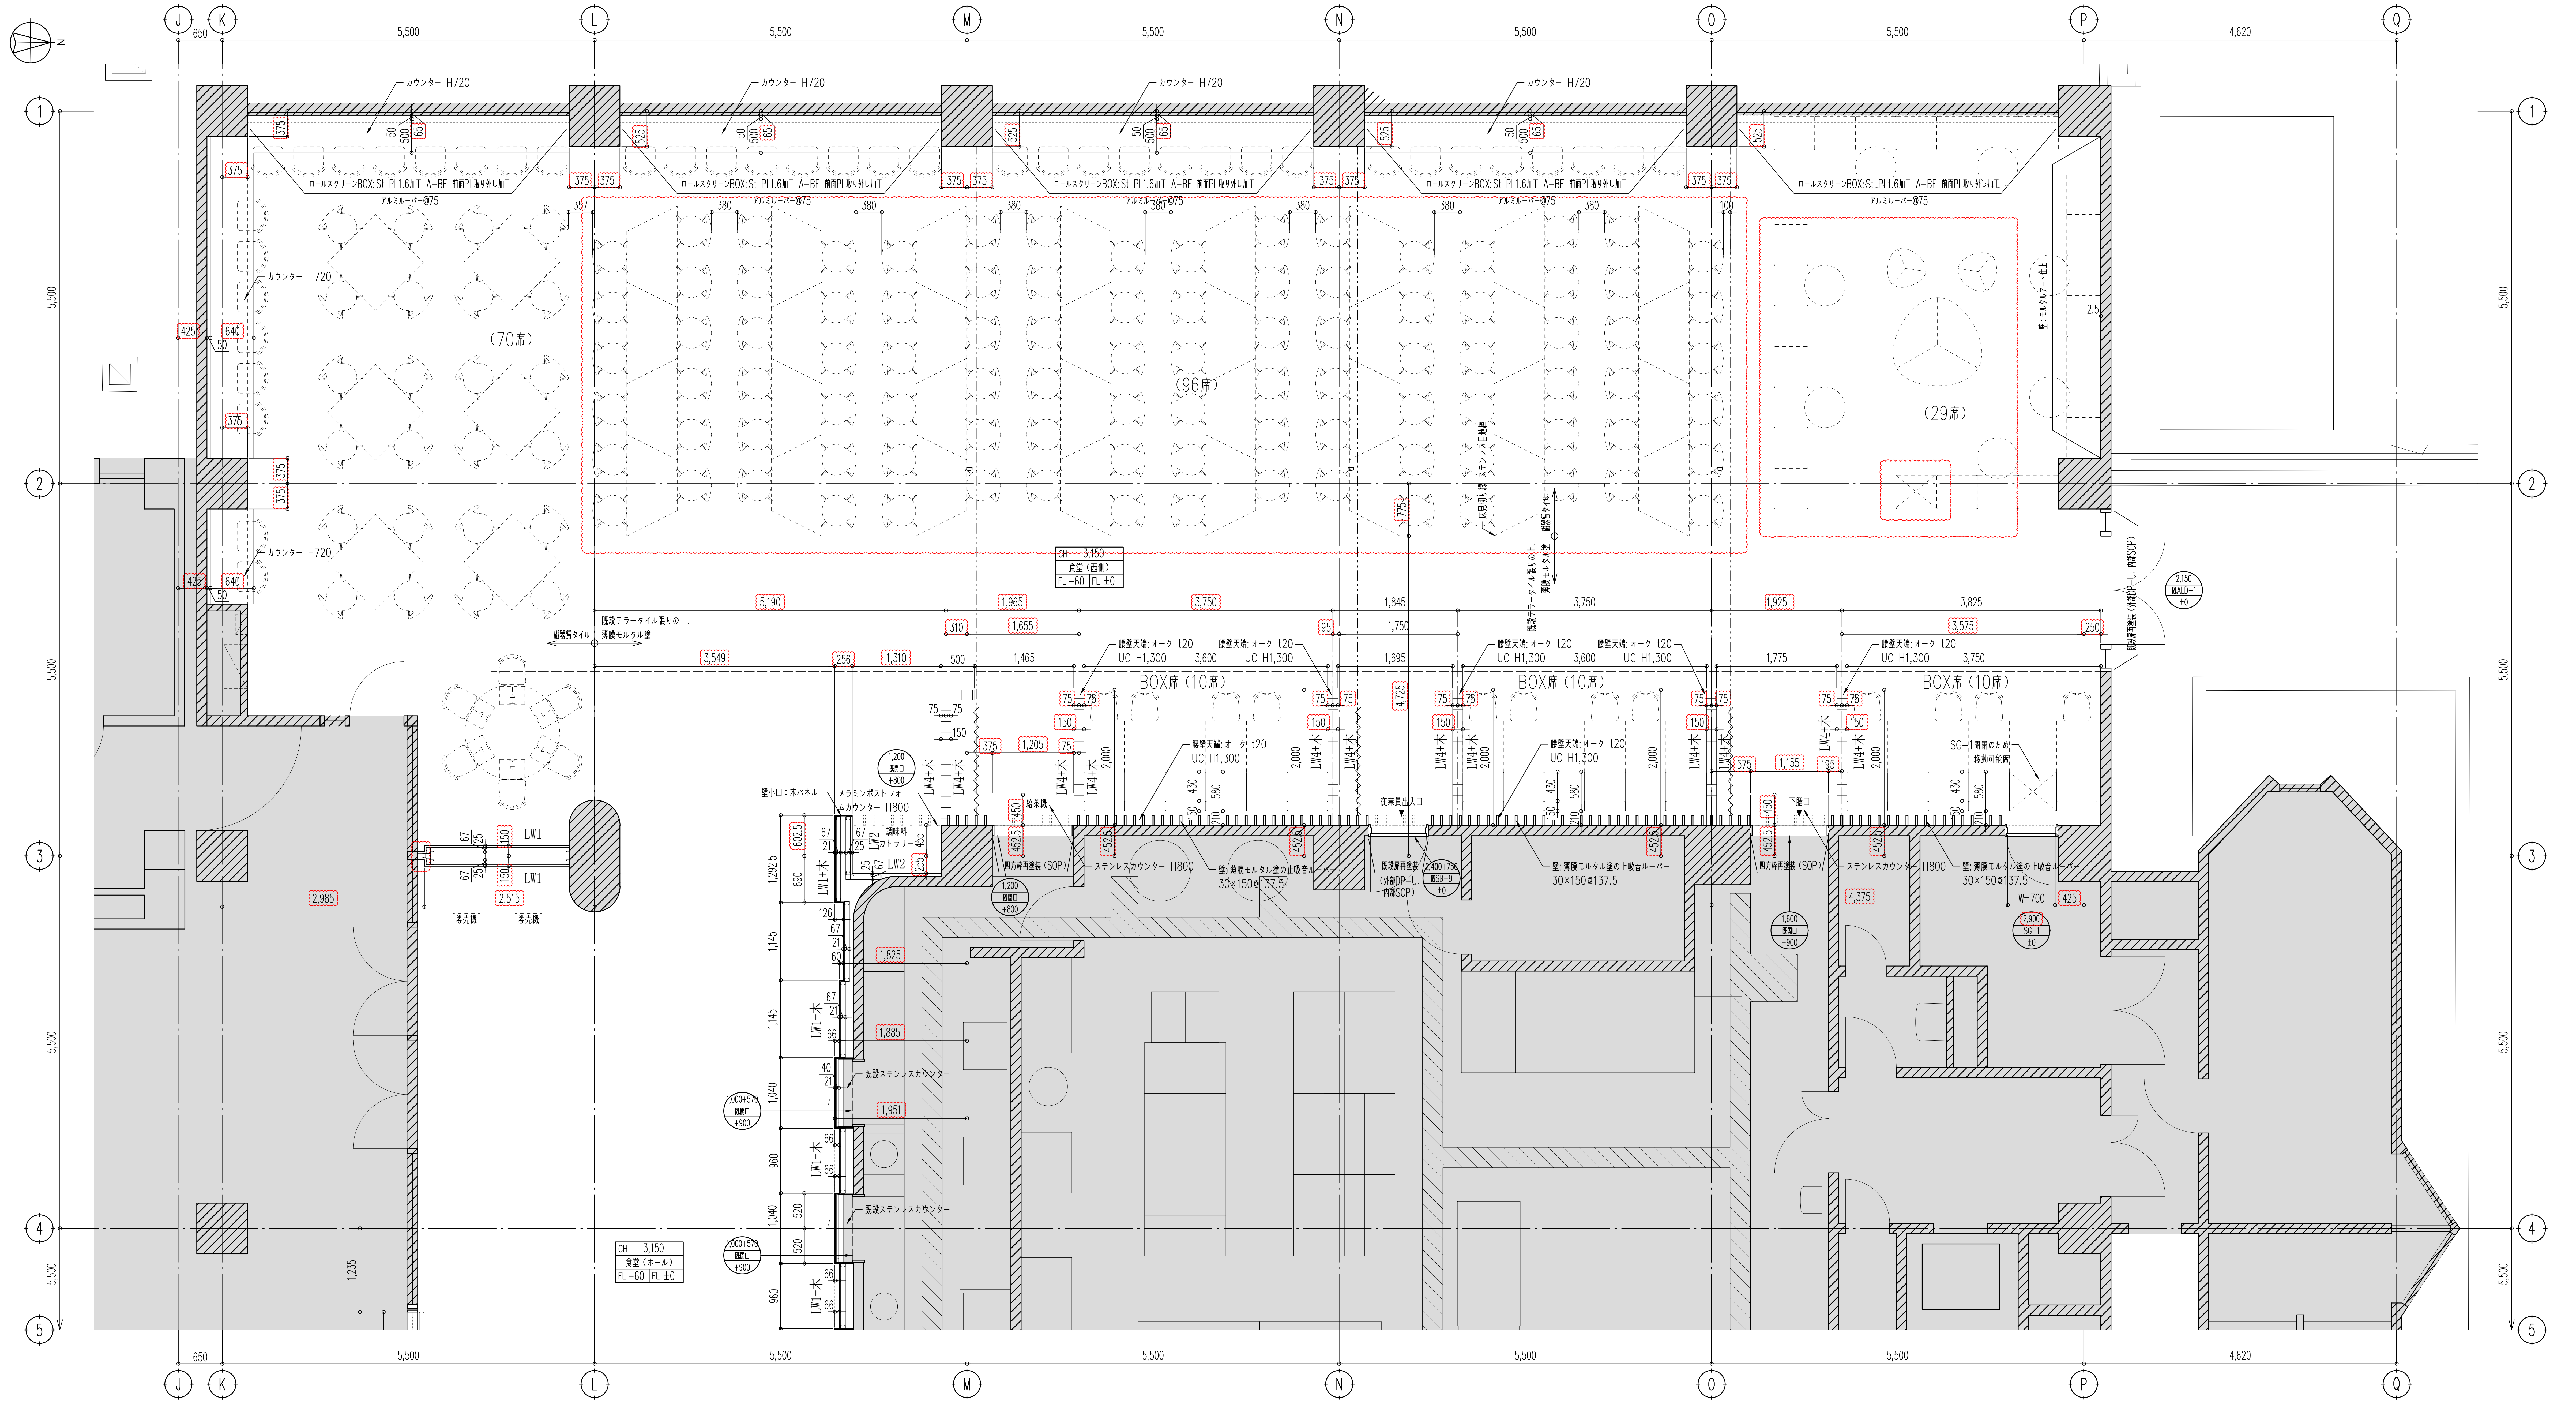

壁記号凡例

L 床～天井

L スラブ～スラブ

L 天井内 増張り

MT：薄膜モルタル塗

木 ：木パネル t5・7・9

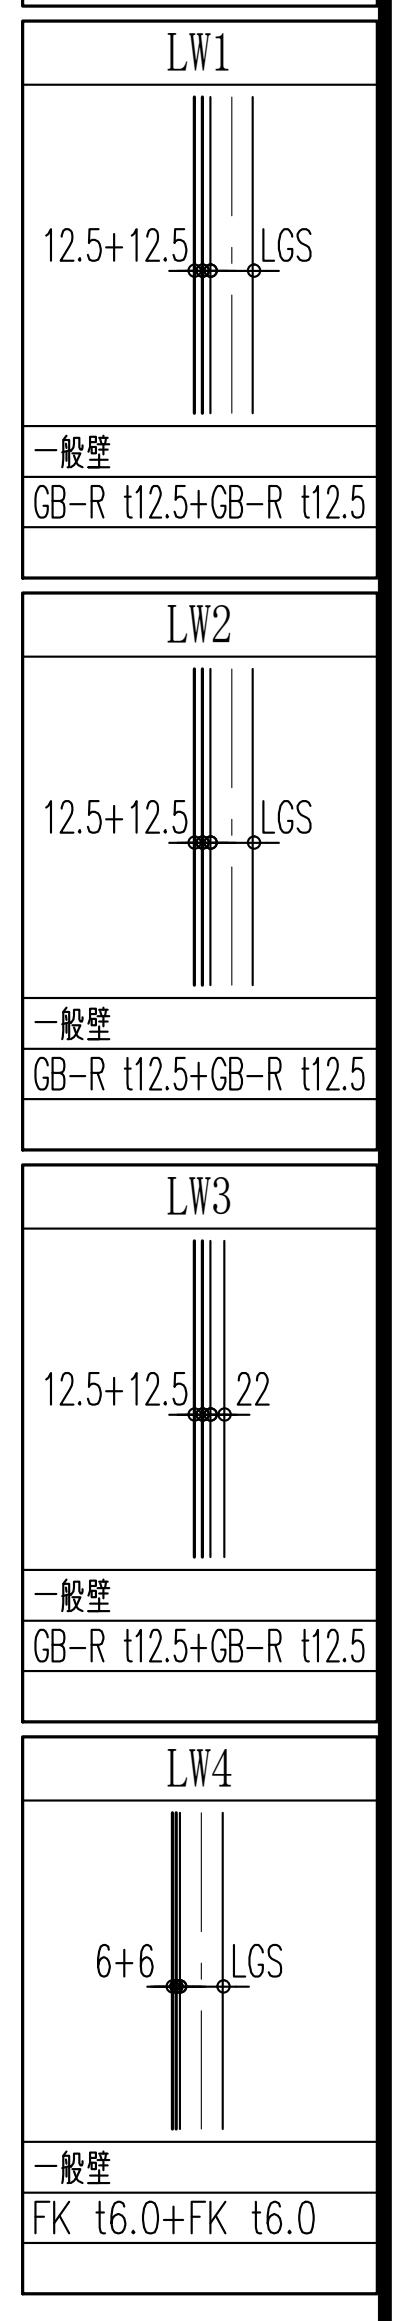

壁記号	種別	仕様
LW1	一般壁	GB-R t12.5+GB-R t12.5
LW2	一般壁	GB-R t12.5+GB-R t12.5
LW3	一般壁	GB-R t12.5+GB-R t12.5
LW4	一般壁	FK t6.0+FK t6.0

KEY PLAN

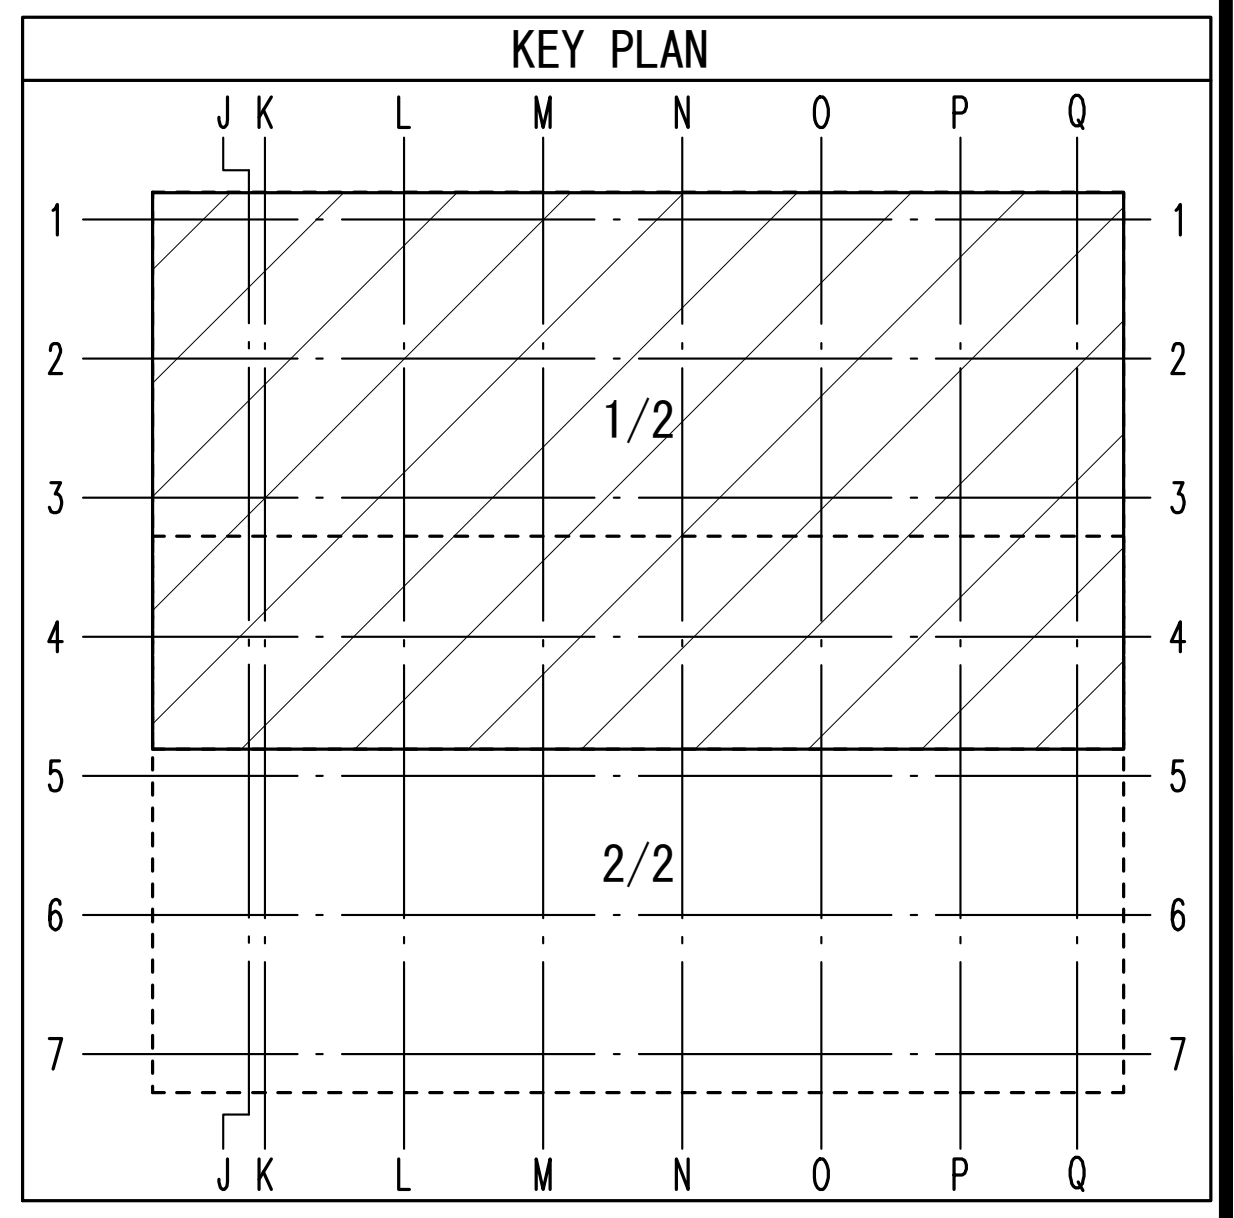

打合図 '26.10.22

設計図発行日 '26.03.27

ボード略号凡例

略号	内　容
GB-R	石膏ボード
GB-R-H	普通硬質石膏ボード
GB-S	シージング石膏ボード
GB-F	強化石膏ボード
GB-L	石膏ラスボード
GB-D	化粧石膏ボード
GB-NC	不燃積層石膏ボード、不燃化粧石膏ボード
GB-P	吸音あなあき石膏ボード
GB-PD	化粧石膏吸音ボード
GB-R-Hc	吸放湿石膏ボード
K	けい酸カルシウム板
KB	化粧けい酸カルシウム板
RB	ロックウール吸音板

食堂（西側）	CH=3,150	躯体レベル FL-60 仕上レベル FL±0
床	仕上	既設テラータイル張りの上薄膜モルタル塗 レベル調整モルタルの上磁器質タイル
	下地	コンクリート
巾木		不陸調整の上 樹脂巾木 H40
壁	仕上	吸音ルーバー 既設GB-Rt12下地ラフトンジャンボ吹付一部50角タイル張り
	下地	軽量鉄骨　の上薄膜モルタル塗
天井	仕上	DR t12 GB-Rt12.5下地EP+吸音ルーバー
	下地	軽量鉄骨
廻縁		塩ビ製
特記		カウンター、四方枠・三方枠再塗装、ストリングスカーテン +埋込カーテンレール、アルミルーバー+ロールスクリーン

食堂（ホール）	CH=3,150	躯体レベル FL-60 仕上レベル FL±0
床	仕上	既設テラータイル張りの上薄膜モルタル塗
	下地	コンクリート
巾木		不陸調整の上 樹脂巾木 H40
壁	仕上	木パネル 既設GB-Rt12下地ラフトンジャンボ吹付一部50角タイル張り
	下地	軽量鉄骨　の上薄膜モルタル塗
天井	仕上	DR t12 GB-Rt12.5下地EP+吸音ルーバー
	下地	軽量鉄骨
廻縁		ー
特記		手洗いカウンター（設備工事）・鏡

チェック項目	未	完			
・FLの押えの統一			・巾木の逃げ		
・下げ梁 下げスラブ			・石．T．B（テラゾー B）の逃げ		
・フロアーヒンジ			・SW．AW．SDの差筋・箱入		
・インサート・ルーフドレーン（打込み金物）			・SSの溝ボックス差筋箱入		
・防水立上り			・手摺子金物．アンカー差筋・箱入		
・ELV関連．箱入（押ボタン．ワイヤー穴）			・ブロック用差筋（床．天井．梁下．壁）		
・設備開口．及貫通孔			・断熱材の打込み		
・荷揚げ用仮穴．墨出し穴．足場用アンカー			・誘発目地・化粧目地		
・後打部（打継ぎ部）			・常開のSFD埋め込み（マグネット共）		
・掃除口穴（打継ぎ部梁底）			・		
・打放しフカシ・増打			・		

凡　例

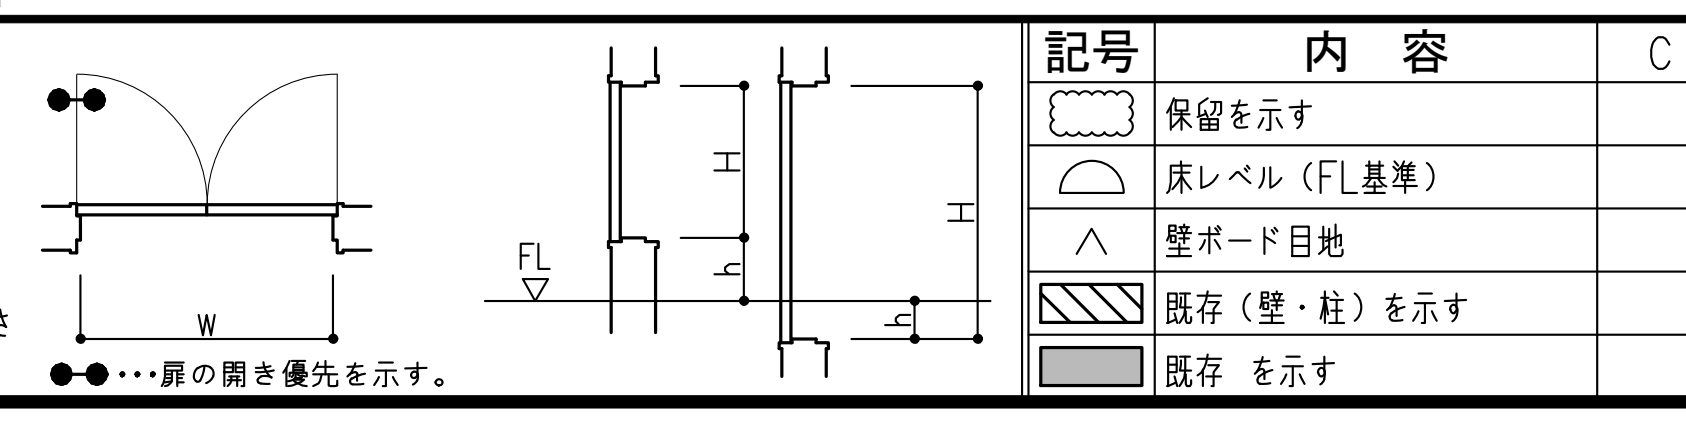

●●・・・扉の開き優先を示す。

記号	内　容
⌒⌒	保留を示す
◠	床レベル（FL基準）
∧	壁ボード目地
▨	既存（壁・柱）を示す
▩	既存 を示す

C	ストリングスカーテン

改訂履歴	改訂日	改訂ヶ所	改訂理由
第１回改訂			
第２回改訂			
第３回改訂			
第４回改訂			
第５回改訂			

配布ルール
1 変更の場合はこの原図を変更し、改訂履歴を明記する。
2 原図に配布予定先を記入する。
3 変更の都度、全部の配布予定先にコピーを配布する。
4 変更図（コピー）を受領したら旧版は自主廃棄する。

配布予定業者

承認	審査	作成
現場管理責任者		担当者
受領日		

椙山女学園星が丘キャンパス大学会館食堂リニューアル工事

1階平面詳細図-1/2

縮尺 A1:1/50 A3:1/100　'26.09.16

清水建設株式会社名古屋支店

仕上－０１

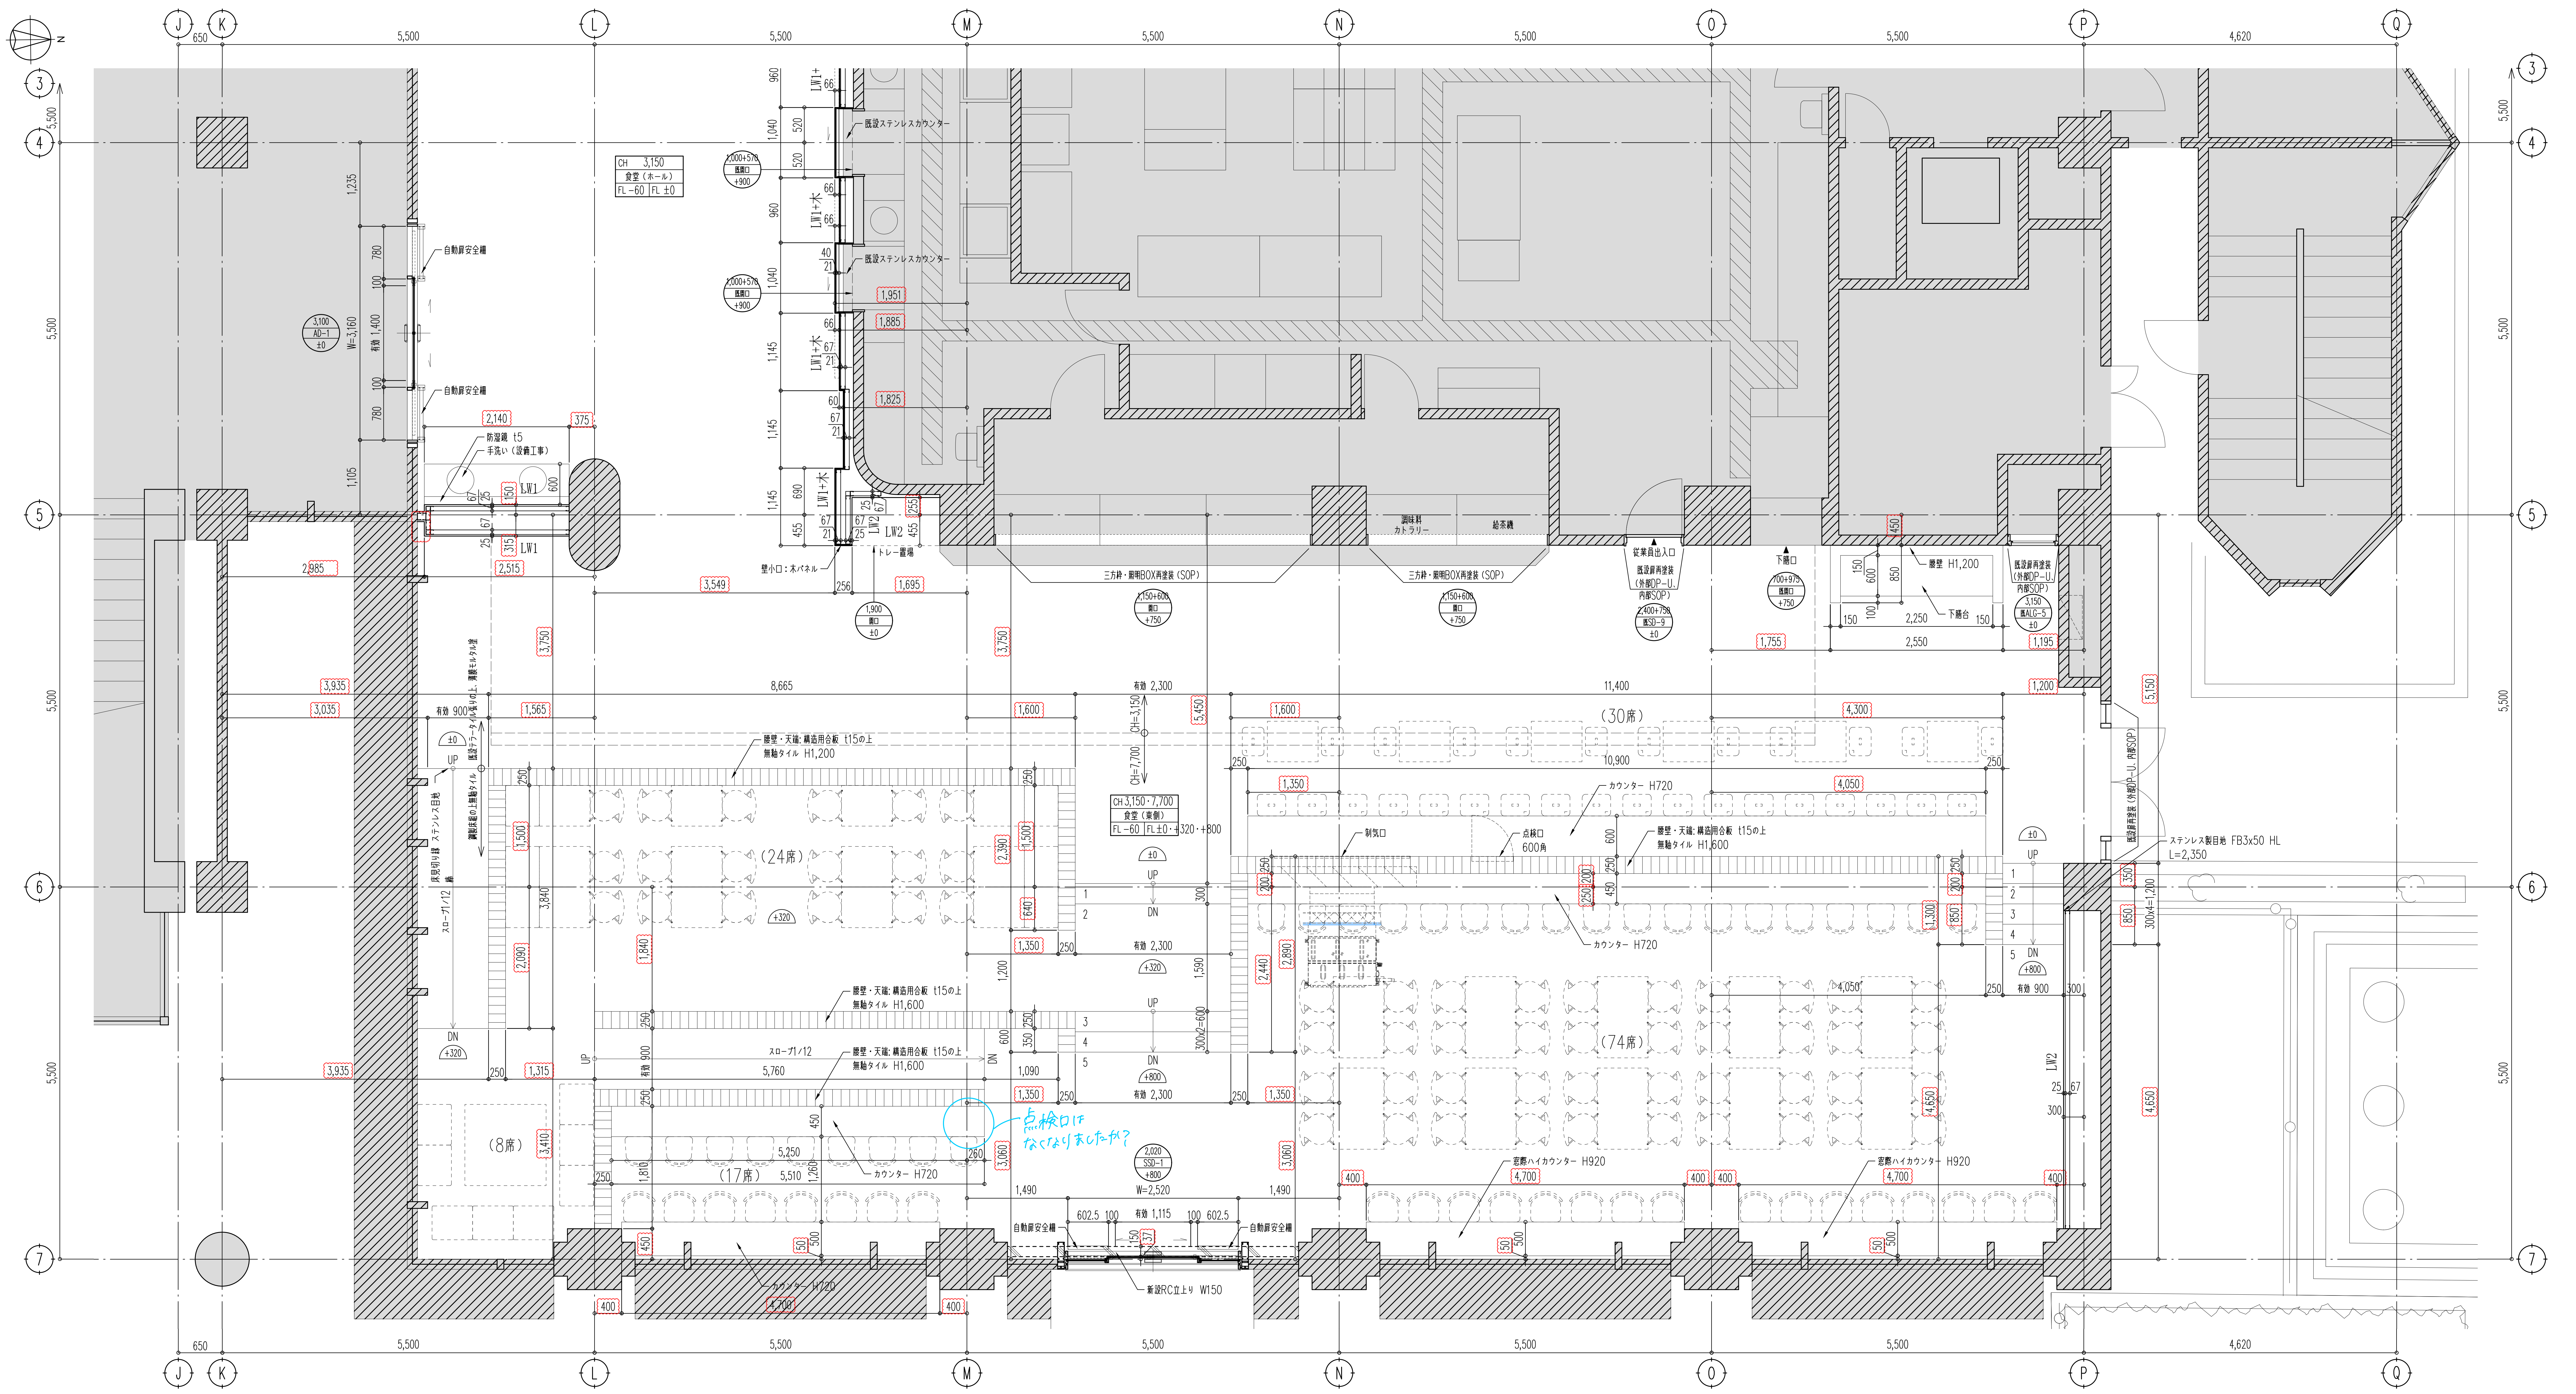

点検口は
なくなりましたか？

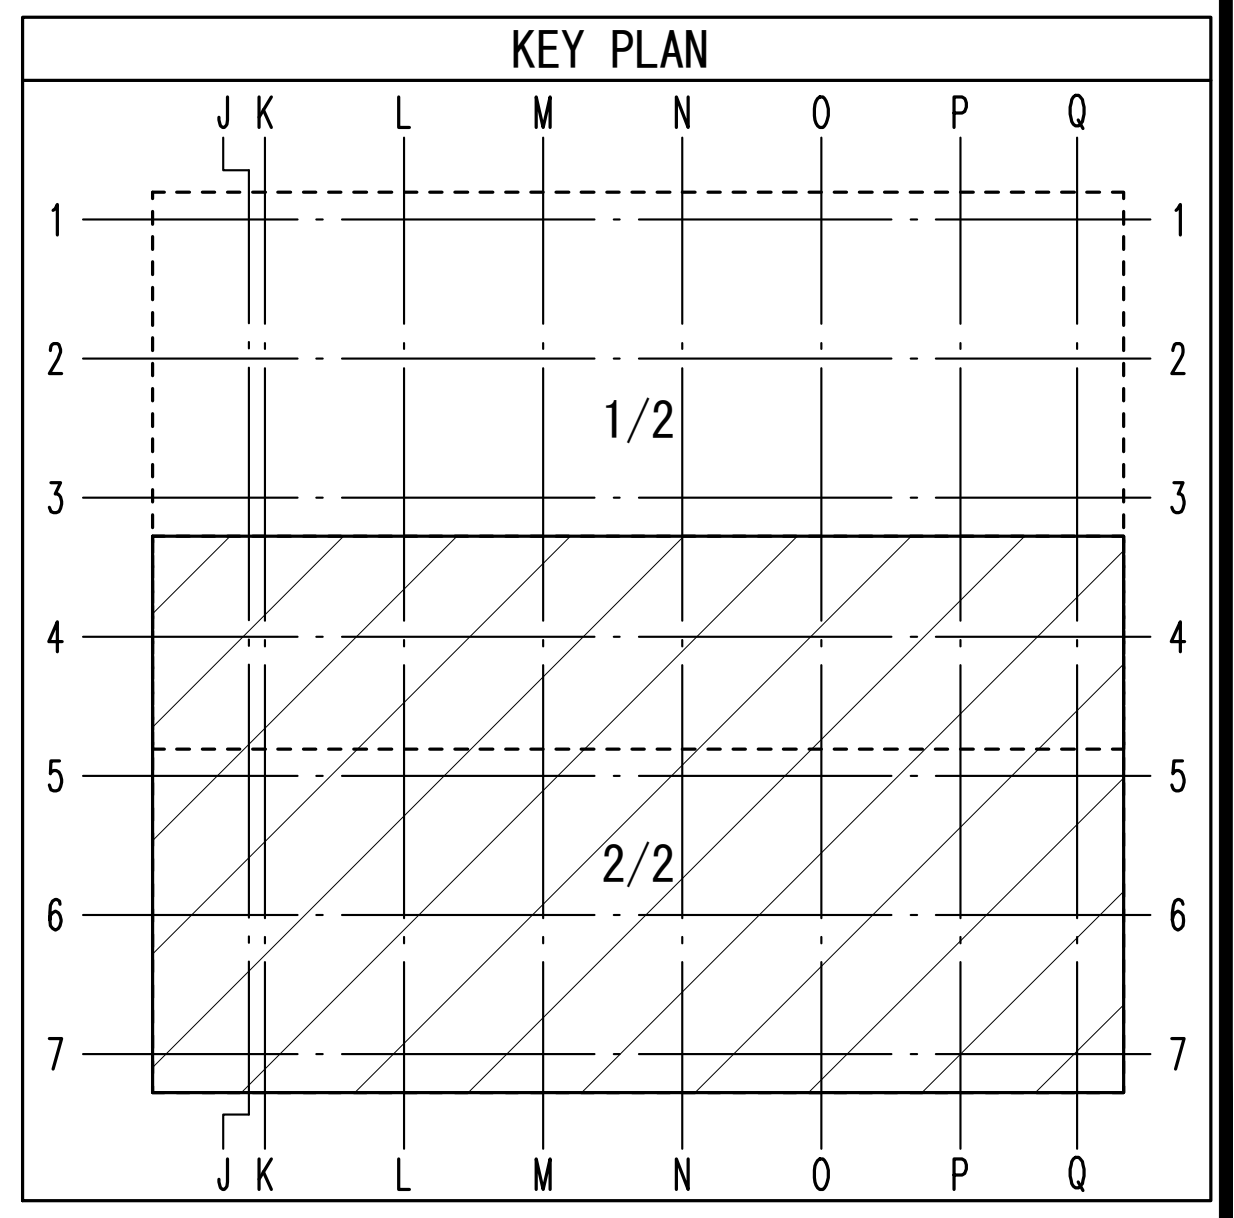

壁記号凡例

L 床～天井
L スラブ～スラブ
L 天井内 増張り
L XX Y + Z
MT：薄膜モルタル塗
木 ：木パネル t5・7・9

LW1
12.5+12.5 LGS
一般壁
GB-R t12.5+GB-R t12.5

LW2
12.5+12.5 LGS
一般壁
GB-R t12.5+GB-R t12.5

ボード略号凡例

略号	内容
GB-R	石膏ボード
GB-R-H	普通硬質石膏ボード
GB-S	シージング石膏ボード
GB-F	強化石膏ボード
GB-L	石膏ラスボード
GB-D	化粧石膏ボード
GB-NC	不燃積層石膏ボード、不燃化粧石膏ボード
GB-P	吸音あなあき石膏ボード
GB-PD	化粧石膏吸音ボード
GB-R-Hc	吸放湿石膏ボード
K	けい酸カルシウム板
KB	化粧けい酸カルシウム板
RB	ロックウール吸音板

食堂（東側）		CH=3,150 CH=7,700	躯体レベル FL−60 仕上レベル FL±0・+320・+800
床	仕上	無釉タイル 既設テラータイル張りの上薄膜モルタル塗	
	下地	鋼製床組+構造用合板 t15、コンクリート	
巾木		不陸調整の上 樹脂巾木 H40	
壁	仕上	GB-Rt12.5下地EP+吸音ルーバー 既設GB-Rt12下地ラフトンジャンボ吹付一部50角タイル張り	
	下地	軽量鉄骨 の上薄膜モルタル塗	
天井	仕上	GB-Rt12.5下地EP+吸音ルーバー GB-Rt12.5下地+リブDR t19、DR t9.0貼分け	
	下地	軽量鉄骨	
廻縁		塩ビ製	
特記		−	

食堂（ホール）		CH=3,150	躯体レベル FL−60 仕上レベル FL±0
床	仕上	既設テラータイル張りの上薄膜モルタル塗	
	下地	コンクリート	
巾木		不陸調整の上 樹脂巾木 H40	
壁	仕上	木パネル 既設GB-Rt12下地ラフトンジャンボ吹付一部50角タイル張り	
	下地	軽量鉄骨 の上薄膜モルタル塗	
天井	仕上	DR t12 GB-Rt12.5下地EP+吸音ルーバー	
	下地	軽量鉄骨	
廻縁		−	
特記		手洗いカウンター（設備工事）・鏡	

チェック項目	未	完	・巾木の逃げ		
・FLの押えの統一			・石．T．B（テラゾー B）の逃げ		
・下げ梁 下げスラブ			・SW．AW．SDの差筋・箱入		
・フロアーヒンジ			・SSの溝ボックス差筋箱入		
・インサート・ルーフドレーン（打込み金物）			・手摺子金物．アンカー差筋・箱入		
・防水立上り			・ブロック用差筋（床．天井．梁下．壁）		
・ELV関連．箱入（押ボタン．ワイヤー穴）			・断熱材の打込み		
・設備開口．及貫通孔			・誘発目地・化粧目地		
・荷揚げ用仮穴．墨出し穴．足場用アンカー			・常開のSFD埋め込み（マグネット共）		
・後打部（打継ぎ部）			・		
・掃除口穴（打継ぎ部梁底）			・		
・打放しフカシ・増打			・		

凡　例

＜階高＞
2FL
4,950
1FL

＜室名 記号＞
天井高さ
室名
躯体天端 床仕上天端
特記事項

＜開口 記号＞
H — 開口寸法 高さ
符号 — 建具符号
h — 基準高さから建具下枠の上端までの高さ
特記事項（電気錠等）

W
●●・・・扉の開き優先を示す。
H
h
FL

記号	内容		
⬚	保留を示す	C	ストリングスカーテン
⌓	床レベル（FL基準）		
∧	壁ボード目地		
▨	既存（壁・柱）を示す		
■	既存 を示す		

改訂履歴	改訂日	改訂ヶ所	改訂理由
第１回改訂			
第２回改訂			
第３回改訂			
第４回改訂			
第５回改訂			

配布ルール
1 変更の場合はこの原図を変更し、改訂履歴を明記する。
2 原図に配布予定先を記入する。
3 変更の都度、全部の配布予定先にコピーを配布する。
4 変更図（コピー）を受領したら旧版は自主廃棄する。

配布予定業者

承 認	審 査	作 成
現場管理責任者		担当者

受領日

打合図
'26.10.22

設計図発行日
'26.03.27

椙山女学園星が丘キャンパス大学会館食堂リニューアル工事
1階平面詳細図-2/2
縮尺 A1:1/50 A3:1/100 '26.09.16
清水建設株式会社名古屋支店
仕上－０２
