J
K
L
M
N
O
P
Q
1
2
3
4
5
5,500
4,620
650
10
1
4
5
6
2
9
8
7
3
カウンター H720
（70席）
（96席）
（29席）
BOX席（10席）
CH 3,150
食堂（西側）
CH 3,150
食堂（ホール）
既設ステンレスカウンター
ステンレスカウンター H800
LW1
LW2
LW3
LW4
壁記号凡例

仕上-1 受領図 v2.0 指摘（1/2）　赤＝要修正　橙＝要確認　青＝対応中

1 ［要修正］①通り窓際カウンター H720：実測の柱型間 4,678～4,705 より 45～72 長く柱型と干渉 → 実測で長さを決め直す
2 ［対応中］中央 BOX 席・袖壁：仕上-5 と 300 ずれ → M 側へ 300（PDS 修正中）
3 ［要修正］配膳開口（既設ステンレスカウンター）：下端 +900 → 実測 FL+965～966 に直す
4 ［要確認］席数：70席エリアの絵は 40～48 で合わない／合計 378→377 にする（PDS に根拠を）
5 ［要確認］29席エリア：ベンチの区切りで席数が読めない（席数の根拠を）
6 ［要確認］既存扉 ALD-1：高さ 2,150 か 3,150 か現地実測
7 ［要確認］③通り：実測差（開口 W1,445→図1,205、W718→図700 など）を反映
8 ［要確認］③ K～L 券売機付近：仕上げできない所の見切り金物
9 ［要確認］②～③ L～M：壁 I字→L字の位置（NS 指示待ち）
10 ［要確認］①通りアルミルーバー：長さ A4,660／B4,680 と目地の確定

座席ナンバリング（椅子記号の自動検出＋ベンチ・ソファは目視、区切り1つ＝1席）

A1～A39　①通り 窓際カウンター K～P：39席
B1～B8　K通り 窓際カウンター：8席
C1～C24　70席エリア ダイヤ形テーブル：24席
D1～D96　96席エリア：96席
I1～I35　29席エリア（ベンチ・ソファの区切り＝1席として目視）：35席
J1～J30　BOX席 3か所（椅子4＋ベンチ6）：30席
・70席：A1～A8＋B＋C＝40、①通りカウンター全体（A）を入れると 71。どの席までを 70席とするかは要確認
・96席：D96 一致　・29席：I は区切り＝1席で数えて 35（ラベル 29 と合わない）　・BOX：J 30 一致

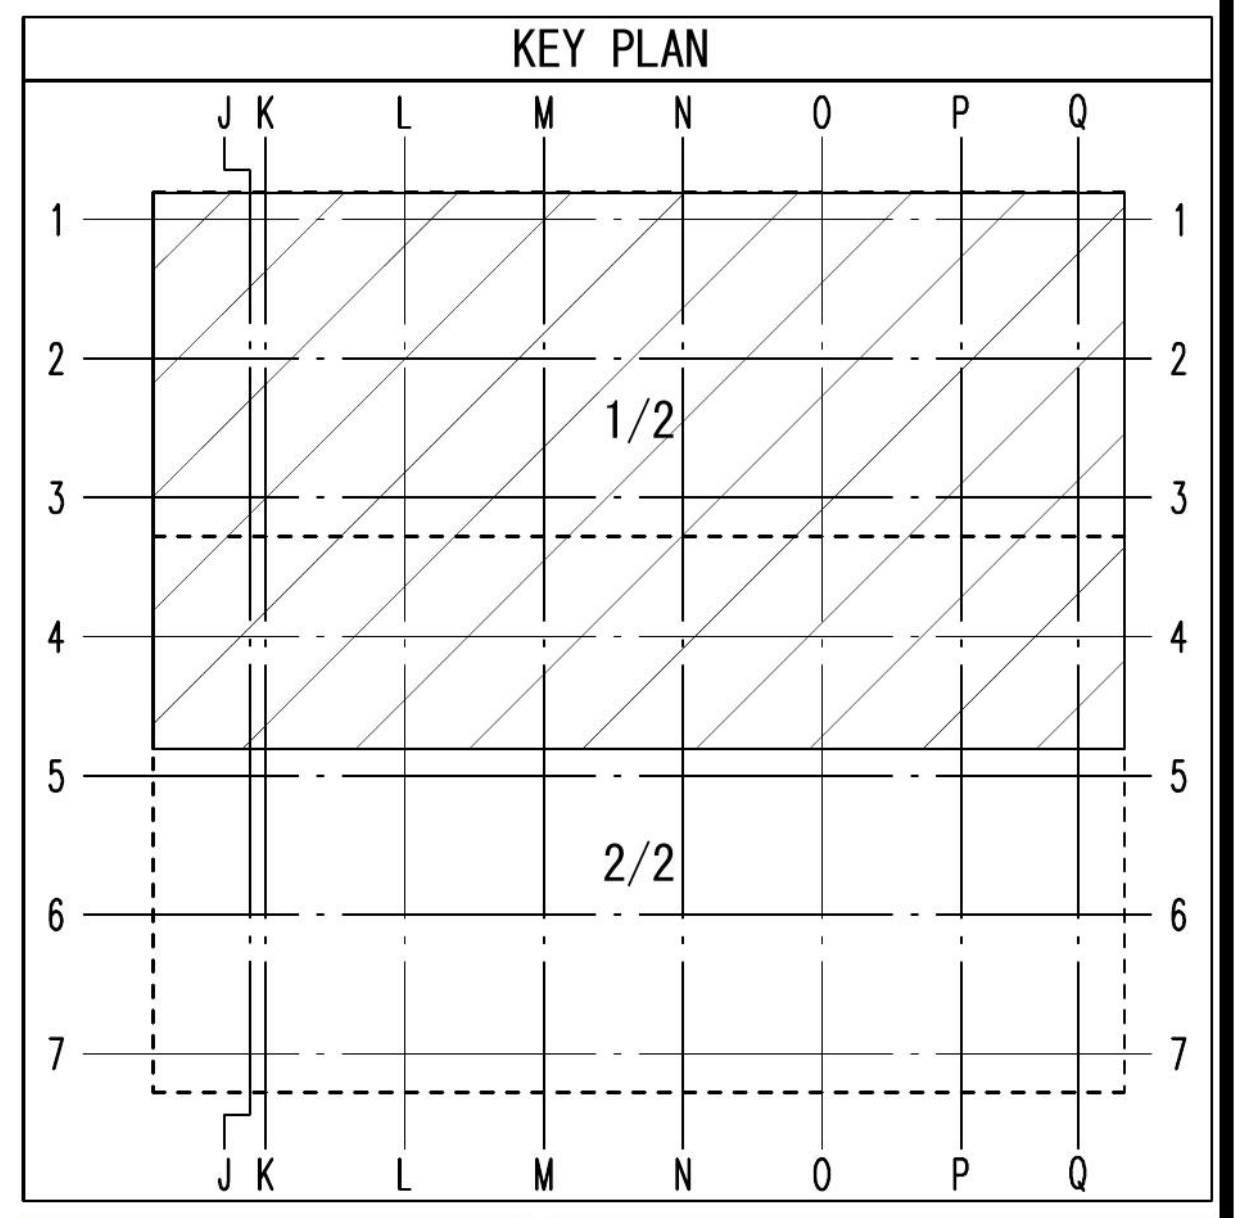
KEY PLAN
J K L M N O P Q
1
2
3
4
5
6
7
1/2
2/2

打合図
'26.10.22

設計図発行日
'26.03.27

略号	内　容
GB-R	石膏ボード
GB-R-H	普通硬質石膏ボード
GB-S	シージング石膏ボード
GB-F	強化石膏ボード
GB-L	石膏ラスボード
GB-D	化粧石膏ボード
GB-NC	不燃積層石膏ボード、不燃化粧石膏ボード
GB-P	吸音あなあき石膏ボード
GB-PD	化粧石膏吸音ボード
GB-R-Hc	吸放湿石膏ボード
K	けい酸カルシウム板
KB	化粧けい酸カルシウム板
RB	ロックウール吸音板

床	仕上	既設テラータイル張りの上薄膜モルタル塗 レベル調整モルタルの上磁器質タイル
	下地	コンクリート
巾木		不陸調整の上 樹脂巾木 H40
壁	仕上	吸音ルーバー 既設GB-Rt12下地ラフトンジャンボ吹付一部50角タイル張り
	下地	軽量鉄骨　の上薄膜モルタル塗
天井	仕上	DR t12 GB-Rt12.5下地EP+吸音ルーバー
	下地	軽量鉄骨
廻縁		塩ビ製
特記		カウンター、四方枠・三方枠再塗装、ストリングスカーテン＋埋込カーテンレール、アルミルーバー＋ロールスクリーン

床	仕上	既設テラータイル張りの上薄膜モルタル塗
	下地	コンクリート
巾木		不陸調整の上 樹脂巾木 H40
壁	仕上	木パネル 既設GB-Rt12下地ラフトンジャンボ吹付一部50角タイル張り
	下地	軽量鉄骨　の上薄膜モルタル塗
天井	仕上	DR t12 GB-Rt12.5下地EP+吸音ルーバー
	下地	軽量鉄骨
廻縁		－
特記		手洗いカウンター（設備工事）・鏡

チ　ェ　ッ　ク　項　目	未	完			
・FLの押えの統一			・巾木の逃げ		
・下げ梁　下げスラブ			・石．T．B（テラゾー　B）の逃げ		
・フロアーヒンジ			・SW．AW．SDの差筋・箱入		
・インサート・ルーフドレーン（打込み金物）			・SSの溝ボックス差筋箱入		
・防水立上り			・手摺子金物．アンカー差筋・箱入		
・ELV関連．箱入（押ボタン．ワイヤー穴）			・ブロック用差筋（床．天井．梁下．壁）		
・設備開口．及貫通孔			・断熱材の打込み		
・荷揚げ用仮穴．墨出し穴．足場用アンカー			・誘発目地・化粧目地		
・後打部（打継ぎ部）			・常開のSFD埋め込み（マグネット共）		
・掃除口穴（打継ぎ部梁底）			・		
・打放しフカシ・増打			・		

凡　例

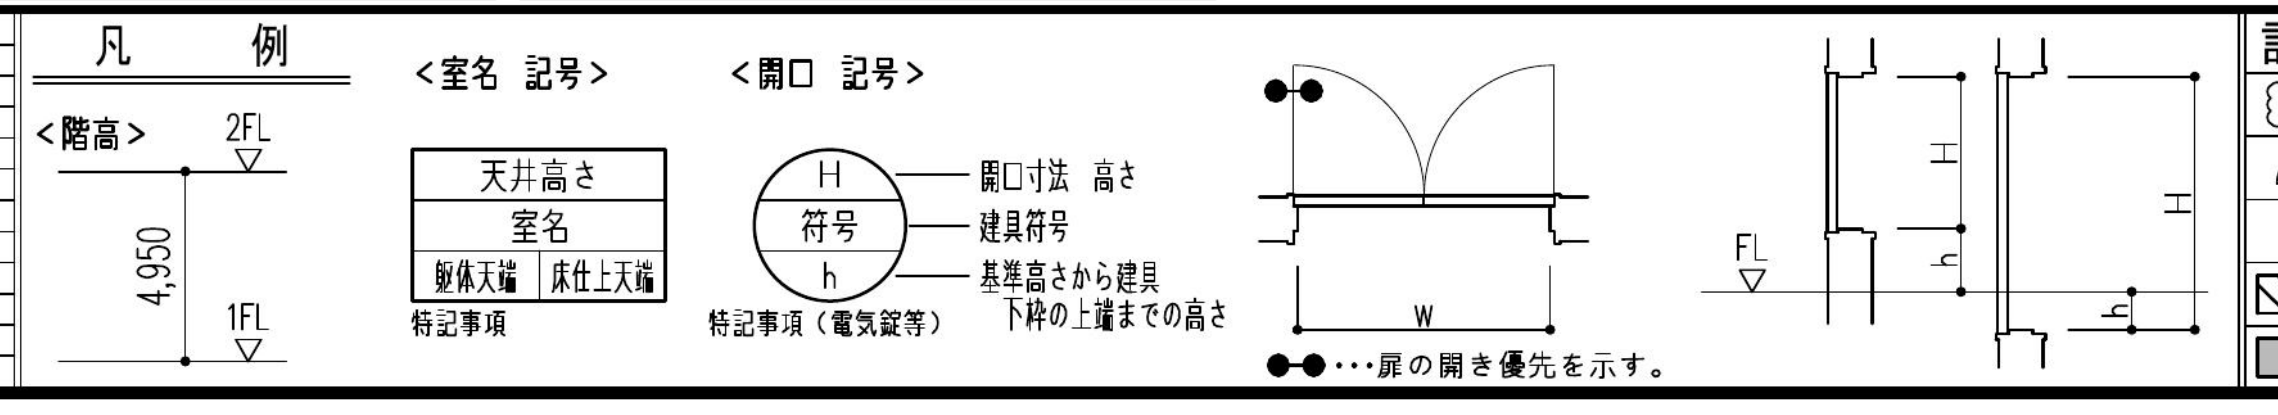
＜階高＞
2FL
4,950
1FL
＜室名 記号＞
天井高さ
室名
躯体天端
床仕上天端
特記事項
＜開口 記号＞
H
符号
h
開口寸法 高さ
建具符号
基準高さから建具下枠の上端までの高さ
特記事項（電気錠等）
W
FL
H
h

●●・・・扉の開き優先を示す。

記号	内　容				
⌒	保留を示す	C	ストリングスカーテン		
◠	床レベル（FL基準）				
∧	壁ボード目地				
▨	既存（壁・柱）を示す				
▩	既存 を示す				

		改訂日	改訂ヶ所	改訂理由
改訂履歴	第１回改訂			
	第２回改訂			
	第３回改訂			
	第４回改訂			
	第５回改訂			

配布ルール
1 変更の場合はこの原図を変更し、改訂履歴を明記する。
2 原図に配布予定先を記入する。
3 変更の都度、全部の配布予定先にコピーを配布する。
4 変更図（コピー）を受領したら旧版は自主廃棄する。

配布予定業者

承 認	審 査	作 成
現場管理責任者		担当者
受領日		

椙山女学園星が丘キャンパス大学会館食堂リニューアル工事
1階平面詳細図-1/2
縮尺 A1:1/50 A3:1/100　'26.09.16
清水建設株式会社名古屋支店
仕上－０１

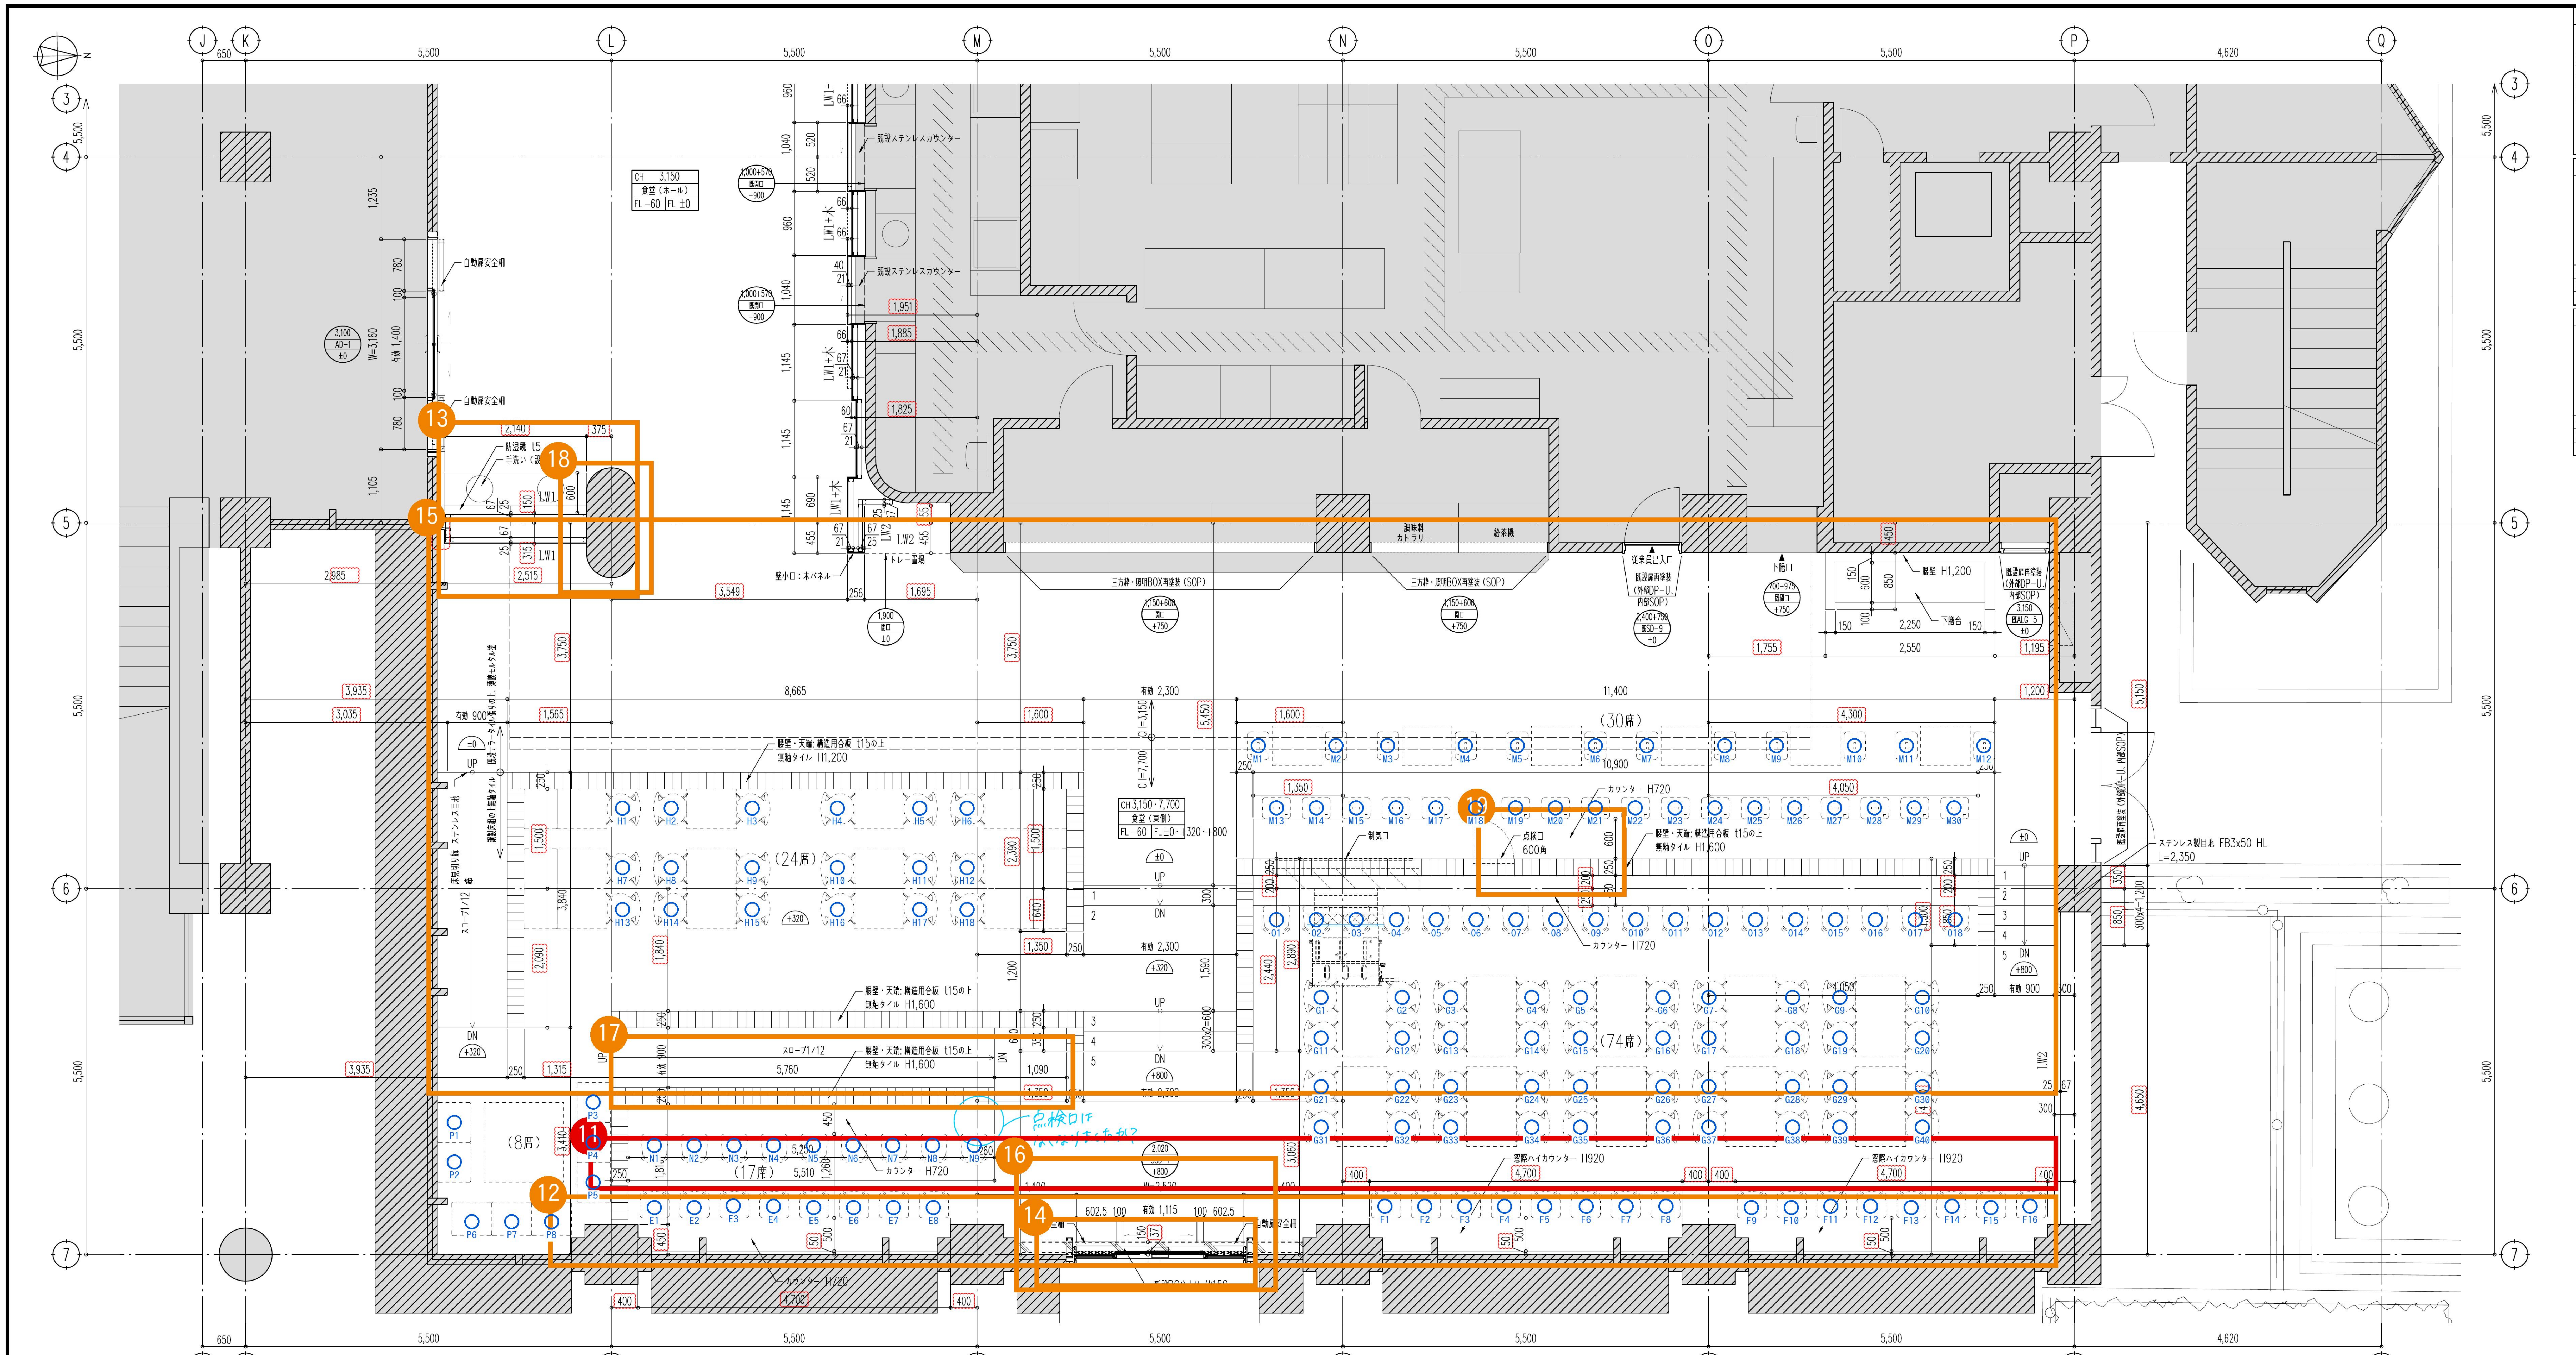

J
K
L
M
N
O
P
Q
650
5,500
4,620
3
4
5
6
7
(30席)
(24席)
(74席)
(17席)
(8席)
カウンター H720
窓際ハイカウンター H920
点検口 600角
13
18
15
19
17
11
16
12
14
点検口は
なくなりましたか？

壁記号凡例

L 床～天井
L スラブ～スラブ
L 天井内 増張り
L XX Y + Z
MT：薄膜モルタル塗
木 ：木パネル t5・7・9

LW1
12.5+12.5 LGS
一般壁
GB-R t12.5+GB-R t12.5

LW2
12.5+12.5 LGS
一般壁
GB-R t12.5+GB-R t12.5

仕上-1 受領図 v2.0 指摘（2/2）　赤＝要修正　橙＝要確認　青＝対応中

11 ［要修正］⑦通り窓際ハイカウンター H920：柱型の面 413～425（P端455）と 13～55 干渉 → 実測で長さを決め直す
12 ［要確認］⑦通り方立（125幅）の位置をカウンターまわりに記入
13 ［要確認］⑤ K～L：図 2,515 → 実測 2,646（＋131）。測った区間を確認
14 ［要確認］SSD-1 足元：クリア20→細目グレーチング・シール欠込み・方立 MIN45 を記入
15 ［要確認］全体：通り芯からの寸法の雲マーク（実測で確定したか）
16 ［要確認］【261104】SSD-1 開口 W=2,520 ↔ 躯体-1 2,620（100 差）［X5］
17 ［要確認］【261104】スロープ水平長 5,760 ↔ 仕上-5 5,954（約194 差）［X7］
18 ［要確認］【261104】楕円柱：躯体-1 750×1,650 ↔ 実測 幅425（片側?）×1,840［X11］
19 ［要確認］【261104】「点検口 600角」：床下点検口は中止 → 削除してよいか［X14］

座席ナンバリング（椅子記号の自動検出＋ベンチ・ソファは目視、区切り1つ＝1席）

E1～E8 ⑦通り 窓際カウンター L～M（17席エリア）：8席
F1～F16 ⑦通り 窓際ハイカウンター M～P（74席エリア）：16席
G1～G40 74席エリア テーブル：40席
H1～H18 24席エリア テーブル：18席
M1～M30 30席エリア（スツール12＋カウンター H720 18）：30席
N1～N9 17席エリア カウンター H720：9席
01～018 74席エリア カウンター H720：18席
P1～P8 8席エリア（ベンチの区切り＝1席）：8席
・30席：M30 一致　・17席：E8＋N9＝17 一致　・74席：F16＋G40＋018＝74 一致　・8席：P8 一致
・24席：H は椅子の絵が 18 しかない（ラベル 24 より 6 少ない）

略号	内容
GB-R	石膏ボード
GB-R-H	普通硬質石膏ボード
GB-S	シージング石膏ボード
GB-F	強化石膏ボード
GB-L	石膏ラスボード
GB-D	化粧石膏ボード
GB-NC	不燃積層石膏ボード、不燃化粧石膏ボード
GB-P	吸音あなあき石膏ボード
GB-PD	化粧石膏吸音ボード
GB-R-Hc	吸放湿石膏ボード
K	けい酸カルシウム板
KB	化粧けい酸カルシウム板
RB	ロックウール吸音板

床	仕上	無釉タイル 既設テラータイル張りの上薄膜モルタル塗
	下地	鋼製床組＋構造用合板 t15、コンクリート
巾木		不陸調整の上 樹脂巾木 H40
壁	仕上	GB-Rt12.5下地EP+吸音ルーバー 既設GB-Rt12下地ラフトンジャンボ吹付一部50角タイル張り
	下地	軽量鉄骨　の上薄膜モルタル塗
天井	仕上	GB-Rt12.5下地EP+吸音ルーバー GB-Rt12.5下地+リブDR t19、DR t9.0貼分け
	下地	軽量鉄骨
廻縁		塩ビ製
特記		－

床	仕上	既設テラータイル張りの上薄膜モルタル塗
	下地	コンクリート
巾木		不陸調整の上 樹脂巾木 H40
壁	仕上	木パネル 既設GB-Rt12下地ラフトンジャンボ吹付一部50角タイル張り
	下地	軽量鉄骨　の上薄膜モルタル塗
天井	仕上	DR t12 GB-Rt12.5下地EP+吸音ルーバー
	下地	軽量鉄骨
廻縁		－
特記		手洗いカウンター（設備工事）・鏡

チェック項目	未	完			
• FLの押えの統一			• 巾木の逃げ		
• 下げ梁 下げスラブ			• 石．T．B（テラゾー B）の逃げ		
• フロアーヒンジ			• SW．AW．SDの差筋・箱入		
• インサート・ルーフドレーン（打込み金物）			• SSの溝ボックス差筋箱入		
• 防水立上り			• 手摺子金物．アンカー差筋・箱入		
• ELV関連．箱入（押ボタン．ワイヤー穴）			• ブロック用差筋（床．天井．梁下．壁）		
• 設備開口．及貫通孔			• 断熱材の打込み		
• 荷揚げ用仮穴．墨出し穴．足場用アンカー			• 誘発目地・化粧目地		
• 後打部（打継ぎ部）			• 常開のSFD埋め込み（マグネット共）		
• 掃除口穴（打継ぎ部梁底）			•		
• 打放しフカシ・増打			•		
			•		

凡　例

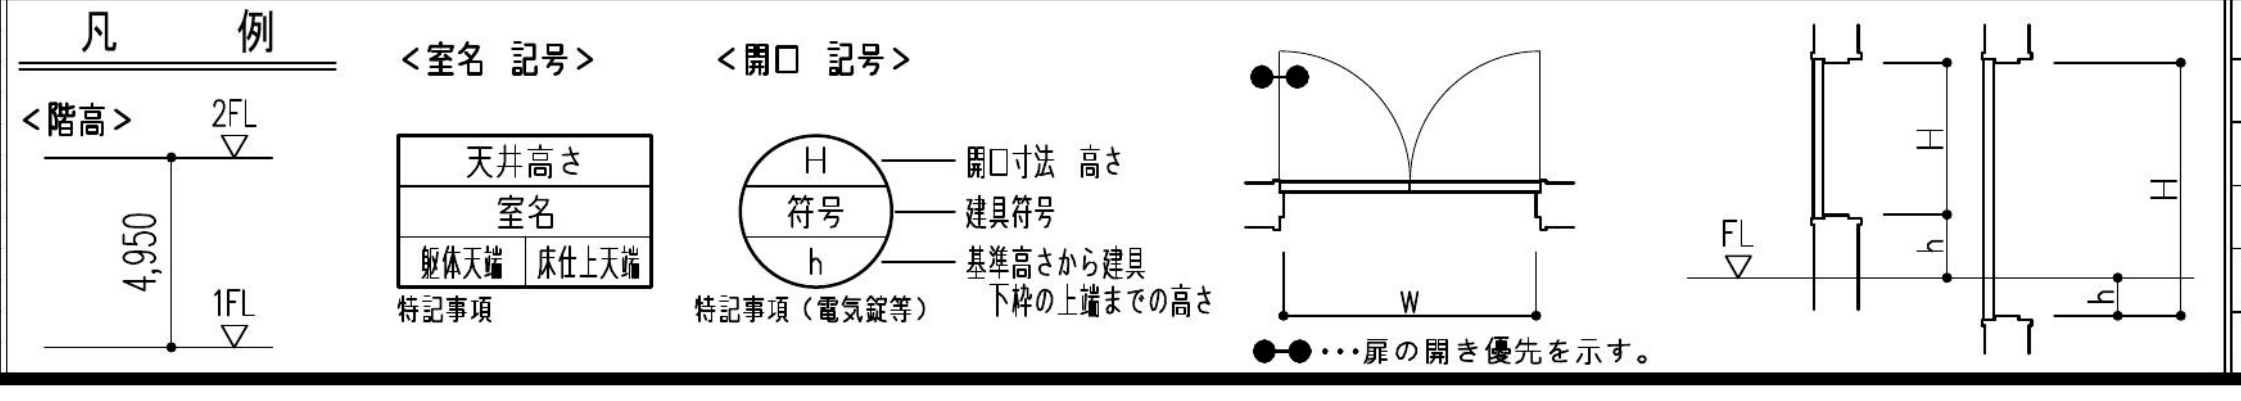

<階高>
2FL
4,950
1FL
<室名 記号>
天井高さ
室名
躯体天端
床仕上天端
特記事項
<開口 記号>
H
符号
h
開口寸法 高さ
建具符号
基準高さから建具下枠の上端までの高さ
特記事項（電気錠等）
W
FL
H
h

●●・・・扉の開き優先を示す。

記号	内容				
▨	保留を示す	C	ストリングスカーテン		
◠	床レベル（FL基準）				
∧	壁ボード目地				
▨	既存（壁・柱）を示す				
▩	既存 を示す				

KEY PLAN

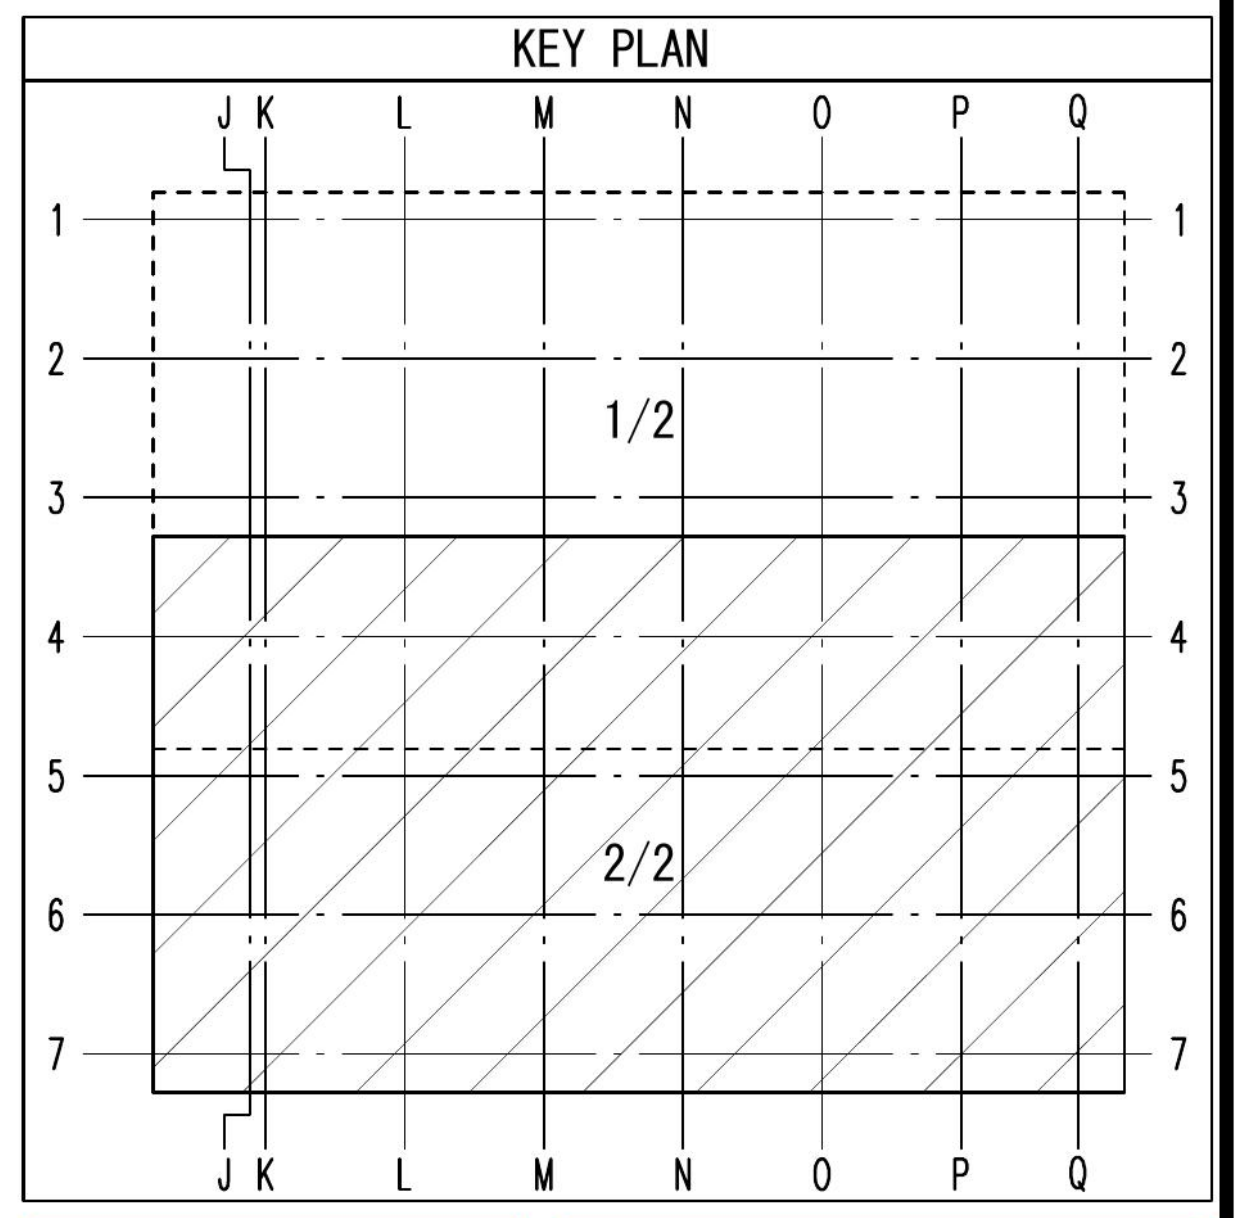

J
K
L
M
N
O
P
Q
1
2
3
4
5
6
7
1/2
2/2

打合図 ’26.10.22
設計図発行日 ’26.03.27

改訂履歴	改訂日	改訂ヶ所	改訂理由
第１回改訂			
第２回改訂			
第３回改訂			
第４回改訂			
第５回改訂			

配布ルール
1 変更の場合はこの原図を変更し、改訂履歴を明記する。
2 原図に配布予定先を記入する。
3 変更の都度、全部の配布予定先にコピーを配布する。
4 変更図（コピー）を受領したら旧版は自主廃棄する。

配布予定業者

承認	審査	作成
現場管理責任者		担当者

受領日

椙山女学園星が丘キャンパス大学会館食堂リニューアル工事
1階平面詳細図-2/2
縮尺 A1:1/50 A3:1/100 ’26.09.16
清水建設株式会社名古屋支店
仕上－０２
