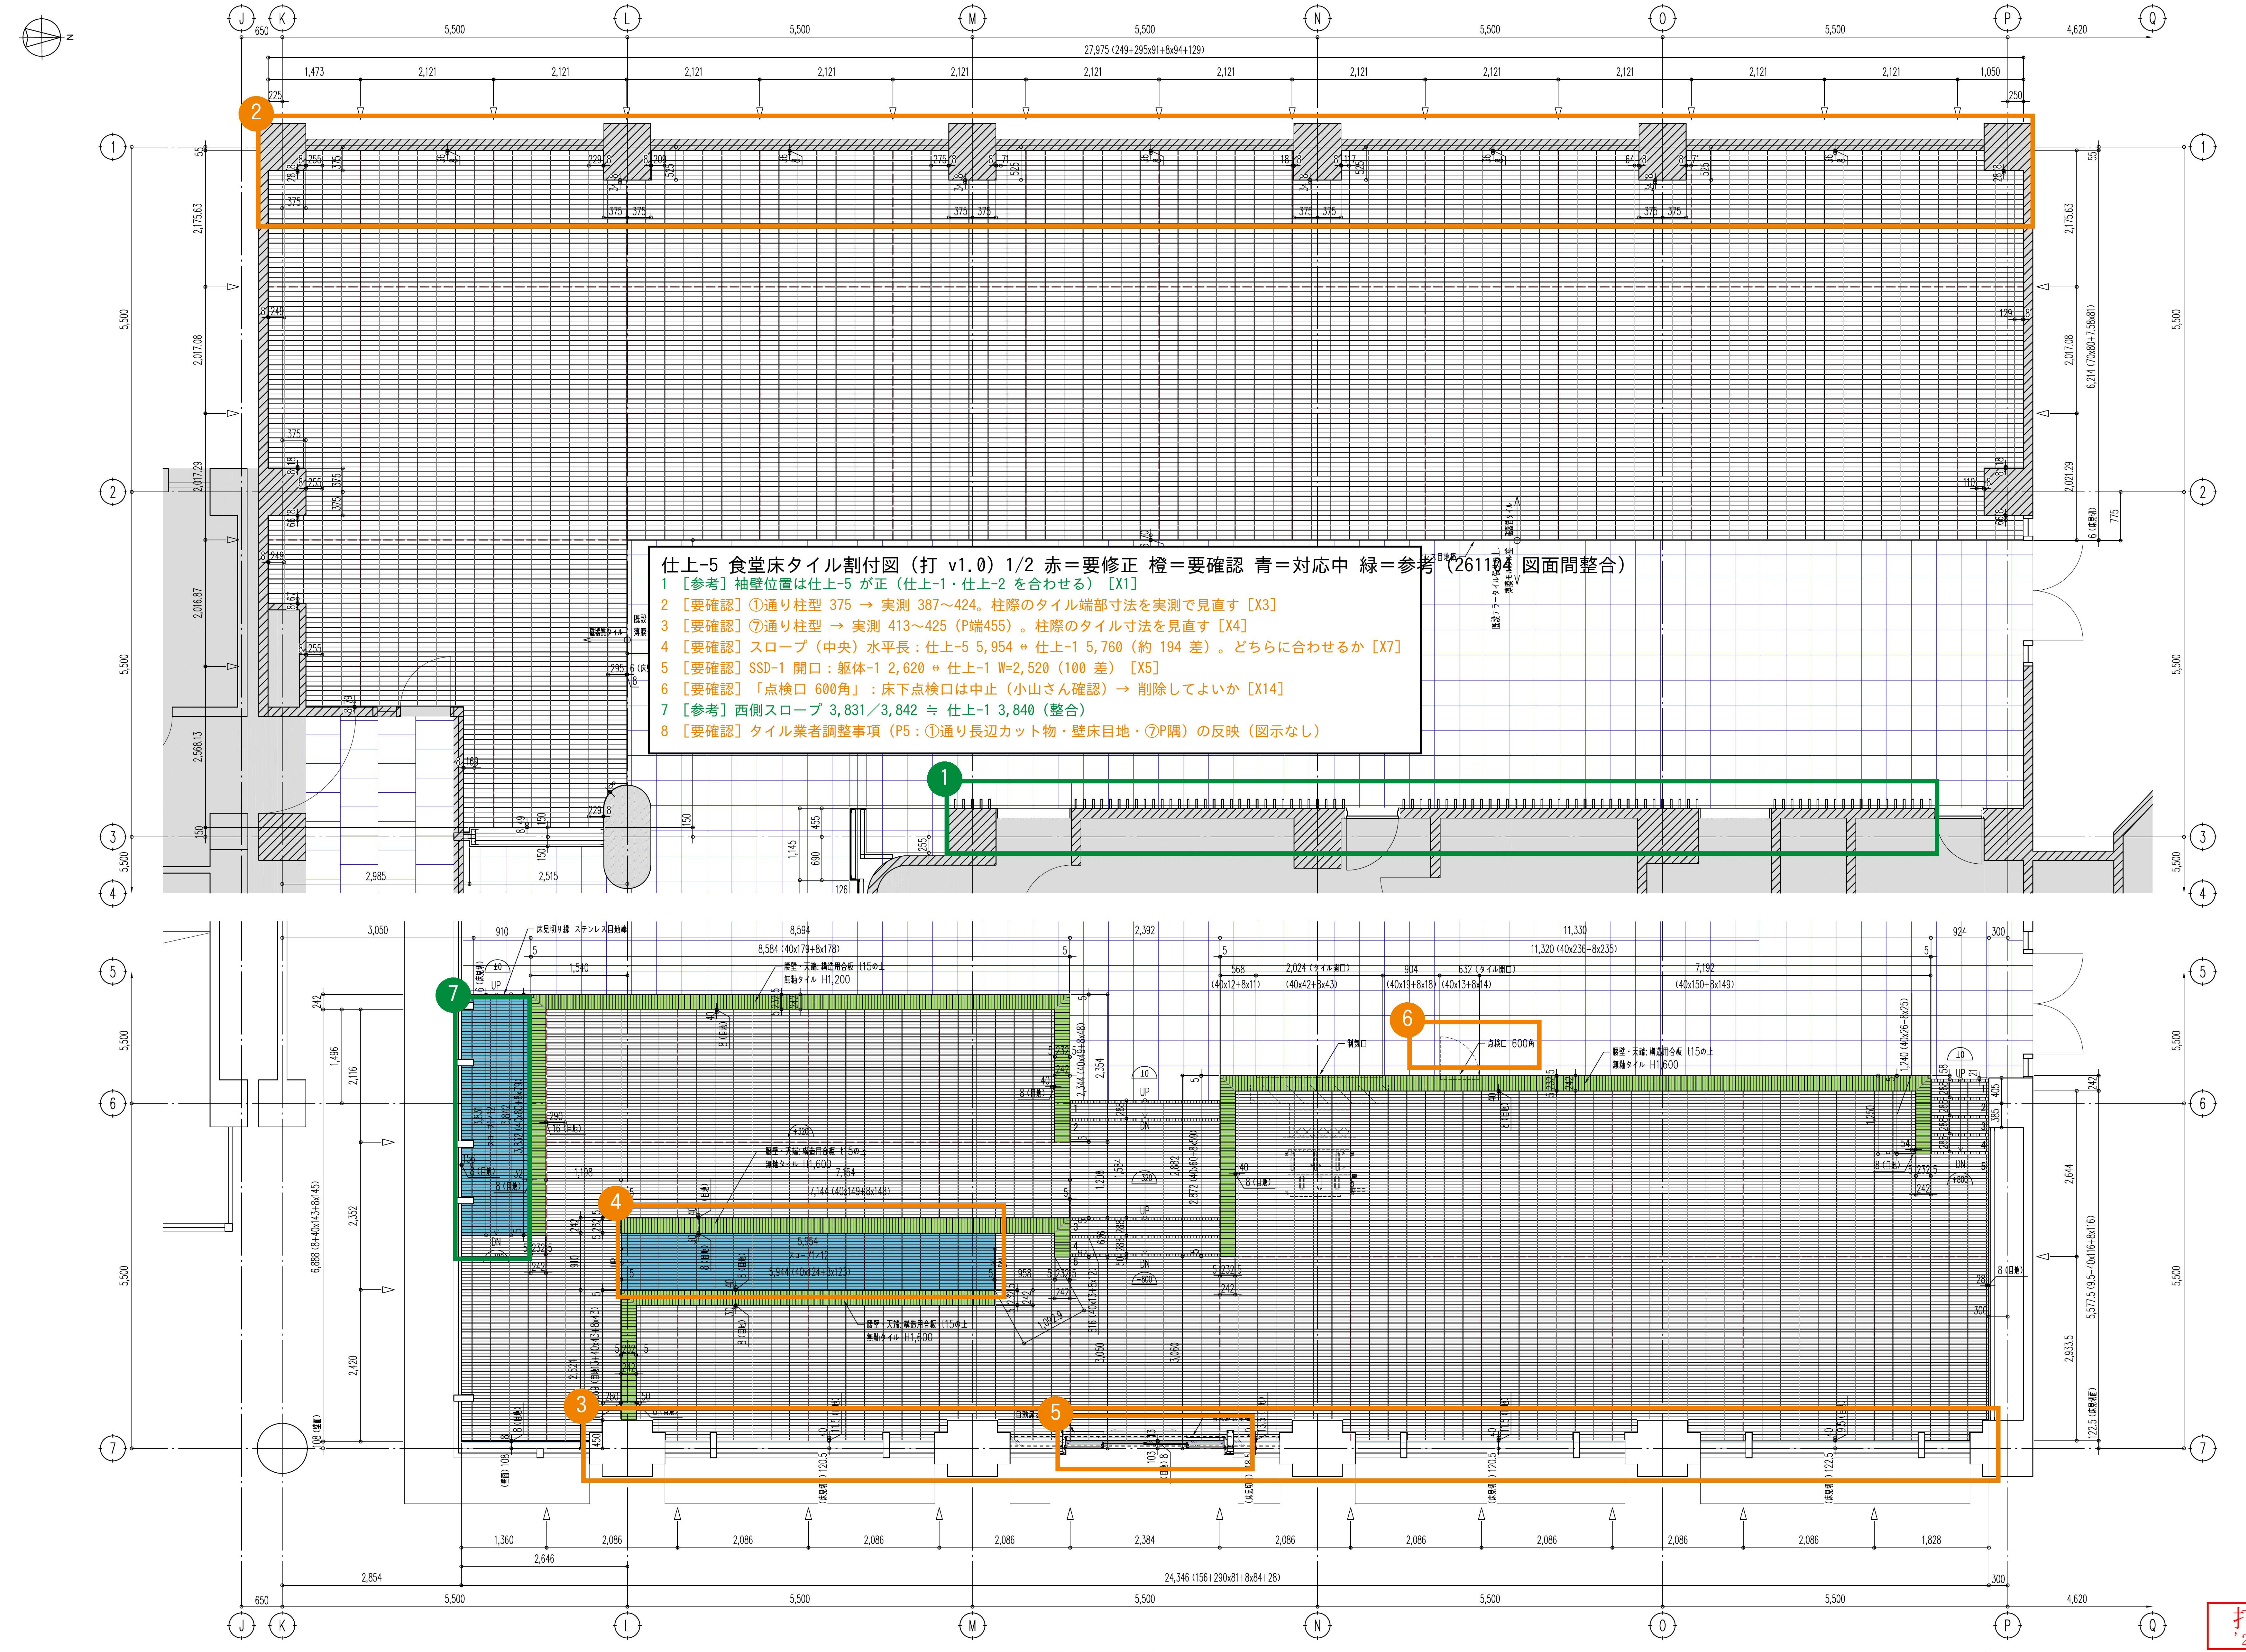
J
K
L
M
N
O
P
Q
1
2
3
4
5
6
7
5,500
4,620
650
27,975 (249+295x91+8x94+129)
2,121
1,473
1,050
375
2,175.63
2,017.08
2,017.29
2,016.87
2,558.13
8,594
8,584 (40x179+8x178)
11,330
11,320 (40x236+8x235)
2,392
3,050
1,540
7,192
点検口 600角
UP
DN
24,346 (156+290x81+8x84+28)
2,086
2,384
1,360
1,828
2,854
2,646
5,944 (40x24+8x123)
1
2
3
4
5
6
7

仕上-5 食堂床タイル割付図（打 v1.0）1/2 赤＝要修正 橙＝要確認 青＝対応中 緑＝参考（261104 図面間整合）

1 ［参考］袖壁位置は仕上-5 が正（仕上-1・仕上-2 を合わせる）［X1］
2 ［要確認］①通り柱型 375 → 実測 387～424。柱際のタイル端部寸法を実測で見直す［X3］
3 ［要確認］⑦通り柱型 → 実測 413～425（P端455）。柱際のタイル寸法を見直す［X4］
4 ［要確認］スロープ（中央）水平長：仕上-5 5,954 ↔ 仕上-1 5,760（約 194 差）。どちらに合わせるか［X7］
5 ［要確認］SSD-1 開口：躯体-1 2,620 ↔ 仕上-1 W=2,520（100 差）［X5］
6 ［要確認］「点検口 600角」：床下点検口は中止（小山さん確認）→ 削除してよいか［X14］
7 ［参考］西側スロープ 3,831／3,842 ≒ 仕上-1 3,840（整合）
8 ［要確認］タイル業者調整事項（P5：①通り長辺カット物・壁床目地・⑦P隅）の反映（図示なし）

凡例	
▷－－－	伸縮目地を示す
🟦	スロープを示す
🟩	腰壁を示す
╪╪╪	既存タイルを示す

KEY PLAN

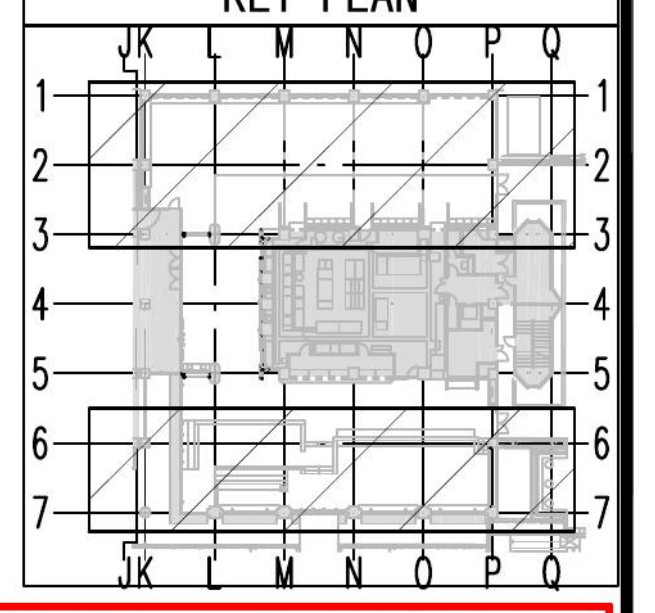
J K L M N O P Q
1
2
3
4
5
6
7

打合図 '26.10.30

設計図発行日 '26.03.27

	改訂日	改訂ヶ所	改訂理由
第１回改訂			
第２回改訂			
第３回改訂			
第４回改訂			
第５回改訂			

配布ルール
1 変更の場合はこの原図を変更し、改訂履歴を明記する。
2 原図に配布予定先を記入する。
3 変更の都度、全部の配布予定先にコピーを配布する。
4 変更図（コピー）を受領したら旧版は自主廃棄する。

配布予定業者

承認	審査	作成
現場管理責任者		担当者

受領日

椙山女学園星が丘キャンパス大学会館食堂リニューアル工事
食堂床タイル割付図-1/2
縮尺 A1:1/50 A3:1/100 '26.10.23
清水建設株式会社名古屋支店
仕上－０８

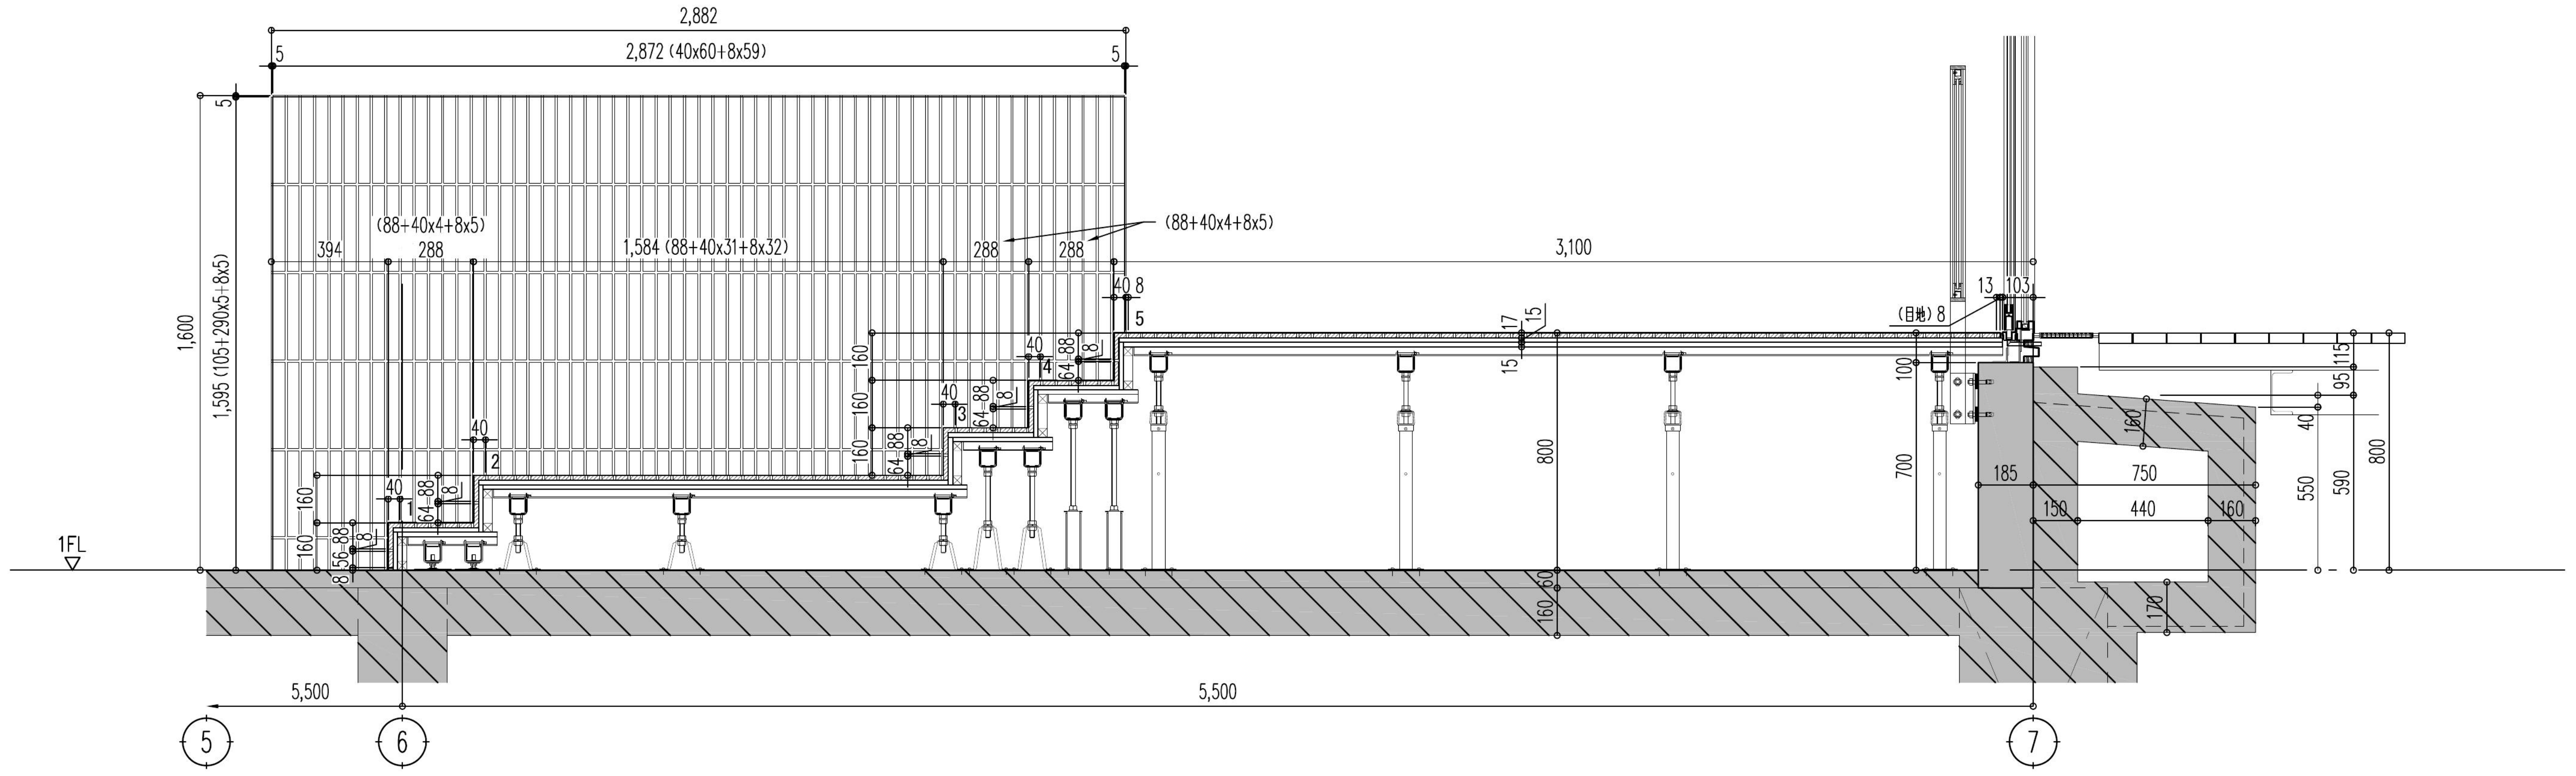
2,882
2,872 (40x60+8x59)
(88+40x4+8x5)
1,584 (88+40x31+8x32)
3,100
1,600
1,595 (105+290x5+8x5)
1FL
800
750
440
5,500
5,500
5
6
7

Ⓐ－Ⓐ 断面図 S=1／20

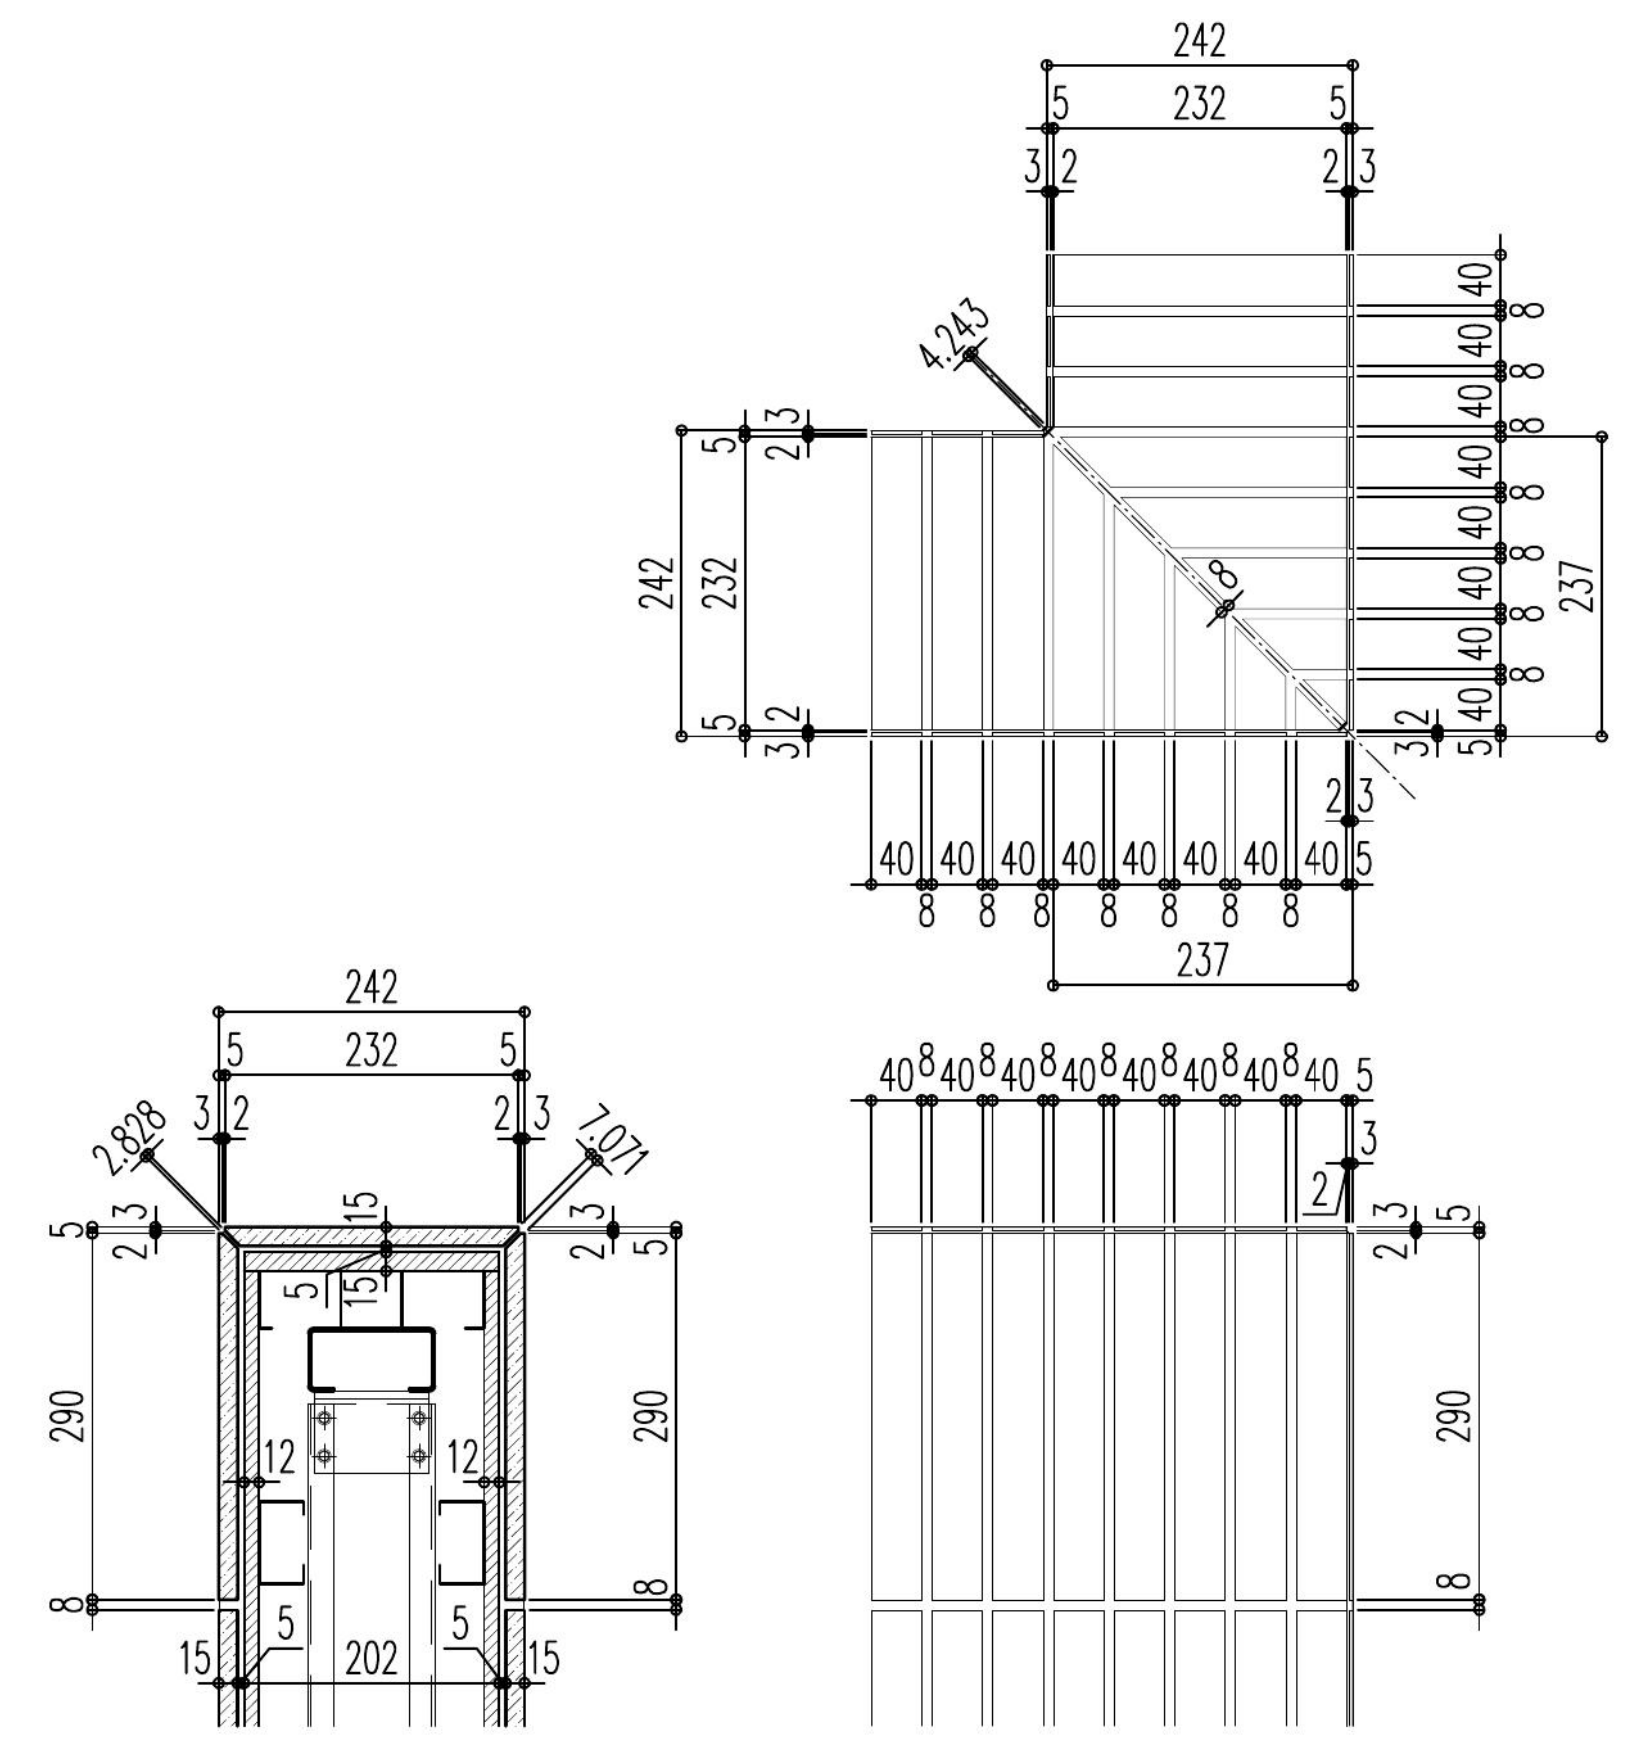
242
232
237
290
202

腰壁タイル割付詳細図 S=1／10

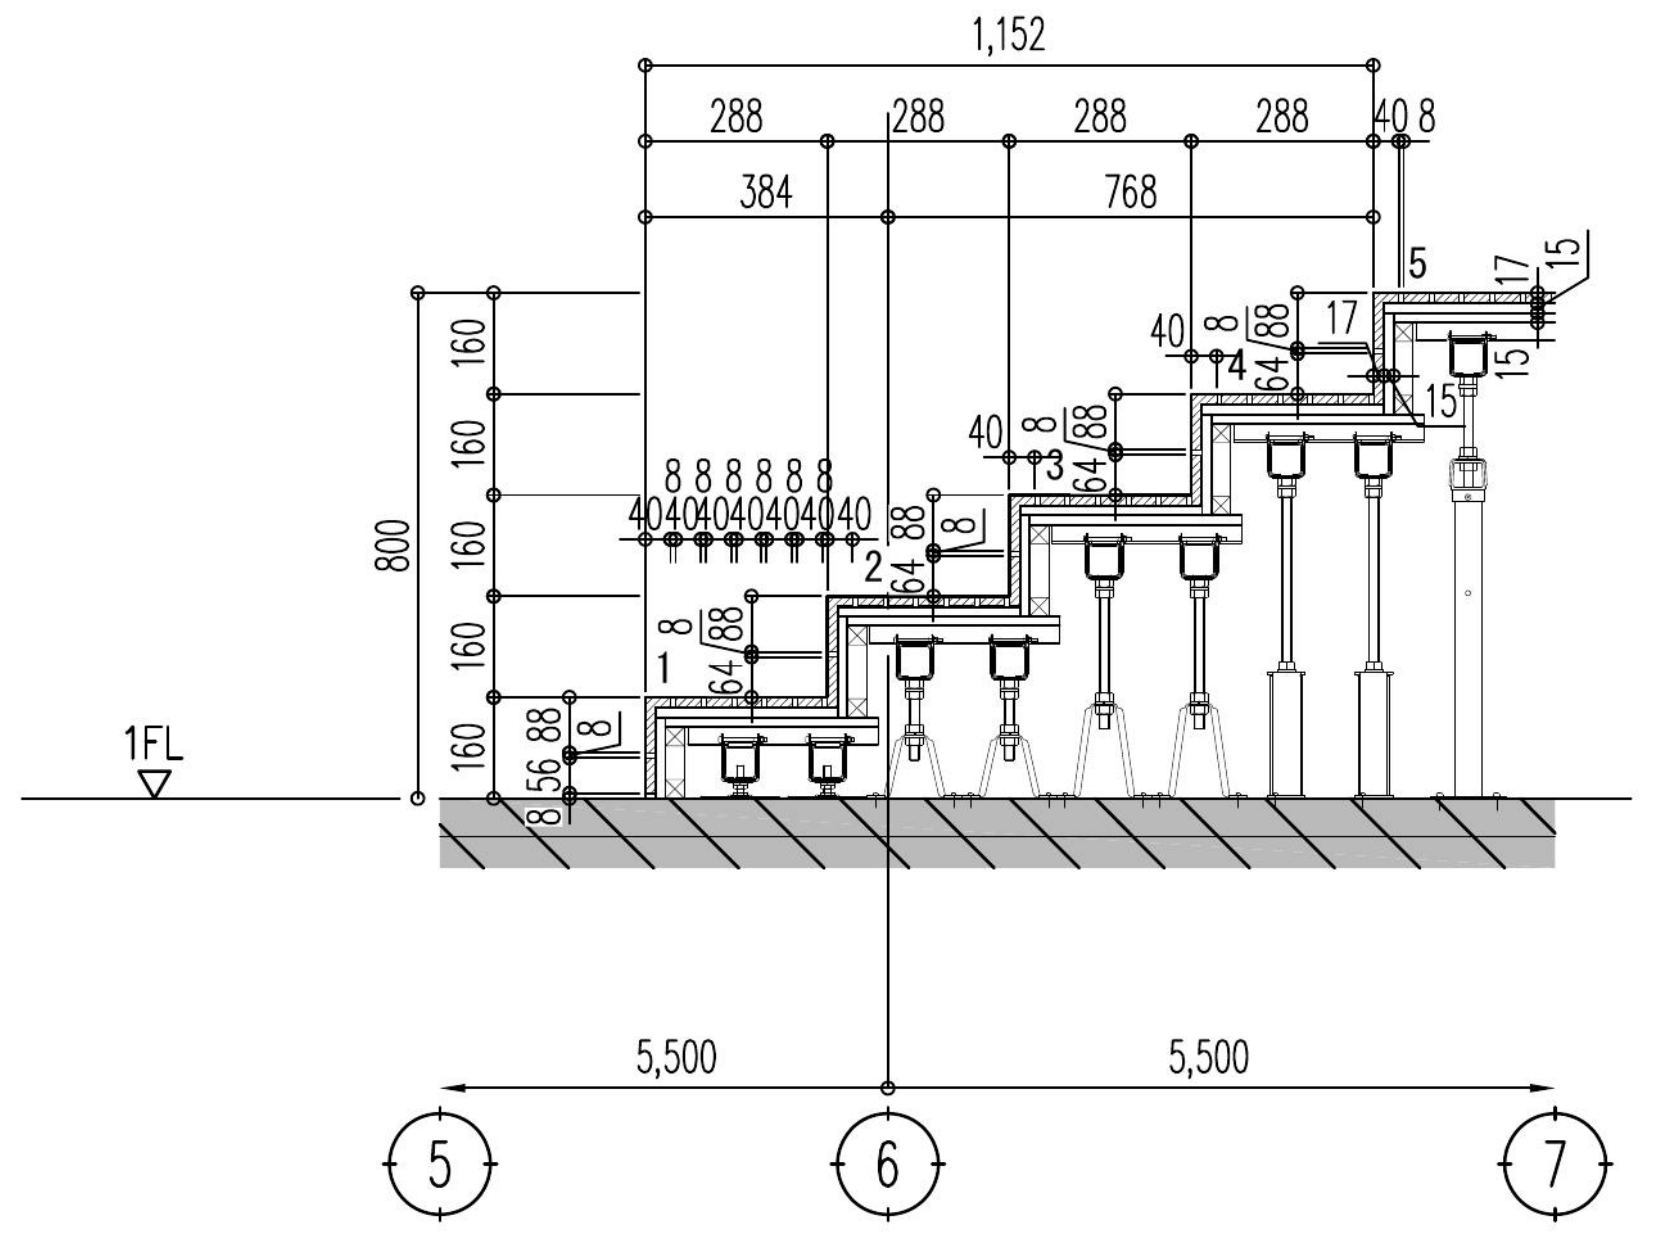
1,152
288
384
768
800
1FL
5,500
5,500
5
6
7

Ⓑ－Ⓑ 断面図 S=1／20

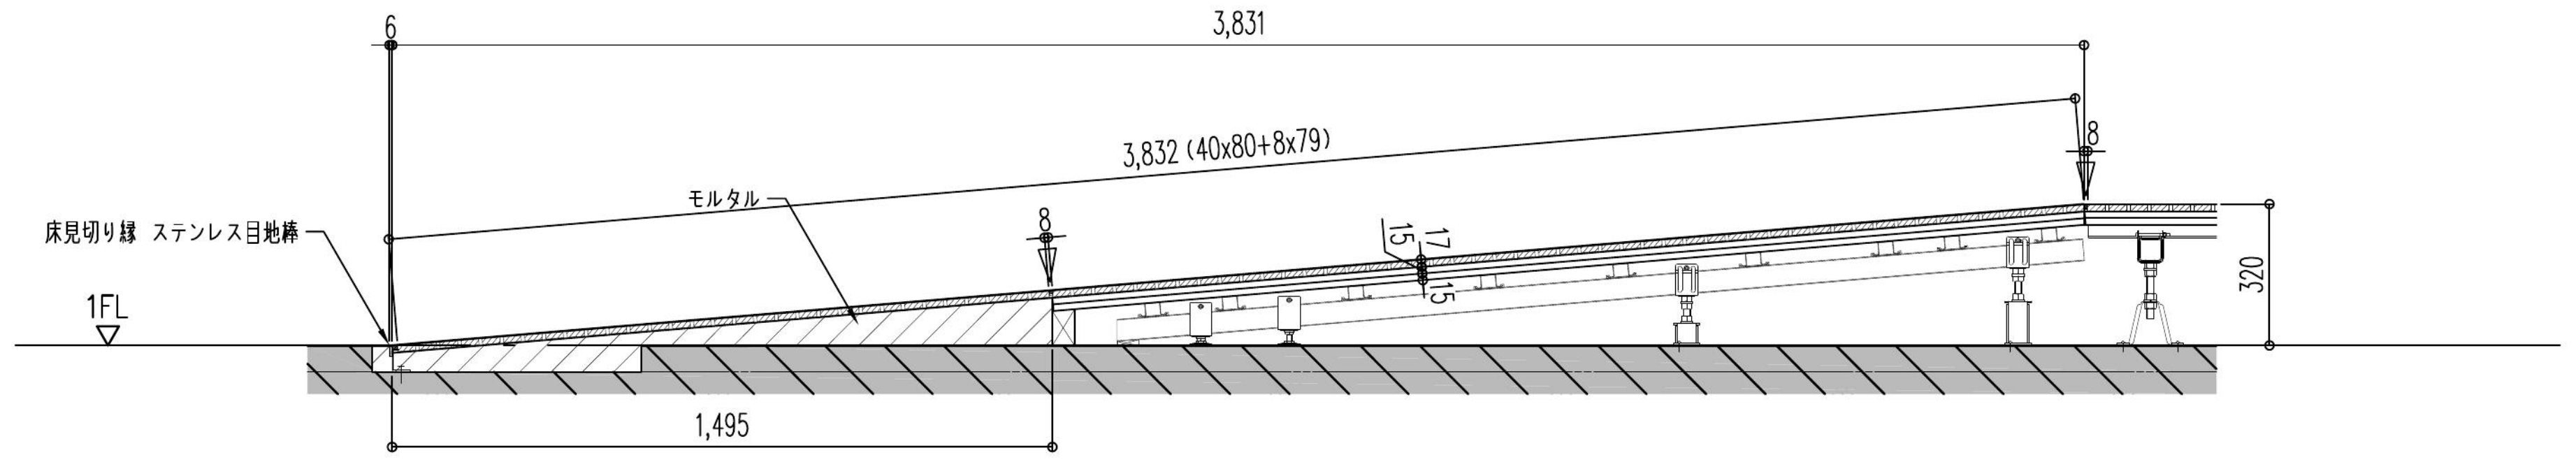
3,831
3,832 (40x80+8x79)
床見切り線 ステンレス目地棒
モルタル
1FL
320
1,495

Ⓒ－Ⓒ 断面図 S=1／20

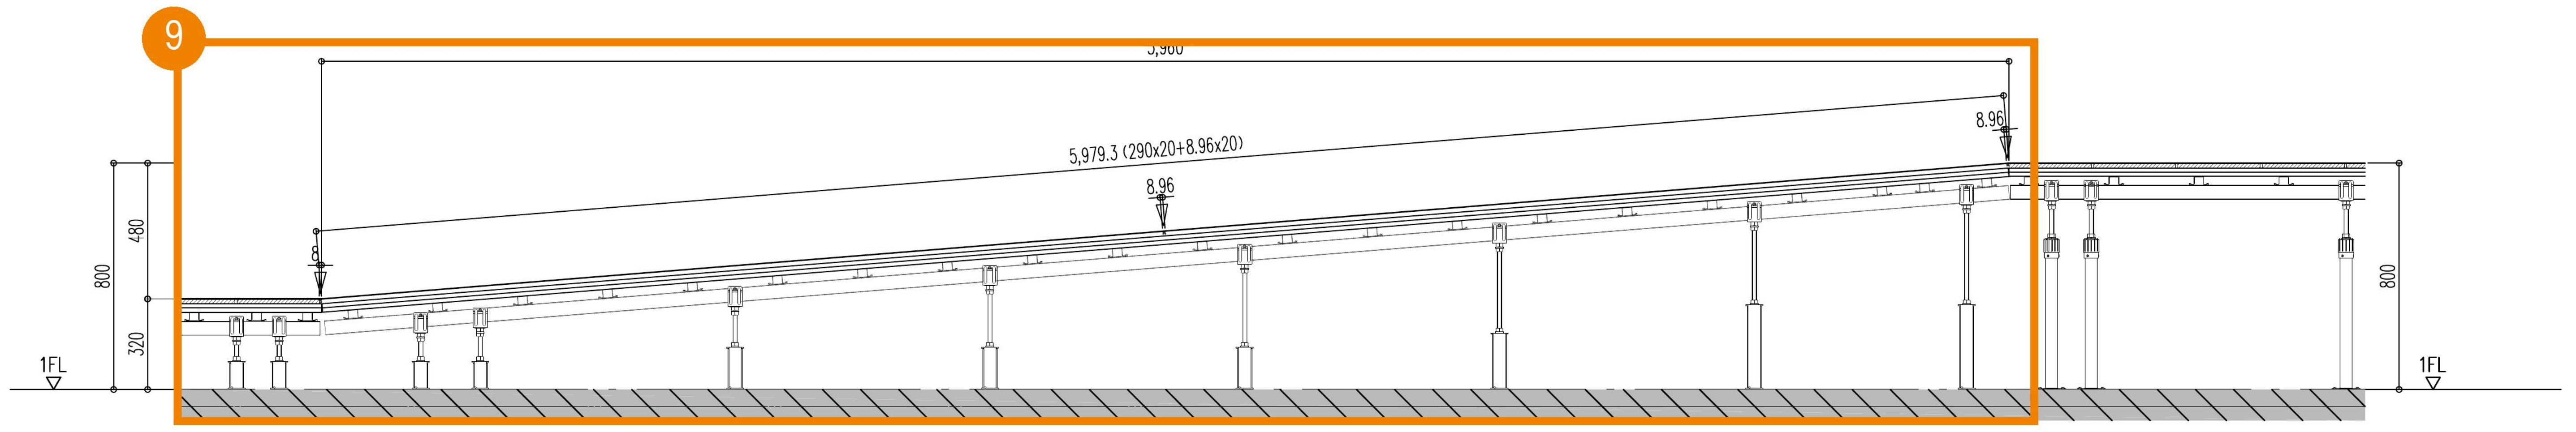
9
5,960
5,979.3 (290x20+8.96x20)
8.96
8.96
8
800
480
320
1FL
800
1FL

Ⓓ－Ⓓ 断面図 S=1／20

仕上-5 食堂床タイル割付図（打 v1.0）2/2 赤＝要修正 橙＝要確認 青＝対応中 緑＝参考（261104 図面間整合）

9 ［要確認］D-D 断面 水平 5,960 ↔ 仕上-1 平面 5,760［X7］

KEY PLAN

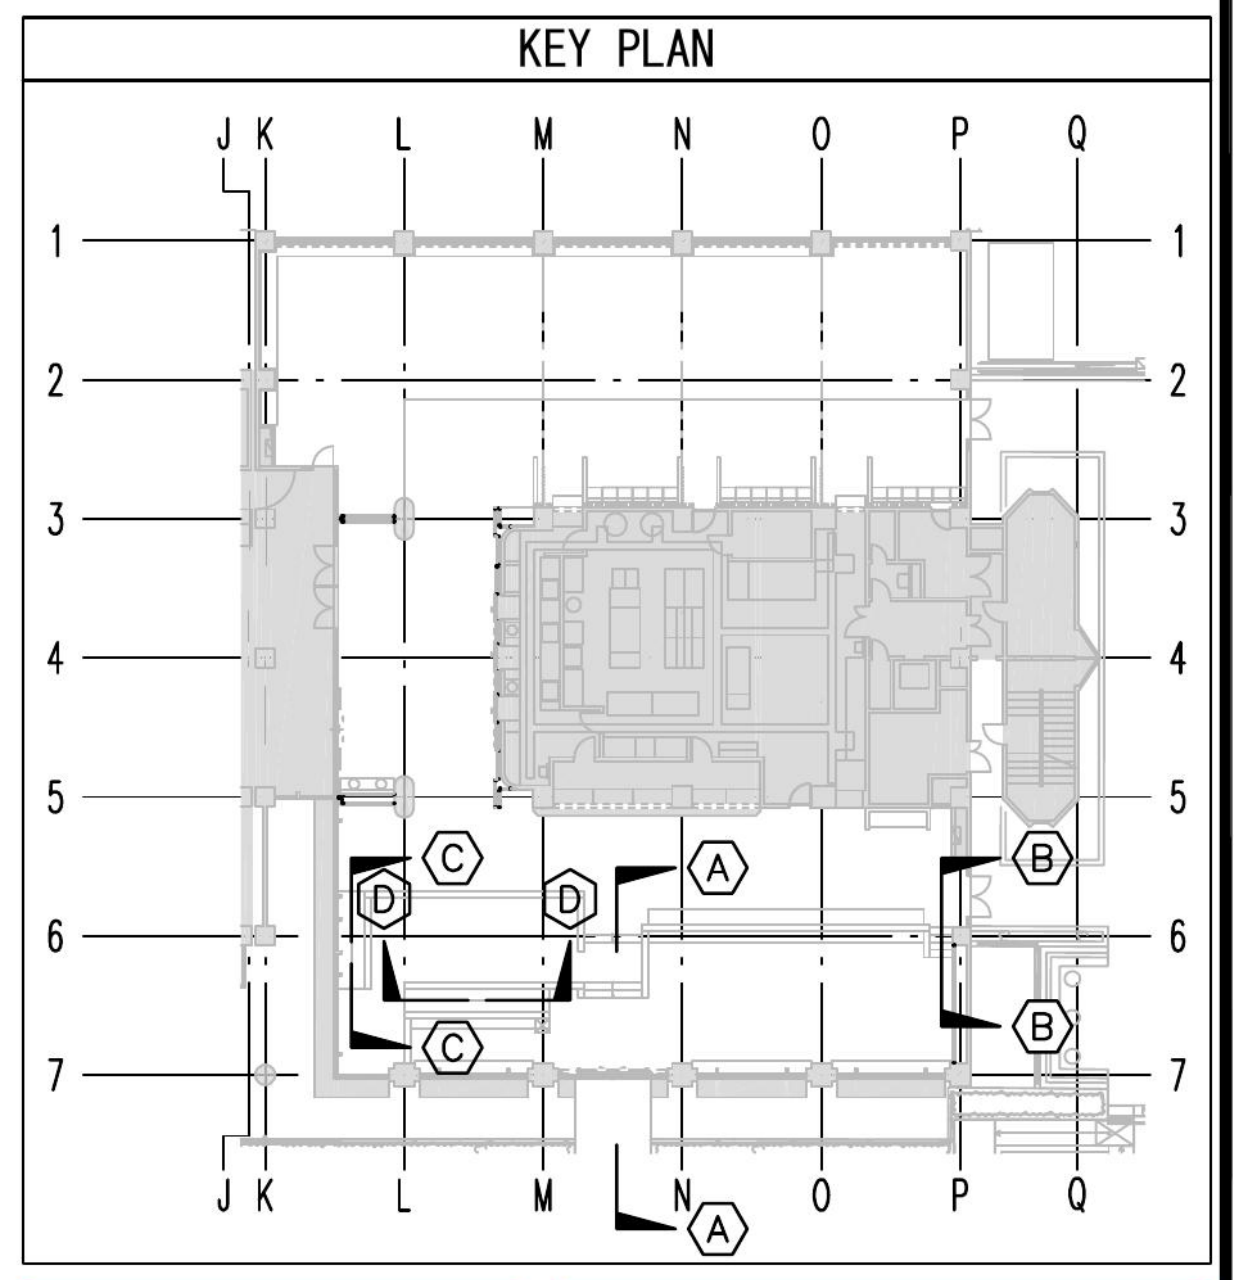
J K L M N O P Q
1
2
3
4
5
6
7
A
B
C
D

打合図
'26.10.30

設計図発行日
'26.03.27

チェック項目	未	完	
•FLの押えの統一			•巾木の逃げ
•下げ梁 下げスラブ			•石、T、B（テラゾー B）の逃げ
•フロアーヒンジ			•SW、AW、SDの差筋・箱入
•インサート・ルーフドレーン（打込み金物）			•SSの溝ボックス差筋箱入
•防水立上り			•手摺子金物、アンカー差筋・箱入
•ELV関連、箱入（押ボタン、ワイヤー穴）			•ブロック用差筋（床、天井、梁下、壁）
•設備開口、及貫通孔			•断熱材の打込み
•荷揚げ用仮穴、墨出し穴、足場用アンカー			•誘発目地・化粧目地
•後打部（打継ぎ部）			•常開のSFD埋め込み（マグネット共）
•掃除口穴（打継ぎ部梁底）			•
•打放しフカシ・増打			•

凡　例

<階高>
2FL
4,950
1FL

<室名 記号>

天井高さ	
室名	
躯体天端	床仕上天端

特記事項

<開口 記号>
H 開口寸法 高さ
符号 建具符号
h 基準高さから建具下枠の上端までの高さ
特記事項（電気錠等）

●●…扉の開き優先を示す。

W H h FL

記号	内　容	C	ストリングスカーテン
▭	保留を示す		
⌓	床レベル（FL基準）		
∧	壁ボード目地		

改訂履歴	改訂日	改訂ヶ所	改訂理由
第1回改訂			
第2回改訂			
第3回改訂			
第4回改訂			
第5回改訂			

配布ルール
1 変更の場合はこの原図を変更し、改訂履歴を明記する。
2 原図に配布予定先を記入する。
3 変更の都度、全部の配布予定先にコピーを配布する。
4 変更図（コピー）を受領したら旧版は自主廃棄する。

配布予定業者

承認	審査	作成
現場管理責任者		担当者

受領日

椙山女学園星が丘キャンパス大学会館食堂リニューアル工事
食堂床タイル割付図-2/2
縮尺 A1:1/50 A3:1/100 '26.10.23
清水建設株式会社名古屋支店
仕上－０９
