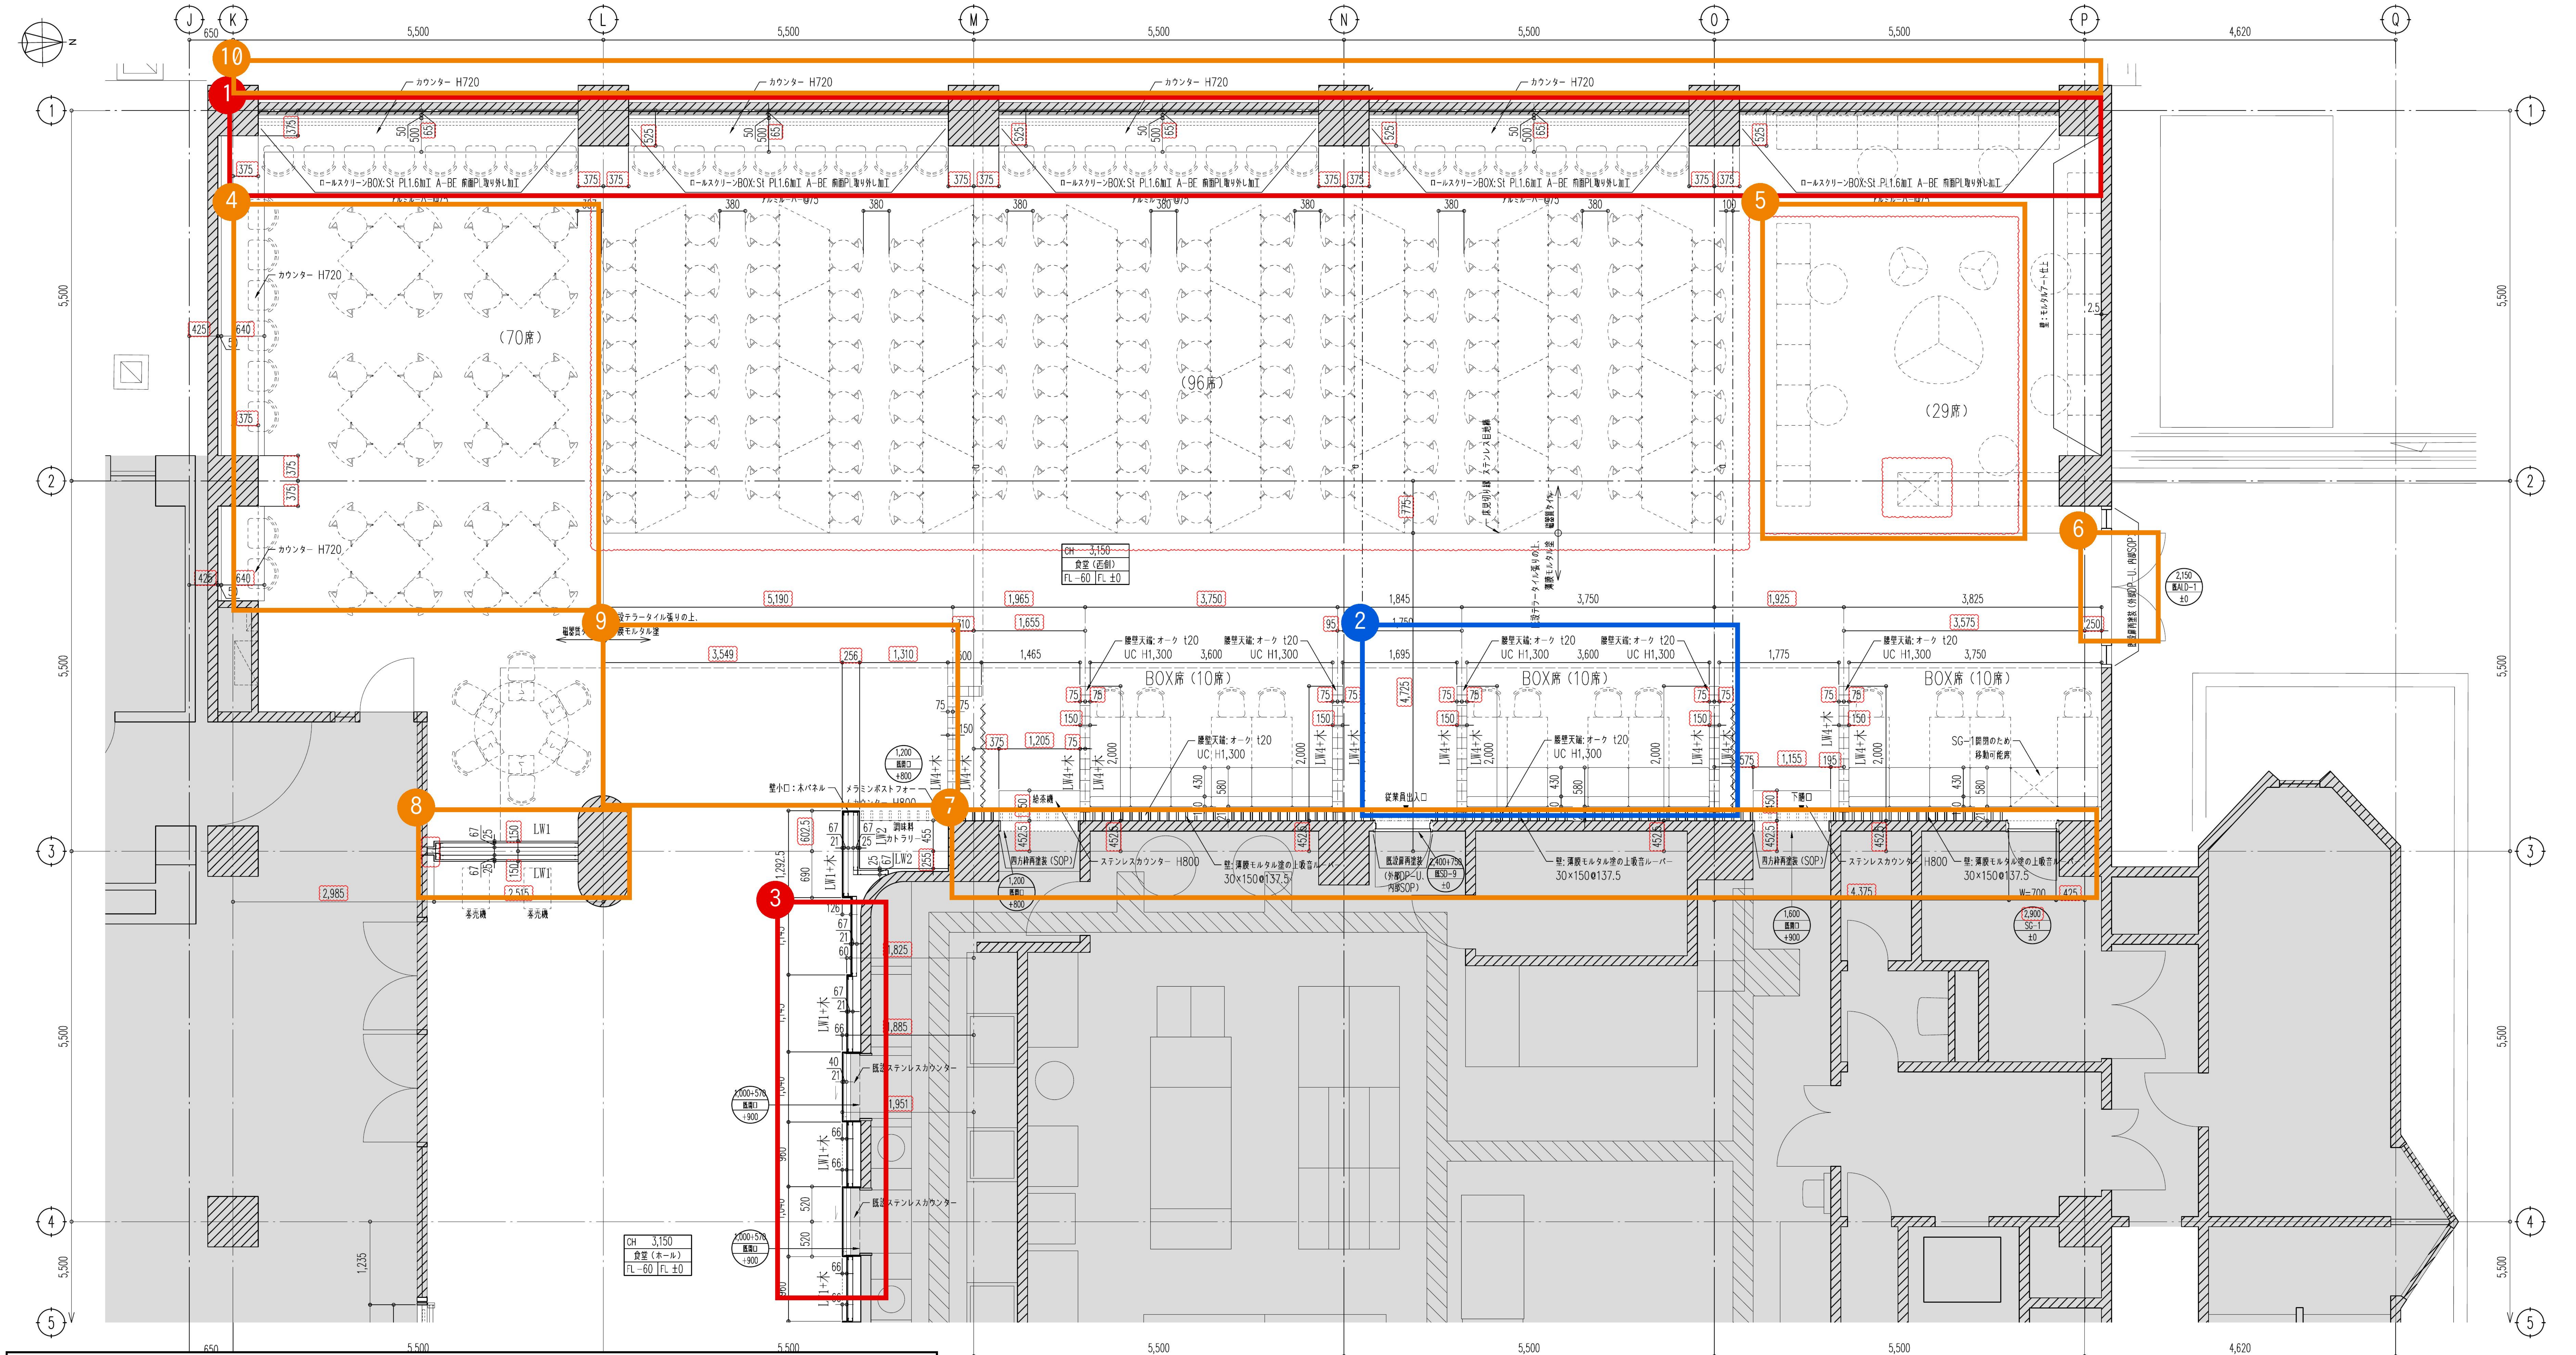
J
K
L
M
N
O
P
Q
1
2
3
4
5
650
5,500
4,620
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
カウンター H720
ロールスクリーンBOX:St PL1.6加工 A-BE 両面PL取り外し加工
（70席）
（96席）
（29席）
BOX席（10席）
CH 3,150
食堂（西側）
FL-60 FL±0
腰壁天端：オーク t20
UC H1,300
LW1
LW2
LW4+木
ステンレスカウンター H800
壁：薄膜モルタル塗の上着色ルーバー
30×150@137.5
従業員出入口
既設ステンレスカウンター
CH 3,150
食堂（ホール）
FL-60 FL±0

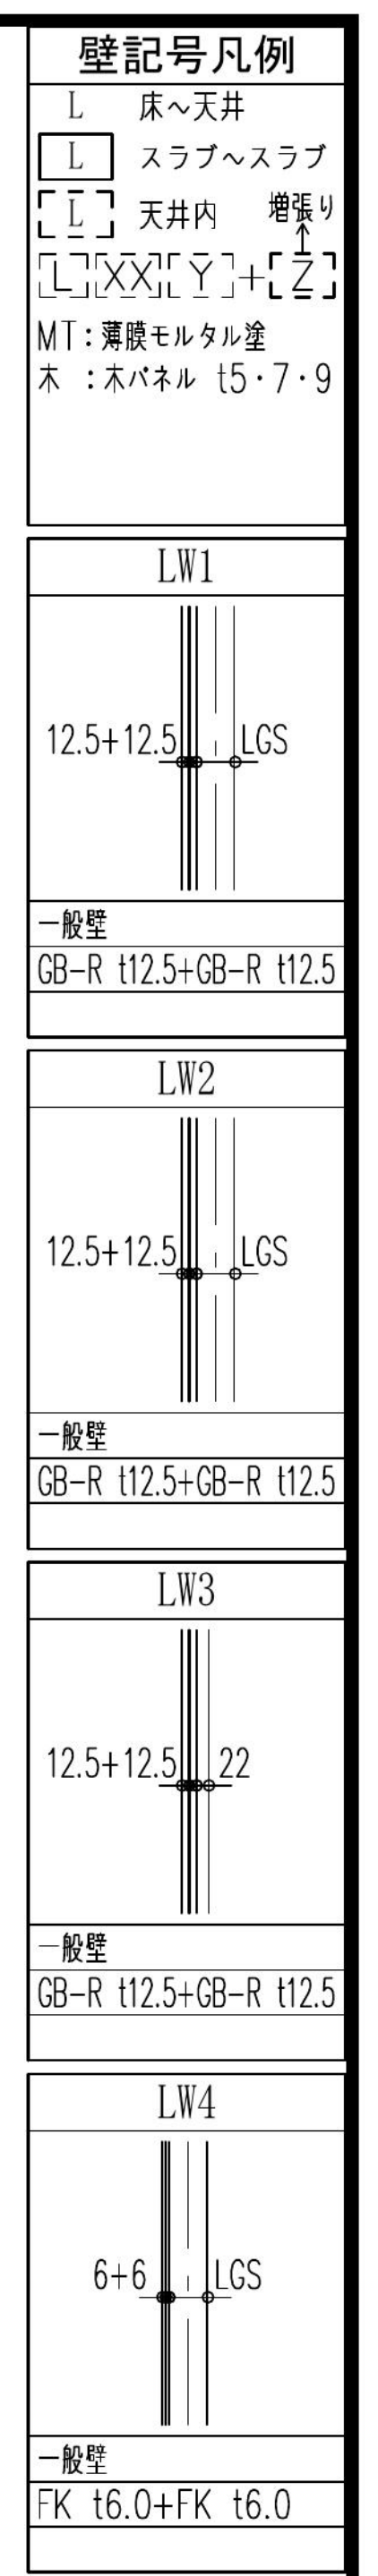
壁記号凡例
L 床～天井
L スラブ～スラブ
L 天井内
増張り
MT：薄膜モルタル塗
木 ：木パネル t5・7・9
LW1
12.5+12.5
LGS
一般壁
GB-R t12.5+GB-R t12.5
LW2
12.5+12.5
LGS
一般壁
GB-R t12.5+GB-R t12.5
LW3
12.5+12.5
22
一般壁
GB-R t12.5+GB-R t12.5
LW4
6+6
LGS
一般壁
FK t6.0+FK t6.0

仕上-1 受領図 v2.0 指摘（1/2）　赤＝要修正　橙＝要確認　青＝対応中

1 ［要修正］①通り窓際カウンター H720：実測の柱型間 4,678～4,705 より 45～72 長く柱型と干渉 → 実測で長さを決め直す
2 ［対応中］中央 BOX 席・袖壁：仕上-5 と 300 ずれ → M 側へ 300（PDS 修正中）
3 ［要修正］配膳開口（既設ステンレスカウンター）：下端 +900 → 実測 FL+965～966 に直す
4 ［要確認］席数：70席エリアの絵は 40～48 で合わない／合計 378→377 にする（PDS に根拠を）
5 ［要確認］29席エリア：ベンチの区切りで席数が読めない（席数の根拠を）
6 ［要確認］既存扉 ALD-1：高さ 2,150 か 3,150 か現地実測
7 ［要確認］③通り：実測差（開口 W1,445→図1,205、W718→図700 など）を反映
8 ［要確認］③ K～L 券売機付近：仕上げできない所の見切り金物
9 ［要確認］②～③ L～M：壁 I字→L字の位置（NS 指示待ち）
10 ［要確認］①通りアルミルーバー：長さ A4,660／B4,680 と目地の確定

略号	内　容
GB-R	石膏ボード
GB-R-H	普通硬質石膏ボード
GB-S	シージング石膏ボード
GB-F	強化石膏ボード
GB-L	石膏ラスボード
GB-D	化粧石膏ボード
GB-NC	不燃積層石膏ボード、不燃化粧石膏ボード
GB-P	吸音あなあき石膏ボード
GB-PD	化粧石膏吸音ボード
GB-R-Hc	吸放湿石膏ボード
K	けい酸カルシウム板
KB	化粧けい酸カルシウム板
RB	ロックウール吸音板

床	仕上	既設テラータイル張りの上薄膜モルタル塗 レベル調整モルタルの上磁器質タイル
	下地	コンクリート
巾木	不陸調整の上 樹脂巾木 H40	
壁	仕上	吸音ルーバー 既設GB-Rt12下地ラフトンジャンボ吹付一部50角タイル張り
	下地	軽量鉄骨　の上薄膜モルタル塗
天井	仕上	DR t12 GB-Rt12.5下地EP+吸音ルーバー
	下地	軽量鉄骨
廻縁	塩ビ製	
特記	カウンター、四方枠・三方枠再塗装、ストリングスカーテン＋埋込カーテンレール、アルミルーバー＋ロールスクリーン	

床	仕上	既設テラータイル張りの上薄膜モルタル塗
	下地	コンクリート
巾木	不陸調整の上 樹脂巾木 H40	
壁	仕上	木パネル 既設GB-Rt12下地ラフトンジャンボ吹付一部50角タイル張り
	下地	軽量鉄骨　の上薄膜モルタル塗
天井	仕上	DR t12 GB-Rt12.5下地EP+吸音ルーバー
	下地	軽量鉄骨
廻縁	ー	
特記	手洗いカウンター（設備工事）・鏡	

チェック項目	未	完	• 巾木の逃げ		
• FLの押えの統一			• 石．T．B（テラゾー　B）の逃げ		
• 下げ梁　下げスラブ			• SW．AW．SDの差筋・箱入		
• フロアーヒンジ			• SSの溝ボックス差筋箱入		
• インサート・ルーフドレーン（打込み金物）			• 手摺子金物．アンカー差筋・箱入		
• 防水立上り			• ブロック用差筋（床．天井．梁下．壁）		
• ELV関連．箱入（押ボタン．ワイヤー穴）			• 断熱材の打込み		
• 設備開口．及貫通孔			• 誘発目地・化粧目地		
• 荷揚げ用仮穴．墨出し穴．足場用アンカー			• 常開のSFD埋め込み（マグネット共）		
• 後打部（打継ぎ部）			•		
• 掃除口穴（打継ぎ部梁底）			•		
• 打放しフカシ・増打			•		

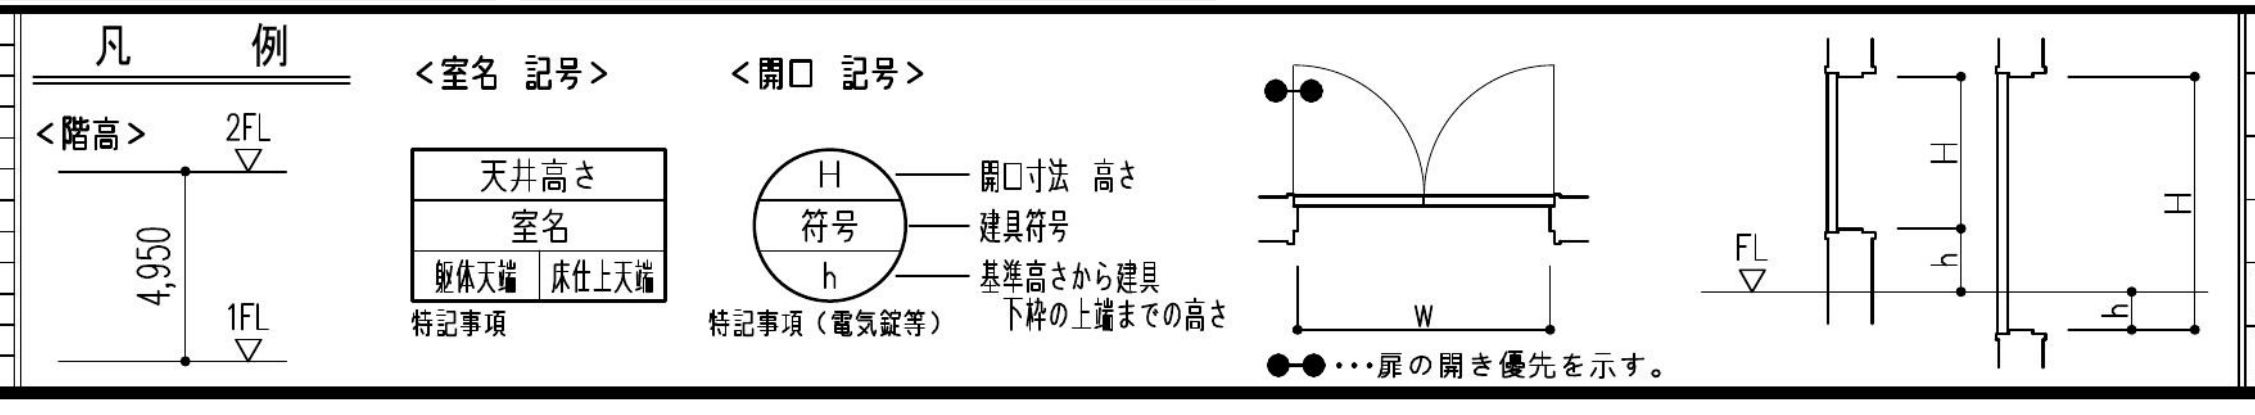
凡　例
<階高>
2FL
1FL
4,950
<室名 記号>
天井高さ
室名
躯体天端
床仕上天端
特記事項
<開口 記号>
H
符号
h
開口寸法 高さ
建具符号
基準高さから建具下枠の上端までの高さ
特記事項（電気錠等）
W
●●…扉の開き勝手を示す。
FL
H
h

記号	内　容				
		C	ストリングスカーテン		
☁	保留を示す				
⌓	床レベル（FL基準）				
∧	壁ボード目地				
▨	既存（壁・柱）を示す				
■	既存　を示す				

改訂履歴	改訂日	改訂ヶ所	改訂理由
第１回改訂			
第２回改訂			
第３回改訂			
第４回改訂			
第５回改訂			

配布ルール
1 変更の場合はこの原図を変更し、改訂履歴を明記する。
2 原図に配布予定先を記入する。
3 変更の都度、全部の配布予定先にコピーを配布する。
4 変更図（コピー）を受領したら旧版は自主廃棄する。

配布予定業者

承認	審査	作成
現場管理責任者		担当者
受領日		

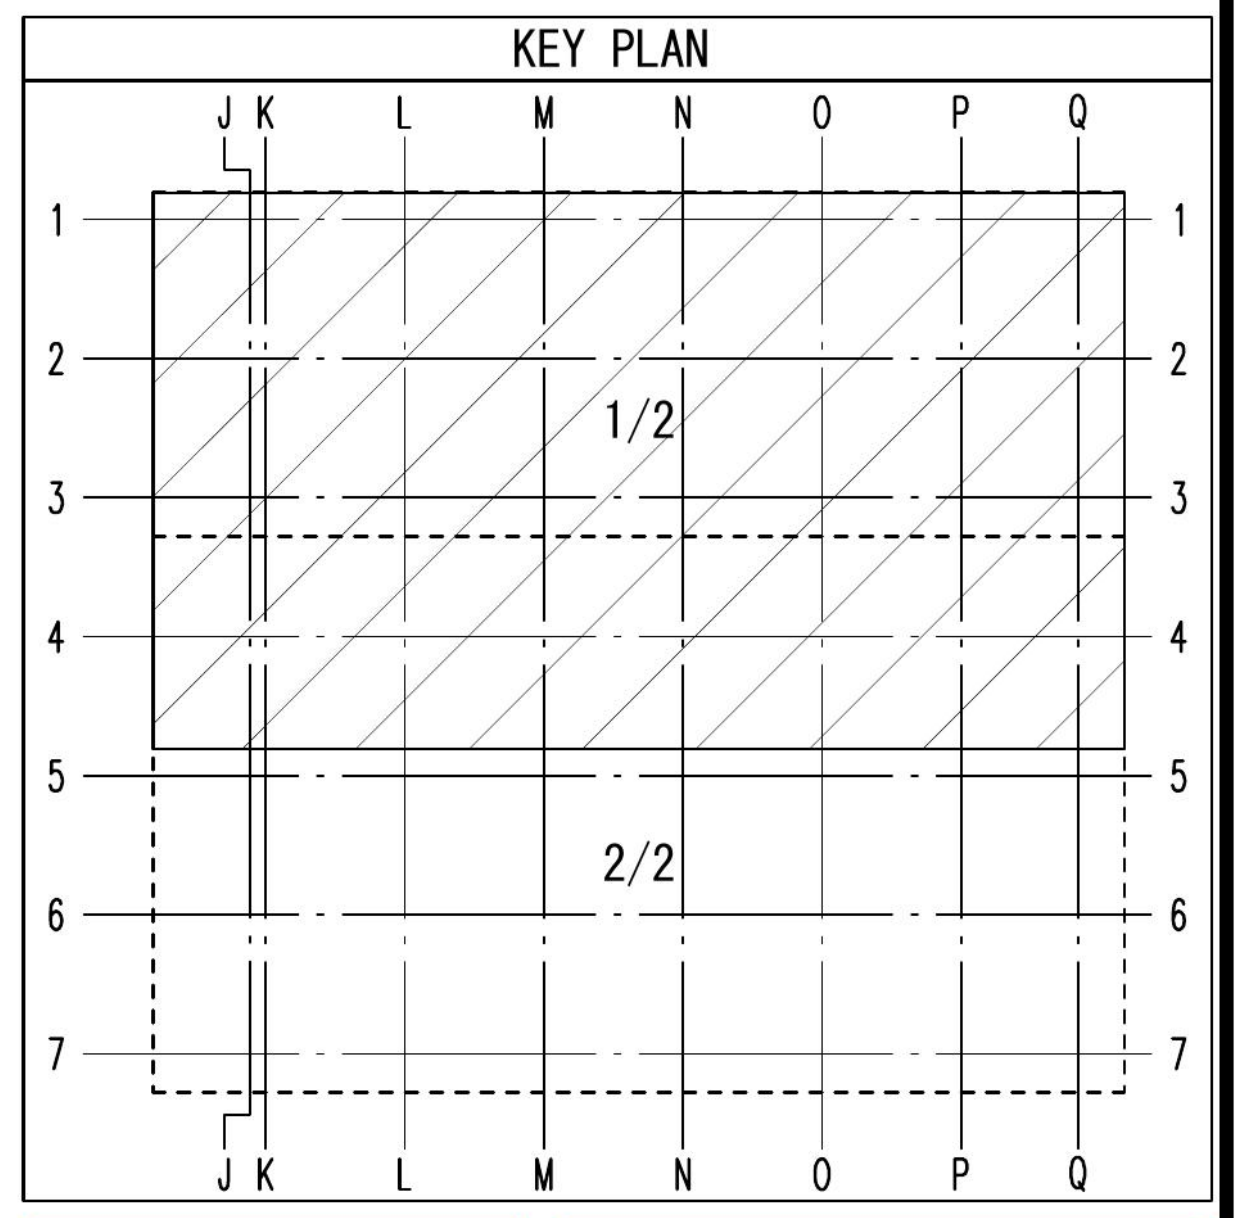
KEY PLAN
J K L M N O P Q
1
2
3
4
5
6
7
1/2
2/2

打合図
'26.10.22

設計図発行日
'26.03.27

椙山女学園星が丘キャンパス大学会館食堂リニューアル工事
1階平面詳細図-1/2
縮尺 A1:1/50 A3:1/100　'26.09.16
清水建設株式会社名古屋支店
仕上－０１

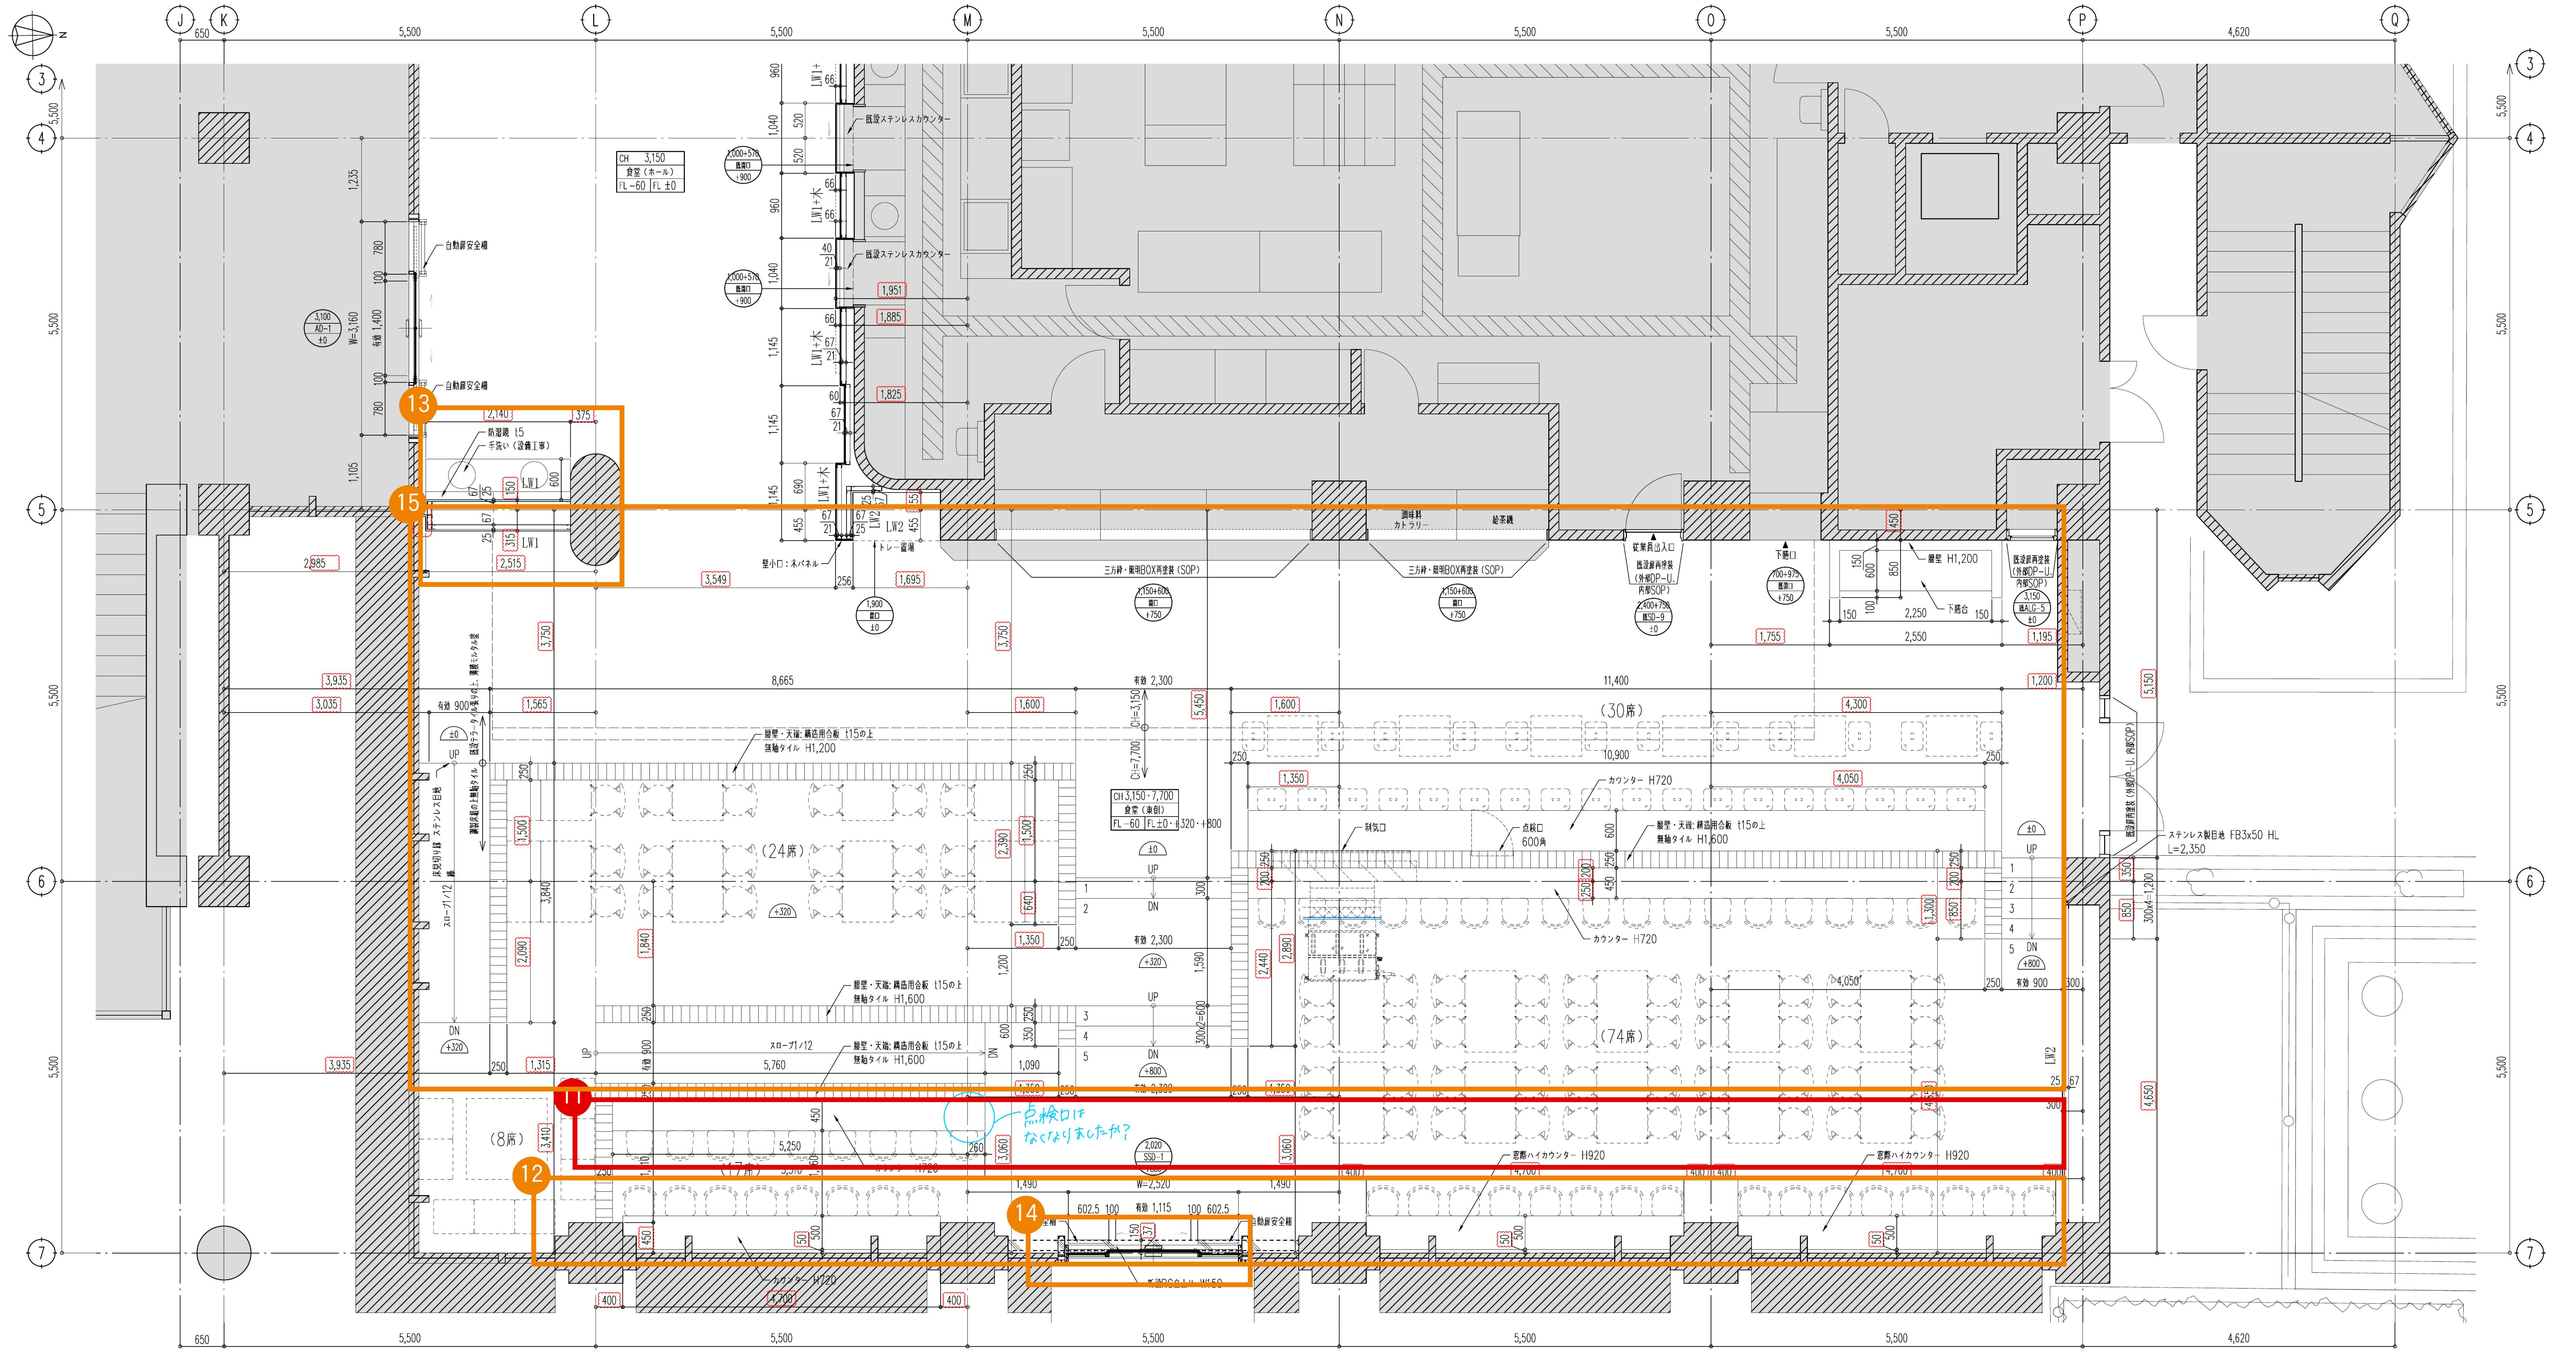

J
K
L
M
N
O
P
Q
3
4
5
6
7
650
5,500
4,620
自動扉安全柵
防湿鏡 t5
手洗い（設備工事）
LW1
LW1+木
LW2
2,140
375
2,515
3,549
1,695
1,951
1,885
1,825
壁小口：木パネル
トレー置場
既設ステンレスカウンター
調味料
カトラリー
給茶機
三方枠・照明BOX再塗装（SOP）
従業員出入口
既設扉再塗装（外部DP-U、内部SOP）
下膳口
腰壁 H1,200
下膳台
CH 3,150
食堂（ホール）
FL-60 FL±0
CH 3,150・7,700
食堂（東側）
FL-60 FL±0・+320・+800
8,665
11,400
10,900
有効 2,300
（30席）
（24席）
（74席）
（8席）
（17席）
腰壁・天端：構造用合板 t15の上
無釉タイル H1,200
無釉タイル H1,600
カウンター H720
制気口
点検口
600角
スロープ1/12
5,760
5,250
窓際ハイカウンター H920
ステンレス製目地 FB3x50 HL
L=2,350
既設扉再塗装（外部DP-U、内部SOP）
UP
DN
2,020
SSD-1
W=2,520
602.5 100 有効 1,115 100 602.5
11
12
13
14
15
点検口は
なくなりましたか？

仕上-1 受領図 v2.0 指摘（2/2）　赤＝要修正　橙＝要確認　青＝対応中

11 ［要修正］⑦通り窓際ハイカウンター H920：柱型の面 413～425（P端455）と 13～55 干渉 → 実測で長さを決め直す

12 ［要確認］⑦通り方立（125幅）の位置をカウンターまわりに記入

13 ［要確認］⑤ K～L：図 2,515 → 実測 2,646（＋131）。測った区間を確認

14 ［要確認］SSD-1 足元：クリア20→細目グレーチング・シール欠込み・方立 MIN45 を記入

15 ［要確認］全体：通り芯からの寸法の雲マーク（実測で確定したか）・席数 2/2 は未計数

壁記号凡例

L　床～天井
L　スラブ～スラブ
L　天井内
L XX Y + Z　増張り
MT：薄膜モルタル塗
木　：木パネル　t5・7・9

LW1

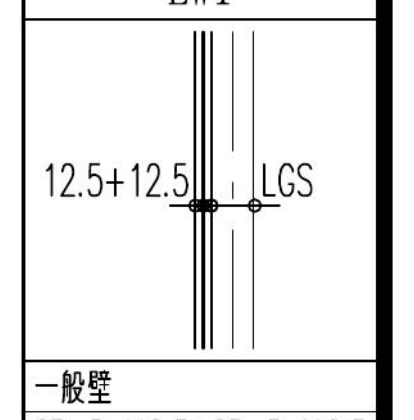

一般壁
GB-R t12.5+GB-R t12.5

LW2

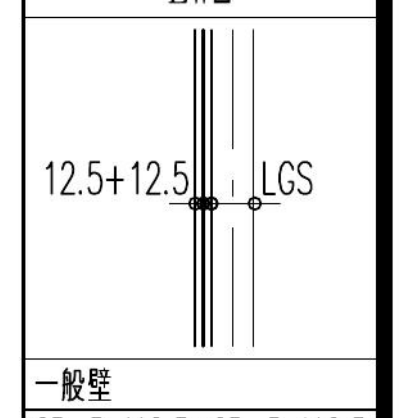

一般壁
GB-R t12.5+GB-R t12.5

KEY PLAN

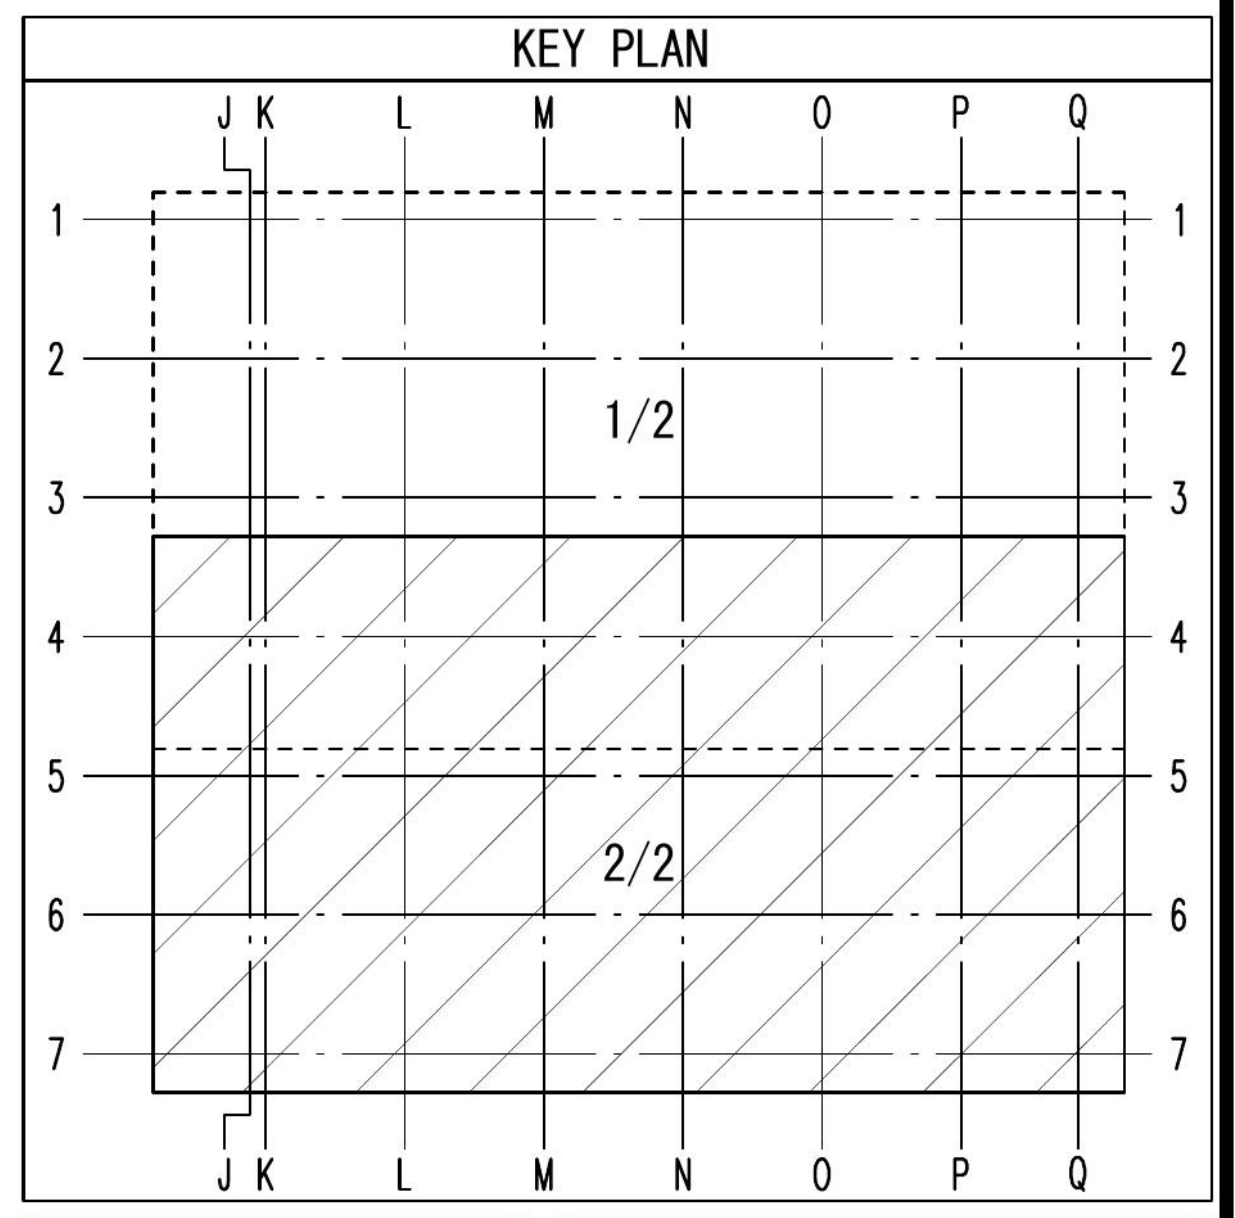

J K L M N O P Q
1
2
3
4
5
6
7
1/2
2/2

打合図
'26.10.22

設計図発行日
'26.03.27

ボード略号凡例

略号	内　容
GB-R	石膏ボード
GB-R-H	普通硬質石膏ボード
GB-S	シージング石膏ボード
GB-F	強化石膏ボード
GB-L	石膏ラスボード
GB-D	化粧石膏ボード
GB-NC	不燃積層石膏ボード、不燃化粧石膏ボード
GB-P	吸音あなあき石膏ボード
GB-PD	化粧石膏吸音ボード
GB-R-Hc	吸放湿石膏ボード
K	けい酸カルシウム板
KB	化粧けい酸カルシウム板
RB	ロックウール吸音板

食堂（東側）		CH=3,150 CH=7,700	躯体レベル FL-60 仕上レベル FL±0・+320・+800
床	仕上	無釉タイル 既設テラータイル張りの上薄膜モルタル塗	
	下地	鋼製床組＋構造用合板 t15、コンクリート	
巾木		不陸調整の上 樹脂巾木 H40	
壁	仕上	GB-Rt12.5下地EP+吸音ルーバー 既設GB-Rt12下地ラフトンジャンボ吹付一部50角タイル張り	
	下地	軽量鉄骨　の上薄膜モルタル塗	
天井	仕上	GB-Rt12.5下地EP+吸音ルーバー GB-Rt12.5下地+リブDR t19、DR t9.0貼分け	
	下地	軽量鉄骨	
廻縁		塩ビ製	
特記		―	

食堂（ホール）		CH=3,150	躯体レベル FL-60 仕上レベル FL±0
床	仕上	既設テラータイル張りの上薄膜モルタル塗	
	下地	コンクリート	
巾木		不陸調整の上 樹脂巾木 H40	
壁	仕上	木パネル 既設GB-Rt12下地ラフトンジャンボ吹付一部50角タイル張り	
	下地	軽量鉄骨　の上薄膜モルタル塗	
天井	仕上	DR t12 GB-Rt12.5下地EP+吸音ルーバー	
	下地	軽量鉄骨	
廻縁		―	
特記		手洗いカウンター（設備工事）・鏡	

チ　ェ　ッ　ク　項　目	未	完	• 巾木の逃げ		
• FLの押えの統一			• 石．T．B（テラゾー　B）の逃げ		
• 下げ梁　下げスラブ			• SW．AW．SDの差筋・箱入		
• フロアーヒンジ			• SSの溝ボックス差筋箱入		
• インサート・ルーフドレーン（打込み金物）			• 手摺子金物．アンカー差筋・箱入		
• 防水立上り			• ブロック用差筋（床．天井．梁下．壁）		
• ELV関連．箱入（押ボタン．ワイヤー穴）			• 断熱材の打込み		
• 設備開口．及貫通孔			• 誘発目地・化粧目地		
• 荷揚げ用仮穴．墨出し穴．足場用アンカー			• 常開のSFD埋め込み（マグネット共）		
• 後打部（打継ぎ部）			•		
• 掃除口穴（打継ぎ部梁底）			•		
• 打放しフカシ・増打			•		

凡　例

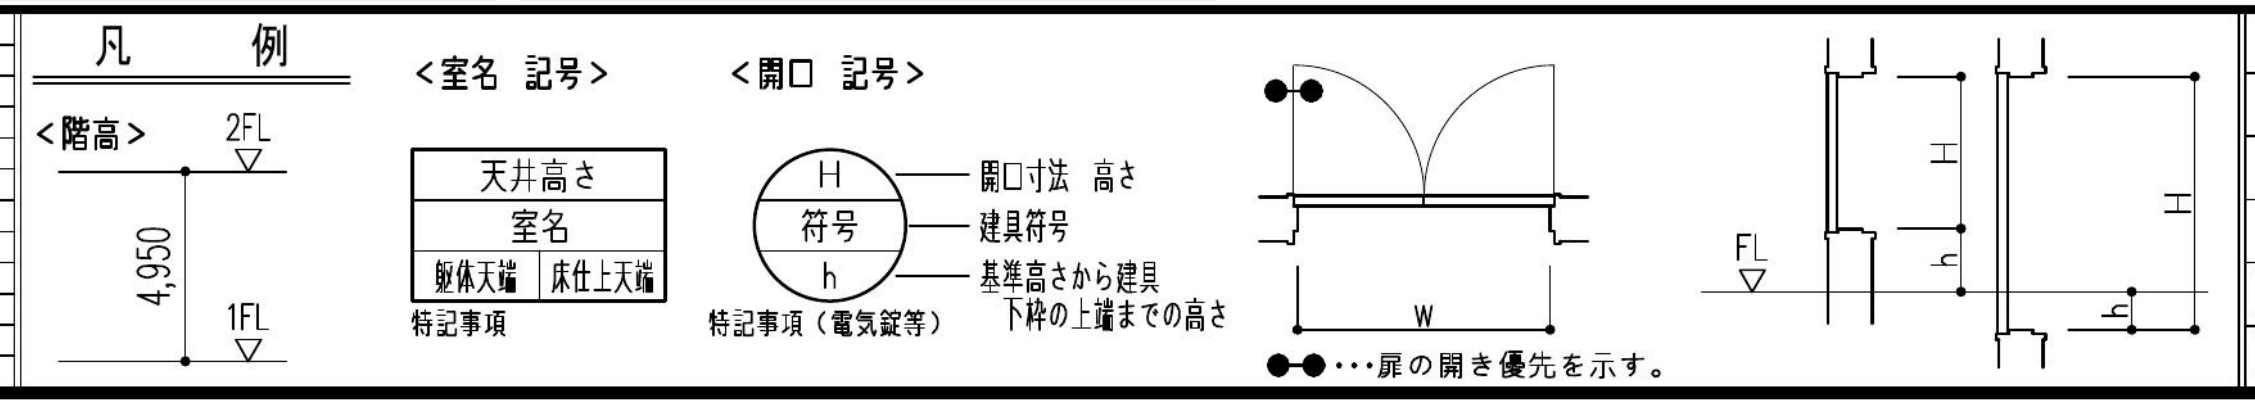

<階高>
2FL
4,950
1FL
<室名 記号>
天井高さ
室名
躯体天端
床仕上天端
特記事項
<開口 記号>
H
符号
h
開口寸法 高さ
建具符号
基準高さから建具下枠の上端までの高さ
特記事項（電気錠等）
W
H
h
・・・扉の開き勝手を示す。

記号	内　容		
⌇	保留を示す	C	ストリングスカーテン
⌒	床レベル（FL基準）		
∧	壁ボード目地		
▨	既存（壁・柱）を示す		
▩	既存　を示す		

改訂履歴	改訂日	改訂ヶ所	改訂理由
第１回改訂			
第２回改訂			
第３回改訂			
第４回改訂			
第５回改訂			

配布ルール
1　変更の場合はこの原図を変更し、改訂履歴を明記する。
2　原図に配布予定先を記入する。
3　変更の都度、全部の配布予定先にコピーを配布する。
4　変更図（コピー）を受領したら旧版は自主廃棄する。

配布予定業者

承　認	審　査	作　成
現場管理責任者		担当者

受領日

椙山女学園星が丘キャンパス大学会館食堂リニューアル工事
1階平面詳細図-2/2
縮尺　A1:1/50　A3:1/100　'26.09.16
清水建設株式会社名古屋支店
仕上－０２
